제2판

충청남도
신설학교 교무학사
개교 업무편람

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

발간사

충남교육청의 지표는 '삶의 주체로 함께 성장하는 세계시민'입니다. 충남교육은 출발선이 평등한 교육 실현을 위해 한 명의 아이도 포기하지 않는 특별한 미래교육을 위해 최선을 다하고 있습니다. 항상 격려와 동참으로 함께 해주시는 교육공동체 여러분께 진심으로 감사를 전합니다. 여러분의 응원이 미래 사회를 살아가는 우리 학생들의 미래 역량을 키우는 든든한 토대가 됩니다.

산업 구조의 변화와 도시개발로 인하여 신도시가 생기고, 지역의 인구가 변화하고 있습니다. 이에 맞추어 최적의 교육환경을 제공하고자 새로운 학교의 개교와 이전도 활발하게 이루어지고 있습니다. 또한 주거 환경을 결정할 때 학교의 위치를 중요하게 고려할 만큼 새로운 학교의 개교는 많은 관심을 받고 있습니다.

개교 과정은 시설 준공과 함께 교육과정 운영에 필요한 제반 사항을 동시에 준비해야 합니다. 짧은 기간 동안 많은 업무를 동시에 처리해야 하는 어려움이 있습니다. 하지만 관습적으로 따르던 타성에서 벗어나 공간을 혁신적으로 만들기 위해 교육 수요자들의 요구를 담아낼 기회이기도 합니다.

이에 원활한 개교 준비와 새 학년도의 안정적인 운영에 필요한 도움 자료를 제공하고자 합니다. 신설 준공 후 개교하기까지의 업무를 고려해 ‘충청남도 신설학교 교무학사 개교 업무편람 [2판]’을 발간하게 되었습니다.

창의성은 튼튼한 기초·기본교육의 바탕에서 꽃을 피울 수 있듯이, 본 업무편람에 반영된 개교 준비 및 부서별 업무처리 과정, 학교 시설물 관리 등을 창의적으로 활용하여 새로운 학교가 미래 인재를 키우는 요람이 되기를 기대합니다.

업무편람이 신설 학교를 준비하는 과정에서, 막막함과 부담감을 느끼는 교직원에게 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 더불어 신설 학교 개교 준비에 열정적으로 헌신하시는 교직원 여러분들에게 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.

2023. 8.

충청남도교육감 김지철

일러두기

- 본 자료는, 신설학교(유치원 포함, 이하 생략) 개교 업무의 원활한 직무 수행을 돕기 위한 것으로 주요 항목별 절차와 예시 등으로 구성되었습니다.

- 본 자료는 개교 업무 총괄, 전담조직 업무 추진, 실별 구축 안내, 학교급별 업무 추진, 개교식 분야로 구분되어 있으며, 업무의 흐름, 업무처리 예시 및 관련 서식 등으로 구성되어 있습니다.

- 또한 본 자료는 기타 자료와의 중복을 피하고자 절차와 방법 위주로 제시되었으므로 「충청남도 각급학교 교구•설비 기준」 등의 안내서를 참고하기 바랍니다.

- 학교별 여건과 환경에 따라 업무 내용과 절차가 다를 수 있으므로, 본 편람과 학교 상황, 법령 및 지침 등을 참고하기 바랍니다.

- 제시된 D-day는 개교일 기준이며, 전담조직 구성 시점은 개교 전 초·중등 240일, 유치원 6개월, 특수학교는 270일로 작성되었습니다.

- 관련 서식 및 단가 등은 본 업무편람 발간 시점(2023.8.)을 기준으로 작성하였으므로, 추후 관계 법령이나 제도, 지침 등의 변경된 내용은 충청남도교육청 관련 부서에서 안내하는 지침이나 공문을 참고하시기 바랍니다.

- 본 자료와 부록은 [충청남도교육청 학교업무매뉴얼 포털]에서 열람 및 내려받을 수 있으며 향후 지속적으로 수정·보완 예정입니다.

차례

CONTENTS

Ⅰ 총괄 09

1. 개교 업무 추진 개요 11
2. 개교 업무 세부 추진 계획(업무 분야별) 12
가. 개교지원 업무 추진 12
나. 교무 · 학사 업무 추진 15
다. 개교 전담조직 및 행정실 공통 업무 추진 18
라. 학교 급식 업무 추진 19
3. 일정별 개교 업무 추진 점검표 D-DAY 20
4. 교육지원청 부서별 담당 추진 업무 26
5. 개교준비위원회 운영 27

Ⅱ 전담조직 업무 추진 29

1. 공통 31
가. 추진 개요 31
나. 실내 환경 구축 32
다. 실외 환경 구축 35
라. 학교 상징 제작 37
마. 인력 채용 38
2. 유치원 40
3. 초·중등학교 43
4. 특수학교 48
5. 이전 개교학교 52
가. 업무 추진 개요 52
나. 일정별 세부 추진 사항 53
다. 전담조직 업무 추진 54

Ⅲ 실별 구축 안내 57

1. 공통 59
가. 일반교실 59
나. 교장실 60
다. 교무실 61
라. 교사연구실(교사 휴게실) 62
마. 과학실험실 63
바. 컴퓨터실 및 전산실 64
사. 강당(체육교구실 포함) 65
아. 방송 및 시청각실 66
자. 도서실 67
차. 영어실 68
카. 음악실 69
타. 보건실과 보건교육실 70
파. 특수학급 교실 71
하. 기타실 72
2. 유치원 73
가. 교실 74
나. 도서실 75
다. 자료실 76
라. 강당(유희실) 77
3. 초등학교 78
가. 돌봄교실 78
나. 병설 유치원 78
4. 중 · 고등학교 79
가. 성적처리실 79
나. 학생 동아리실 79
다. 기술실 80
라. 가정실 80
마. 진로실 81
바. 미술실 81
5. 특수학교 82
가. 유치원 82
나. 초 · 중 · 고 교실 83
다. 중 · 고 · 전공과 직업교육실(공통) 84
라. 중 · 고 직업교육실 85
마. 전공과 직업훈련실 86
바. 기타 특별실 87

IV 학교급별 업무 추진 89

1. 유치원 **91**
가. 교무부 91
나. 연구부 92
다. 정보부 92
라. 안전부 93
마. 방과후부 94
바. 생활 · 환경부 95
2. 초·중등학교 **96**
가. 교무(기획)부 96
나. 교육과정부 98
다. 연구부 99
라. 정보 · 과학부 100
마. 생활 · 안전부 103
바. 방과후학교부 104
사. 체육부 106
아. 보건교육부 107
3. 특수학교 **109**
가. 교무부 109
나. 교육과정부(유 · 초 · 중 · 고 · 전) 110
다. 연구부 111
라. 학생 · 생활 안전부 111
마. 방과후학교부 112
바. 체육부 112
사. 정보부 113

V 개교식 115

1. 개교식 추진 개요 **117**
2. 주요 행사별 준비 **118**

[부록 자료 목록] 121

I 총괄

1. 개교 업무 추진 개요 | 11
2. 개교 업무 세부 추진 계획(업무 분야별) | 12
3. 일정별 개교 업무 추진 점검표 D-DAY | 20
4. 교육지원청 부서별 담당 추진 업무 | 26
5. 개교준비위원회 운영 | 27

5. 개교준비위원회 운영 | 27

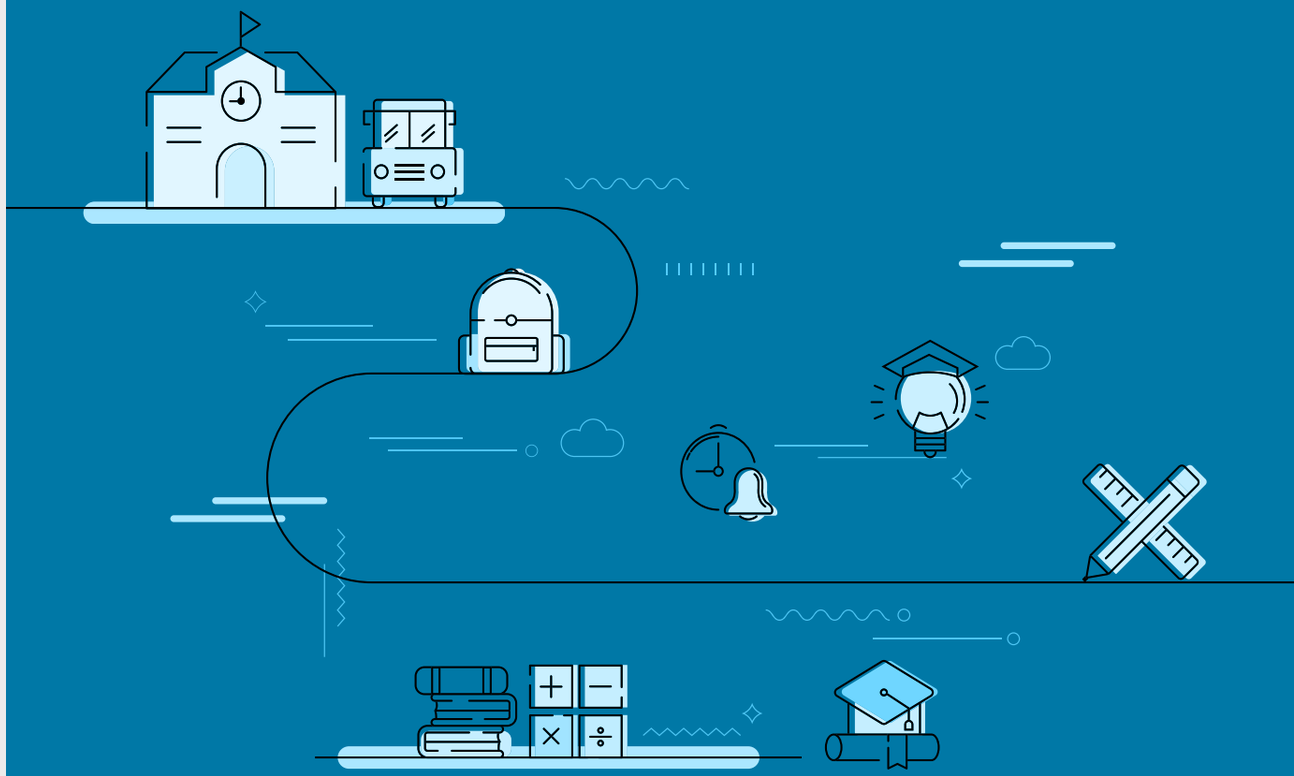

I

총괄

충청남도 신설학교 교무학사

개교 업무편람

1. 개교 업무 추진 개요

세부 업무명	주요 내용
기초자료 수집	☑ 신설학교 기초자료 수집
개교 경비 예산 배정	☑ 개교 준비에 필요한 예산 배정 – 소모품 구입비, 교재교구 구입비
교장(겸임)발령	☑ 교장 발령(8개월 전) ☑ 원활한 교무학사 운영을 위한 임시 소집 및 업무 추진 협의
지방공무원 발령	☑ 학교 전반에 관한 관리 및 유지(8개월 전)
일반 행정 업무처리	☑ 관인 관보 공고 ☑ 사업자 등록 및 조달기관 등록·회계 관련 계좌 개설 ☑ 보안 경비 시스템 설치 및 각종 시설과 비품 내역별 집행 ☑ 공사 진척 현황 및 시설현황 파악
개교 업무 전담조직 위촉	☑ 교육과정 등 학사 업무 추진(6개월 전) ☑ 시설현황 파악에 따른 실내외 교육환경 보완
교무학사 운영을 위한 각종 장부 정리	☑ 교무학사 운영을 위한 각종 장부와 대장 제작 및 정리
교육과정 운영계획 작성	☑ 학교 전반에 관한 계획 수립 및 업무 추진 ☑ 학교교육과정 운영계획 및 학교요람 작성 ☑ 학교 규칙 초안 제정 ☑ 부서별 운영계획 수립 및 시정표 작성
개교 업무 추진 점검	☑ 개교에 따른 전반적인 점검 및 보완사항 협의
각종 규정 초안 제정	☑ 부서별, 교과별 각종 규정 초안 제정
비품 배치	☑ 각 교실 및 특별실 비품 납품 및 검수·배치 완료
개교 준비 물품 점검	☑ 개교에 필요한 부서별, 교과별 물품 점검 및 보완사항 추진
신입생 예비소집	☑ 신입생 예비소집 추진
학급편성 및 입학식	☑ 학급편성 및 입학식 관련 업무 추진

2. 개교 업무 세부 추진 계획

- 업무 분야별 -

가 개교지원 업무 추진

순	추 진 업무명	세부 추진 내용	학 교		추진부서
			교육지원청	교무실	행정실	
1	**개교추진단 구성**[1]	☑ **개교추진단 구성 및 운영** • 기본적인 계획 수립 등 개교 전반에 대해 교육과(예시)에서 추진 • 신설학교 업무를 계획 수립부터 최종 점검까지 교육지원청 부서별 진행 • 단장, 부단장, 정책기획관 아래 8개 팀으로 구성(예시) *①업무 총괄 ②예산 ③교원인사 ④교육과정 및 방과후학교 ⑤교육 정보화 및 급식 ⑥일반직 인사 ⑦학교시설 ⑧학교 교육환경점검	●			교육과
2	**개교실무 협의회 구성 및 개설사무 취급 공무원 임명**	☑ **개교실무협의회 개회(교육지원청)** • 신설학교 개교 추진 현안을 관련 부서 간 유기적 협조 체제 구축을 통해 해결 *개교 업무 총괄: 교육과정 및 방과후학교, 교원인사, 교육정보화 및 급식, 학교시설, 학교 교육환경 점검, 교육행정직 인사 및 예산 등 ☑ **개설사무 취급공무원 임명** • 신설학교의 인근 학교장 또는 희망자	●			교육과 체육인성건강과 행정과 재무과 시설과 교원인사과
3	**개교 전담조직**[2] **구성**	☑ **개교 예정 학교급별 8~10명을 전담조직으로 구성하여 교육과정 등 학사 업무 추진** ☑ **전담조직 교원 위촉**	●			교육과
4	**개교 전담조직 운영 및 개교준비팀**[3] **(행정실) 구성**	☑ **개교 예정 학교 학교장(팀장) 내정자와 교원 겸임 발령** • (기간) 20○○.○○.○○. ~ 개교 시까지 • (팀장 내정이 어려울 경우) 내정 전까지 개설사무 취급 공무원 임명교에서 겸임 ☑ **개교 예정 학교 지방공무원(행정실장 등) 발령(정원 배정)** • 기간: 20○○.○○.○○. ~ • 역할: 학교 개교 준비 및 교육활동 업무지원	●			교육과 총무과 (행정과) 교원인사과

1) 개교 업무의 총괄을 담당하는 조직으로 계획 수립과 최종 점검을 담당함
(시 소재 개교는 교육지원청, 군 소재 개교는 도교육청에서 담당함)
2) 개교 업무 실무를 담당하는 교원 조직(필요시 외부 인사 포함 가능)
3) 개교 예정 학교 발령으로 개교 업무를 전담하는 지방공무원 조직

순	추 진 업무명	세부 추진 내용	학 교		추진부서
			교육지원청	교무실	행정실	
5	**근무 장소**	☑ **개교 예정 학교 발령 공무원 근무 장소** • 장소: 추후 결정 • 기간: 20○○.○○.○○. ~ 20○○.○○.○○. ※ 예정 학교 근무 여건(미준공) 미비로 별도 장소 필요 - 개설사무 취급공무원 임명교에서 제공 등	●			교육과
6	**복무 관리**	☑ **방법**: 학교장(내정 교장 또는 개설사무 취급공무원)의 명령 및 결재에 의함 ☑ **복무 관리 내용**: 근무상황, 초과근무 관리 등		●	●	행정실
7	**개교 예산집행 계획 및 편성**	☑ **개교예산 집행 계획 수립** ☑ **개교예산 편성** ☑ **회계관련 공무원 재정보증보험 가입**				
8	**관인 조각 및 등록**	☑ **관련 법령**: 행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정, 충청남도 교육감과 그 소속기관 공인 조례 ☑ **공인 조각** • 학교 직인, 회계관계공무원 직인, 학교운영위원회인 • 직인 조각: 1개(2.4cm×2.4cm) ※공인명, 규격, 서체 등은 충청남도교육감과 그 소속기관 공인 조례 참조 ☑ **관보 공고 및 공인대장 등록** • 관보 공고 - 대한민국 전자관보(www.gwanbo.go.kr) 관인등록 공고 • 공인대장 및 전자이미지공인대장 등록 - 충청남도교육감과 그 소속기관 공인 조례 제6조			●	행정실
9	**고유번호증 발급 신청**	☑ **신청기관**: 세무서 • 관련 규정: 부가가치세법 제8조와 법인세법 제111조 ☑ **제출 서류** • 고유번호증 발급 신청서(부가가치세법 시행규칙 별지 서식) • 홈택스서비스 이용 신청서(국세기본법 시행규칙 별지 서식) • 개교 예정 학교장 임명 공문 사본 • 위임장 • 학교장, 위임자 신분증 사본 • 충청남도도립학교설치조례 공포 공문 사본			●	행정실

순	추 진 업무명	세부 추진 내용	교육지원청	학교 교무실	학교 행정실	추진부서
10	**통장개설 및 금고계약**	☑ 학교회계 전속거래 약정, 계좌 개설(학교회계, 학교발전기금회계, 세입세출외현금, 학교카드) • e교육금고 등 전자지출서비스 이용 신청 • 학교회계 계좌 개설 현황 보고(결과 제출) • 학교카드(충남교육사랑카드) 발급 신청			●	행정실
11	**각종 업무 연계기관 등록**	☑ 조달청(G2B), 학교장터(S2B), 홈택스, 급여관련기관(공무원연금관리공단, 교직원공제회, 4대보험등) 수요기관등록 및 이용자 등록			●	행정실
12	**전화 개설 신청 및 인터넷 신청**	☑ 전화 개설 • 개설 대수(예정): ○대(학교 여건을 고려하여 수량 결정) • 신청예정일: 20○○.○○.○○. • 팩스용, 승강기용 국선전화 신청 (정전 대비) ☑ 인터넷 신청 • 행정실은 별도로 컴퓨터 신청과 동시 개설 • 학내망 구성 완료			●	행정실
13	**신설학교 환경점검**	☑ 실내 공기질 검사 ☑ 먹는 물 검사	●			체육인성건강과

나 교무·학사 업무 추진

순	추 진 업무명	세부 추진 내용	교육지원청	학교 교무실	학교 행정실	추진부서
1	**교무·학사**	☑ **학교 교육과정 운영계획(안)** ☑ **학교 상징(교훈, 교표, 교화, 교목, 교가) 구안** ☑ **각종 운영계획 수립(안)**		●		개교전담조직
2	**신입생 전입학생**	☑ **신입생 예비 소집** • 신입생 반 배정 ☑ **전입생 접수** • 전입생 접수 기간 홍보(관리사무소, 학교누리집) • 전입생 반 배정 ※ 분리 개교 시 나이스 일괄 작업 안내서 또는 교육청 문의		●		개설사무 취급교 개교전담조직
3	**개교준비 위원회**	☑ **개교준비위원회(개교업무지원 통합위원회-개교 전담조직)** • 물품선정위원회 및 도서선정위원회 부록 Ⅰ-2-나-① • 교육과정위원회 • 인사자문위원회		●		개교전담조직
4	**부임교사 학교안내 등**	☑ **부임교사 학교 안내 및 학교 교육 계획 수립을 위한 설문조사**		●		(겸임)교장
5	**기관 아이디 등록 및 권한 부여**	☑ **해당 기관 시스템관리자(사용자 ID) 통보** ☑ **기관용 인증서 발급 신청** ☑ **시스템관리자(사용자 ID)에 마스터 ID 등록할 수 있는 권한 부여**: 충남교육청교육과정평가정보원(교육지원청) ☑ **시스템관리자는 사용자 ID로 접속** • 시스템 관리→사용자 관리→사용자 등록 메뉴→해당 기관용 전자인증서 등록→마스터 ID 등록→마스터 ID 통보 ☑ **마스터 ID에 권한 부여**: 교육지원청 ☑ **해당 기관 마스터 ID 로그인→에듀파인 사용자에게 업무 분담에 의한 권한 부여**	●		●	교육과정 평가정보원 개교전담조직
6	**스마트 환경**	☑ **정보화 사업(컴퓨터실, 학내망) 구축점검** ※ 정보화기기 지원 여부(미래인재과) 검토 ☑ **학교 누리집 구축점검** ※ (누리집)구축 → 충남교육청교육과정평가정보원 내용 구성 → 개교 예정교 개교 전담조직 ☑ **학교 생활기록부 전산처리 및 관리지침 제정 자료 수집 및 작업 업무** ☑ **방송 및 기자재 활용 점검** • 학교시설 인수인계	●	● ● ●		개교전담조직 교육과정 평가정보원 개교전담조직

순	추진 업무명	세부 추진 내용	교육지원청	학교 교무실	학교 행정실	추진부서
7	특별실	☑ **특별실 교재 및 교구 구입** • 특별실 비치 교재·교구와 도서실 도서 선정 ☑ **특별실 구축** • 비품 및 교재교구 검수 • 특별실 사용 시간표 • 교구장 제작(음악, 체육, 미술 등)		●	●	개교전담조직 행정실
8	신설학교 각종 규정 준비	☑ **교내 각종 규정 마련(기본 틀 작성 제공)** • 위임전결 규정, 학교운영위원회 규정 등 ☑ **학교 상징물 및 교가 제정** • 교가 제정, 교훈, 교표, 교가, 교목, 교화 등 • 학교 상징물 및 교가 개교 후 학교운영위원회 심의		● ●		행정실 개교전담조직
9	학교 운영위원회 구성 추진	☑ **학교운영위원회 구성계획 수립(개교 후 구성)** • 구성 시기, 위원정수 및 구성 비율, 조직 등 • 보호자위원, 교원위원, 지역위원, 위원장·부위원장 선출 방법 등 ☑ **학교운영위원회 규정 및 회의 규칙 수립**			●	행정실
10	제장부 비치	☑ **각종 행정 서식 준비** • 보안점검부, 당직 근무일지, 초과근무확인대장, 발령대장, 공고대장, 신용카드 사용대장 등			●	행정실
11	신설학교 안내	☑ **보호자 홍보 대책** • 누리집, 언론기관, 아파트 단지 홍보를 통하여 전출입 방법, 교육과정 일정 등 안내 ※ 도교육청, 신설학교, 정부 기관 누리집 홍보 의뢰		●		개교전담조직
		☑ **전직원이 안내할 수 있도록 신설학교 안내서 작성, 직원 교육 등 추진** 부록 Ⅰ-2-나-② • 안내서 작성(1월) • 안내 사항 홈페이지 게시(1월) • 직원 교육(1, 2월) ※ 전출입, 중학교 배정, 통학구역, 예비소집일 등	●	●	●	개교전담조직 행정실
12	방과후 학교	☑ **방과후학교(돌봄교실) 운영 준비 및 추진**		●		개교전담조직

순	추진 업무명	세부 추진 내용	교육지원청	학교 교무실	학교 행정실	추진부서
13	인사	☑ **인사자문위원회규정** ☑ **보직교사 임용규정** ☑ **학급 담임 및 업무 분담 규정 및 배정** (교원명부, 직원주소록 작성 포함) ☑ **학년 및 업무 희망서 작성**		●		개교전담조직
14	기간제 교사 등 채용	☑ **신설학교 자원부족 시 기간제교사, 교육공무직 등 채용** ☑ **신설학교 배움터지킴이 위촉으로 학생 생활지도 활동 지원**		●	●	개교전담조직 행정실
15	각종 규정 준비	☑ **학교 규칙, 학생생활규정, 보결수업규정, 인사자문위원회 규정, 위임전결규정, 교무위원회규정, 학교폭력 대책 자치위원회규정, 교원능력개발평가 관리위원회규정, 학업성적관리규정 등**		●		개교전담조직
16	교과서	☑ **신설학교 검인정 교과서 선정 계획(안)** • 인근학교 검인정 교과서 참고(개교 후 학교운영위원회 심의) ☑ 교과용 도서 주문 및 교과용 도서 배분 계획 수립		●		개교전담조직
17	물품 구입	☑ **학교 회계 예산요구서 작성** ☑ **학습준비물 요구 목록 작성** ☑ **사무용품 구입 목록 작성** ☑ **청소도구 구입 목록 작성** ☑ **실별 배치계획 수립**(표찰, 책·걸상, 청소 구역, 교실 환경 등)		●	●	개교전담조직 행정실
18	직원조직 및 배치 (공통)	☑ **발령 후 전교직원 학교 업무지원** ☑ **직원소집 계획 수립 추진** • 신고: 인사 발령된 교직원 신고 • 직원소개: 교감 • 학교장 인사 ☑ **신설학교 현황 작성** ☑ **교원명부와 비상연락망 작성** ☑ **학년별 교실 배치계획 수립** • 표찰과 실별 관리책임자 부착 • 책·걸상 수 파악 및 높이 조절 등 • 청소 구역 배정 • 교실 환경 계획 수립		●	●	개교전담조직 행정실
19	개교식 행사	☑ **개교식** • 교육지원청 및 도교육청과 일정 협의		●	●	개교 후

다 개교 전담조직 및 행정실 공통 업무 추진

순	추진 업무명	세부 추진 내용	교육지원청	학교 교무실	학교 행정실	추진부서
1	행정장비 구입·배치	☑ **행정 장비 구입 계획 수립 및 추진** • 교장실, 교무실, 행정실, 보건실, 교사연구실, 급식실 등 행정 장비 필요 수량 파악 ※ 행정 장비: 복사기, 등사기, FAX 등		●	●	개교전담조직 행정실
2	관리실 비품 구입·배치	☑ **관리실 비품 구입·배치 계획 수립 및 추진** • 교장실, 교무실, 행정실, 보건실, 교사연구실 등 관리실 사무용 가구 및 가전제품 구입·배치 계획 수립 • 비품: 공기청정기, 냉장고 등		●	●	개교전담조직 행정실
3	특별실 비품 구입·배치	☑ **특별실 비품 구입·배치 계획 수립 및 추진** • 도서실, 과학실, 음악실, 방송실 등 특별실 기자재와 비품 구입, 배치계획 수립, 비품 및 기본도서 • 과학실: 실험·실습 물품 • 음악실: 피아노, 오디오시스템 등 • 방송실: 기자재와 비품 ※ 돌봄교실(초), 특수학급, Wee-Class 구축 및 비품 구입		●	●	개교전담조직 행정실
4	교구 구입·배치	☑ **각종 교구 구입·배치 계획 수립 및 추진** • 교육과정 파악 후 구입 목록 선정 • 예산을 고려하여 학교 실정에 맞게 구입		●	●	개교전담조직 행정실
5	실내·외 환경 구성	☑ **실내(교장실, 현관, 복도 등) 환경 구성계획 수립** ☑ **실외(교명판 등) 환경 구성계획 수립** ☑ **실별 표찰 부착 계획 수립** • 표찰 도안 작성→내용 및 수량 파악 및 부착 ☑ **가림막 설치계획 수립** • 일반교실, 특별교실, 관리실 등 가림막 설치장소 결정 • 장소별 특성을 고려하여 가림막은 일반커튼, 버티컬, 로만셰이드, 방염 커튼 등으로 설치		●	●	개교전담조직 행정실
6	사무용품, 청소도구, 관리 용품 등 구입·배치	☑ **사무용품 구입** • 복사지, 필기도구, 지우개 등 교수·학습 물품 및 행정 사무용품 구입(안) 작성 ☑ **청소도구 구입**: 빗자루, 쓰레받기, 휴지통, 청소기 등 ☑ **관리용품 구입**: 열쇠, 각종 공구, 열쇠고리, 열쇠박스 등		●	●	개교전담조직 행정실
7	어린이보호구역 지정신청	☑ **어린이보호구역 지정 신청서 제출** ☑ **어린이보호구역 지정 알림 접수**		●	●	개교전담조직 행정실
8	도로 점용신청	☑ **도로변 학교 안내 표지판 허가신청**			●	행정실
9	도로명주소 신청	☑ **도로명 건물번호 부여 신청**			●	행정실

라 학교 급식 업무 추진

순	추진 업무명	세부 추진 내용	교육지원청	학교 교무실	학교 행정실	추진부서
1	급식기구 구입 및 배치	☑ **급식실 설계도면 검토** ☑ **급식기구 구입 및 배치** • 구매내용: 급식기구(소독기 등) • 급식기구 배치계획 수립·납품 완료	●			학교급식팀
		☑ **급식실 설계도면 확인 및 급식기구, 기물류 구입** • 구매내용: 교육청 구매 외 물품(식판 등)			●	개교전담조직
2	학교 급식 납품업체 선정 및 계약 추진	☑ **학교 급식 납품업체 선정 및 계약 추진** • 업체 선정: 전문화된 품목별 업체로 분류하여 선정 – 학교 급식 식재료, 우유 등 • 계약 방법: 일반경쟁입찰 또는 수의 계약			●	행정실 급식실
3	급식 관련 신고 및 시설 관리	☑ **위생교육 이수** ☑ **집단급식소 설치 신고** • 시(군)청에 신고 • 급식 개시 10일 전 ☑ **액화석유가스특정사용시설 완성검사** • 한국가스공사 신청(급식 개시 7일 전) ☑ **음식물쓰레기감량의무사업장 이행계획 신고** • 시(군)청에 신고(급식 개시 7일 전) ☑ **음식물쓰레기 수거업체 계약** ☑ **폐유수거업체 계약** ☑ **급식실 소독 시행** ☑ **급식 개시 보고** • 교육청(급식 개시 후 2일 이내)			●	급식실 행정실
4	각종 보험 가입	☑ **가스배상책임보험 가입** • 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제33조 (급식 개시 7일 전)			●	행정실
5	학교 급식 준비 운영	☑ **학교 급식 시행을 위한 준비 및 청소** • 일용인부 사역: 조리사와 조리실무사 발령 예정인 자 등 사역 후 대금 지급 ☑ **학교 급식 시범 운영** • 대상: 발령 교직원이나 교육청 직원 등 • 급식 개시 5일 전	●		●	학교급식팀 급식실 행정실

3. 일정별 개교 업무 추진 점검표 D-DAY

전: 개교 전담조직, 개: 개설사무 취급교 원: 교육과정평가정보원, 청: 교육지원청, 급: 학교급식팀, 행: 행정실

일 자	세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
개교준비요원 발령 시	학교 공사 현장 방문 사진 자료 준비 및 상황 점검		청
개교준비요원 발령 직후	개교 관련 우선순위 협의 및 개교준비요원 업무분장		청
D-240	개교 준비 요원의 업무관리시스템 상의 겸임 지정		청
D-240	에듀파인 상의 〈예산〉 프로그램 사용할 수 있도록 조치		청
D-240	기관 인증서 신청		행
D-240	신설학교 개교업무 추진계획 수립		행
D-240	신설학교 개교경비 집행계획 수립		행
D-235	CNE메일 기관 계정 가입 신청(초등학교-병설유치원용 별도 신청)		행
D-240	개교경비 본예산 편성		행
D-235	직인 조각		행
D-230	관인 관보게재		행
D-230	도로명 건물번호 신청		행
D-230	어린이보호구역 지정신청		행
D-230	고유번호증 발급		행
D-230	학교회계 계좌 개설, 법인카드 발급, 농협기업뱅킹 빠른조회 서비스 신청, e-교육금고·EFT 이용계약 체결		행
D-230	학교회계 계좌 등록 요청		행
D-220	조달수요기관 등록 및 공인인증서 발급 신청		행
D-220	개교준비 지원단 사전 협의회 실시		청
D-220~180	학교시설 현황 파악 (신축공사 현장 방문, 건축·전기·기계설비·소방 설계도면 숙지)		전, 행
D-210	학교 배치도 작성		전, 행
D-210	특별실 위치 변경 요청(해당 시-시설과 업무 담당자 협조 후 공문 시행)		전, 행
D-210	유휴자금 예치		행
D-210~180	우수 교육시설 견학 및 실내·외 환경 구축 자료 수집		전, 행

전: 개교 전담조직, 개: 개설사무 취급교 원: 교육과정평가정보원, 청: 교육지원청, 급: 학교급식팀, 행: 행정실

일 자	세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
D-200	통학 안전 시설물 확보 협조 요청 (어린이보호구역 안전 시설물 점검 미비 시설물 설치 요청)		행
D-180	학교 누리집 개설 및 권한 부여 요청(학교 영문 확인)		전, 원
D-180	검색 포털에 학교 정보 검색 등록		전, 행
D-180~150	실별 집기류, 정보화기기, 전자제품 수요 조사 또는 비품 선정		전
D-180~150	교과용 도서 선정(주문: 교육지원청과 공급소 담당자 협의)		전
D-150	실별 명칭 확정(강당 명칭 등)		전
D-120	단위 학교 사업선택제 공모사업 신청		전
D-120	이정표 설치를 위한 도로 점용 허가신청		행
D-120~100	특별실 구축 계획 수립 -보건실 현대화, 돌봄교실 공간 재구조화, Wee-Class, 영어실 -도서실 환경 구축, 체육 교구 선반, 음악 교구장 등		전, 행
D-100~60	특별실과 관리실 구축 적정성 확인 (필요시 변경 용역 또는 견적 의뢰)		행
D-90~60	교재교구 선정(과학, 음악, 미술, 체육, 실과, 영어 등) 도서실 도서 구입 목록 선정 급식기구·기물류·소모품 선정 보건실 비품 선정		전
D-70	학교 누리집에 전입생 안내 사항 공지		전
D-65	신입생 예비 소집(초등)		개
D-65	신입생 예비 소집 안내자료 제작 (전입생 안내자료와 같이 주민센터에 비치 요청)		전
D-60	교무학사 예산요구서 작성		전
D-60~45	실별 표찰과 교명판, 학급 안내판, 특별실 게시판, 교무실 월중행사, 학교 현황, 블라인드 등 제작 시안 요구		전, 행
D-58	학교 교육과정 운영계획 작성(학사일정 등)		전
D-53	교과서 수량 파악 및 보관 장소 확인		전
D-50	이전 개교학교 방문 및 자료 수집, 보호자, 지역 인사 의견수렴		전, 청
D-50	4대 보험 사업장 신고		행
D-47	돌봄교실 운영계획 및 대상 학생선발		전
D-45	인력 채용 계획(인사발령 이후 결원 인력)		전, 행

전: 개교 전담조직, 개: 개설사무 취급교 원: 교육과정평가정보원, 청: 교육지원청, 급: 학교급식팀, 행: 행정실

일 자	세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
D-45	각종 전산프로그램 구입		전, 행
D-45	특별실 구축(공간 재구조화) 계약		행
D-45	실별 표찰 및 교명판, 학급 안내판, 특별실 게시판, 교무실 월중행사, 학교 현황, 블라인드 등 시안 확정		전, 행
D-41	인력 채용 공고(인사발령 이후 결원 인력)		전, 행
D-40~20	사무기기(전자복사기, 팩스 등 기본사무기기) 구매		행
D-40	교표(안) 추진		전
D-40	표찰 제작 신청, 문주석(교명판) 제작 결정		행
D-40	예비 소집 및 학교 교육과정 설명회(개교 전) 누리집에 공지		전
D-39	각종 소모품 신청(사무용품, 고무인 등)		전, 행
D-38	채용 관련 면접 계획 수립		전, 행
D-36	원어민영어보조교사 배치 현황 파악(초)		전
D-35	업무별 각종 양식 및 일지 제작		전
D-35	채용 관련 면접 대상자 안내(서류 심사 후)		전, 행
D-31	채용 관련 면접 및 성범죄 조회 의뢰		전, 행
D-30	교표 시안 확정 및 교가 녹음(AR, MR) 의뢰		전
D-30	학교시설 방문 점검 및 시설 관련 수정 요청		전, 행
D-30	놀이기구 종류 및 위치 선정		전
D-30	배움터 지킴이실 구축 위치 선정 및 품의 요구(공사비 포함)		행
D-30~25	교실 및 특별실 각종 집기와 물품 검수		행
D-30	개교 준비 상황 중간 점검		전, 행
D-30	전기 안전 점검, 소방 안전 점검, 승강기 안전 관리 등 용역업체 선정 방법 결정 및 계약 추진		행
D-30	교장실 현황판, 학교시설 배치 안내판 제작 시안 의뢰		전
D-29	3월 학습준비물 신청		전
D-26	인력 채용 관련 계약서 작성(위촉장)		전, 행

전: 개교 전담조직, 개: 개설사무 취급교 원: 교육과정평가정보원, 청: 교육지원청, 급: 학교급식팀, 행: 행정실

일 자	세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
D-25	교무실 및 학년(교과)연구실 집기 시설 완료		행
D-25	교내 음수기 설치		행
D-25	학내망 점검(각종 프로그램 구입 및 설치 완료) 각 실 무선 AP 설치 요청		전
D-25	신설학교 근무지 이동 전에 전화 가설 및 인터넷선 완료		행
D-25	신설학교로 이동		행
D-25	검색 포털에서 학교 정보 수정(학교 연락처)		전
D-24~22	학교 규칙 및 제 규정, 내규 초안 작성		전
D-22	각 교실 및 특별실 비품 설치 완료		행
D-21~1	실별 표찰과 교명판, 학급 안내판, 특별실 게시판, 교무실 월중행사, 학교 현황, 블라인드 등 부착		전, 행
D-20	초등 전입생 서류 접수 시 교과서 지참 안내		전
D-20	관리실의 소모품과 사무용품 납품 여부 점검		전, 행
D-20	임시 인사자문위원회 규정 제정 및 조직		전
D-20	급식납품업체 선정		급
D-20	급식 부식품 구매 계획 및 입찰 공고		급, 행
D-20	돌봄교실 신청서 배부		전
D-18	신학년도 학사 일정 및 시정표 완성		전
D-17	도서관 DLS 신청		전
D-17	전입교사 업무 배정 희망 및 인적 사항 조사(교원발령 후)		전
D-17	신규교사 NEIS 인증서 신청		전
D-16	전입교사 대상 개교 준비 현황 및 일정 안내		전
D-15	교화, 교목, 교훈 확정(안)		전
D-15	수목 표찰 제작 의뢰(시공사)		행
D-15	영양교사 급식실 검수 및 환경조성		급
D-15	급식계획 수립		급

전: 개교 전담조직, 개: 개설사무 취급교 원: 교육과정평가정보원, 청: 교육지원청, 급: 학교급식팀, 행: 행정실

일 자	세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
D-15	청소 용구 신청		전
D-15	임시 인사자문위원회 개최		전
D-14	교육과정 설명회 및 입학식 현수막 의뢰		전
D-14	업무 분장 및 학년, 부장교사 배정		전
D-13	업무별로 도서와 교구, 비품 점검하기		전
D-13	업무별로 특별실 정리하기		전
D-13	방과후학교 사용 교실 배정		전
D-13	학년 교육과정 준비		전
D-13	각종 시설 인수인계(방송 등)		전, 행
D-13	태블릿PC 신청(교원용+학생용)		전
D-12	급식 개시 전 시운전 계획		전
D-12	청소 구역도 작성		전
D-12	청소 용구 배부		전
D-12	학교시설 및 비품 점검 후 보강 계획 수립		전, 행
D-12	공기질 검사 대비 환기(베이킹아웃 실시)		전, 행
D-11	원어민영어보조교사 인솔		전
D-10	교표 확정과 교기 제작 의뢰		행
D-10	학교 교육과정 1차 완성		전
D-10	학교 요람, 보호자 연수물 제작		전
D-10	방과후학교 외부 강사 대상 연수		전
D-10	방과후학교 맛보기 수업(첫 1주일) 재료 신청		전
D-9	교과서와 지도서 학년별로 배부		전, 행
D-9	전자칠판 사용(업체) 및 태블릿PC(교육청) 사용 연수		전
D-8	입학식, 시업식, 교육과정 설명회 업무 배정		전
D-6	돌봄교실 및 특별실 구축 완료		전

전: 개교 전담조직, 개: 개설사무 취급교 원: 교육과정평가정보원, 청: 교육지원청, 급: 학교급식팀, 행: 행정실

일 자	세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
D-6	배움터 지킴이실 설치 완료		행
D-6	놀이기구 설치 완료		전, 행
D-6	학생 학급 배정 완료		전
D-5	준공청소(전체 청소, 특히 창틀) 완료		행
D-4	교육과정 설명회, 담임 발표 및 교직원 소개		전
D-4	학급 발표(누리집 및 교육과정 설명회장에 안내)		전
D-3	학급 시간표, 학교 시정표, 등교 첫날 준비물 누리집에 공지		전
D-3	방과후학교 및 돌봄교실 사전점검		전
D-2	학급 환경점검 및 학급 경영 소개 자료 준비		전
D-2	시업식, 입학식 준비 점검		전
D-1	개교, 시업식, 입학식		

※ 본 점검표는 예시이며, 학교 상황에 맞게 계획을 수립하여 추진
※ 교원 인사발령 이후 전담조직 업무는 발령받은 교원과 협조하여 추진

4. 교육지원청 부서별 담당 추진 업무

추진 부서	추진 업무
교육과	• 개교 업무 총괄 기획 • 개교사무 세부 추진 계획 수립 및 추진 • 개교 전담조직 발령 • 교원정원 배정 및 교육공무원 발령 • 개교식 및 입학식 준비 지원 • 교과용 도서 분배계획 수립 및 주문 • 교육과정 편성 및 교육프로그램 운영 수립 지원 – 개교 전담조직 운영 • 도서·유아·특수·방과후·교재교구 점검 및 확충 • 교과서 선정, 신설학교 안내서 작성 • 교육 정보화 점검 • 과학 기자재 점검 및 확충
체육인성건강과	• 학교운영위원회 구성 업무 지도 • 학생생활 업무 지도 • 체육 교재 교구 및 점검 및 확충 • 급식학교 지정 및 급식계획 수립 지도 • 급식실 시설 사전점검 및 시험가동 지도 • 보건실 구축점검 및 공기질 관리 지도 • 교육환경 보호구역 설정과 CCTV 설치 관리
행정과	• 학급편성 및 배정 • 지방공무원 정원 배정 • 개교준비팀(교육행정직) 발령 • 교명 선정과 충청남도 도립학교 설치조례 개정 • 지방공무원 발령 등 정원 배치 • 제장부 비치 확인 및 지도 • 보안 업무 지도 • 회계 관계 공무원 관직 지정 • 사업자등록증 신청, 조달청 수요기관 등록
시설과	• 학교시설공사 추진 상황 점검 • 시설 공사 준공(준공식) • 학생용 책·걸상, 사물함, 칠판, 게시판 등 배치 • 소방설비, 도시가스 인입, 전화 등 점검 • 전기, 상·하수도, 우수 정화조 점검 • 기타 시설·설비 점검 및 주변 정비 • 학교 인터넷 개설 • 교육·교원용 PC 배치 및 점검 • 행정실 직원 배치 전 시설 및 재산관리 • 소방 계획 및 물품 수급 관리 계획 수립 지도 • 재산 및 물품 공부 관리
재무과	• 개교경비 집행

※ 위는 예시이며, 교육지원청 상황에 맞게 계획을 수립하여 추진

※ 고등학교는 도교육청에서 추진

5. 개교준비위원회 운영

구 분	내용 및 세부 사항	시 기
목 적	☑ **신설학교의 민주적이고 합리적인 개교 업무지원** ☑ **물품 및 교재 교구 구입의 타당성 확보 및 만족도 제고** ☑ **각종 인사에 대한 다양한 의견 제시 및 투명성 확보**	
역 할	☑ **교재 교구, 도서, 인력 채용과 인사 결정, 학교교육과정 편성 등 기타 개교 업무 중요사항에 대한 의견 제시 및 심의·자문·의결**	
구 성	• 위원장 • 부위원장 • 위원: 내부위원(전담조직 교직원)과 외부위원 • 위원 수: 규모와 심의사항에 따라 적의 구성 • 위원의 자격: 개교 업무의 심의사항에 대한 전문성을 가진 자	전담조직 구성 시
협의회	☑ **개교준비위원회장의 소집 요구와 위원 1/3의 요구가 있을 시 개최** 부록 Ⅰ-5-① ☑ **개교 준비를 위한 심의사항이 있을 시 수시 개최** ☑ **주요 심의사항** • 전담조직이 선정한 교재 목록 및 타당성 검토 • 교재 교구의 규격 및 적합성 검토 • 도서 선정에 따른 적정성 • 담임 배정 등 교내 인사에 따른 심의 및 자문 • 계약직 교원 및 신규 인력 채용 자문 ☑ **의결: '과반수 이상의 동의' 등 규정안으로 명시**	필요시
의결 결과 처리	☑ **개교준비위원장 및 전담기구 팀장에게 서면 보고** 부록 Ⅰ-5-② • 의결서 • 회의록 등	의결 후

Ⅱ

전담조직 업무 추진

1. 공통 | 31
2. 유치원 | 40
3. 초 · 중등학교 | 43
4. 특수학교 | 48
5. 이전 개교학교 | 52

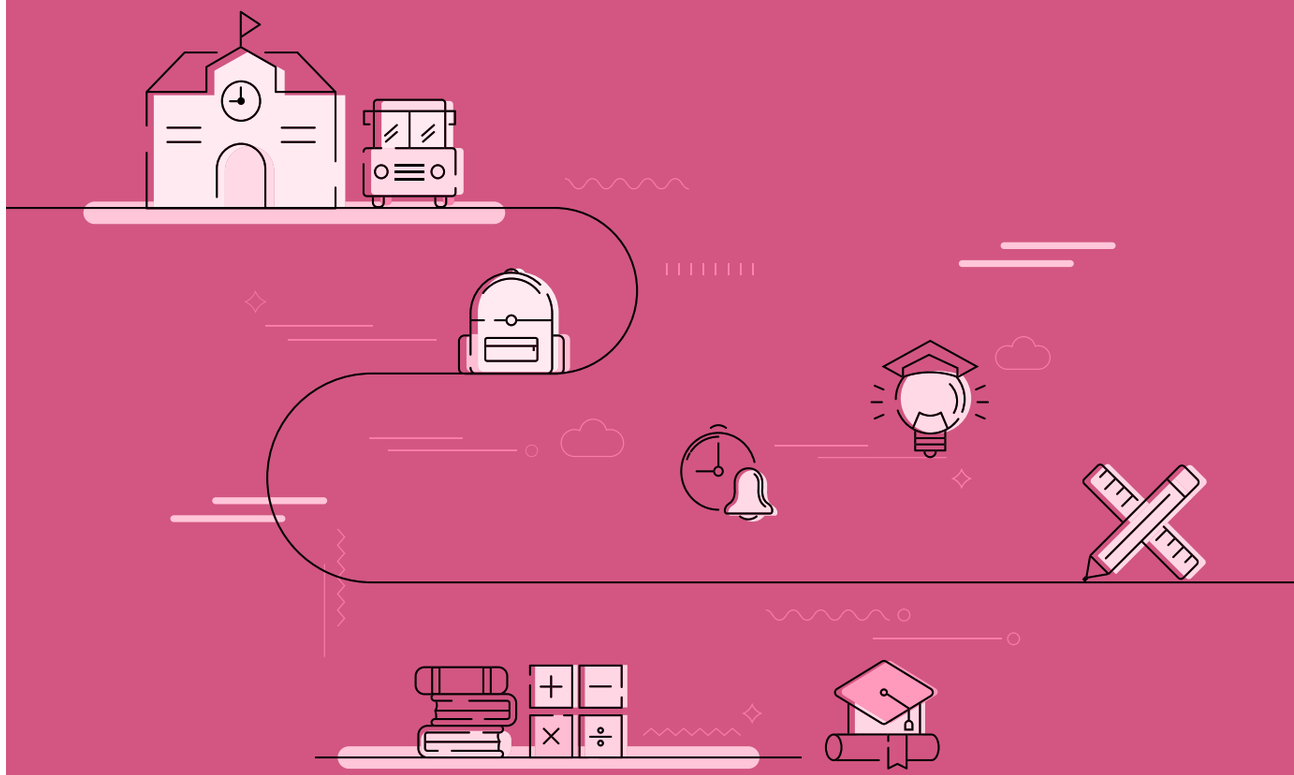

Ⅱ

전담조직 업무 추진

충청남도 신설학교 교무학사

개교 업무편람

가 추진개요

추진 업무명	주요 내용
실내 교육환경 구축 계획 수립	☑ 학교 설계도 확보 및 신축학교 실측 확인 -교실, 특별실, 관리실 위치 확인
실별 명칭 표찰	☑ 학급, 특별실 명칭 표찰 선정 ☑ 실별 표찰 시안 확정 부착
실별 비품 선정 및 구입	☑ 기자재와 가구 배치를 위한 실측 시행 ☑ 교육청 일괄 구입 물품 확인 후 필요 비품 자체 선정 후 구입
현관문과 창문 작업	☑ 각 실의 특성에 맞는 선팅디자인, 블라인드 선택 ☑ 학교 특성을 살린 출입문(유리) 띠 라벨 디자인 구상 제작
학교 안내 배치도	☑ 학교 규모에 맞게 크기 고려하여 제작 ☑ 복도게시용 학급 안내판
실별 비품 검수	☑ 실별 비품 검수 확인 배치 ☑ 추가 필요 비품 구입 시 예산 확인
준공 청소	☑ 2주일 이상 환기 필요 (겨울철 – 히터 가동) ☑ 실내 공기질 검사 및 먹는 물 검사
시설 안전 점검	☑ 각 실 및 교내 시설 안전 관련 점검 ☑ 계단, 복도 등 시설 안전 및 학생 출입 동선 확인 ☑ 점검 후 수정 요청
실외 교육환경 구축	☑ 교문 게시용 교명표 제작 의뢰 ☑ 어린이 보호구역 지정신청 ☑ 도로 표지판 설치(도로 점용 신청) ☑ 도로명 주소 건물번호 신청 ☑ 급식실 주변 안내판, 학교 안전 관리 안내판 설치 ☑ 학교 놀이 시설 설치 ☑ 배움터 지킴이실 구축
교육과정 편성	☑ 학교 교육과정 편성
학교상징 제작	☑ 교표 제작, 교화·교목 확정 ☑ 교가, 교기 제작
신설학교 인력 채용	☑ 인력 채용 관련 분야 파악 및 예산 확인 ☑ 채용 관련 면접 계획 수립
개교식	☑ 개교행사계획 수립

나 실내 환경 구축

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**구축 계획 수립**	☑ **실별 위치 및 용도 확인** • 학교 설계도 및 현장 답사 실측으로 계획 수립 • 교실, 특별실, 관리실 위치 확인	D-220
	실별 명칭 표찰	☑ **실별 배치 및 명칭 선정** • 저학년과 고학년의 배치: 저층은 저학년으로 고층은 고학년으로 하되, 출입구를 분산 배치하고 동선을 최소화함 • 실별 명칭: 학급과 특별실을 구분하여 선정 – 숫자의 학년, 반, 이름 외 학년의 특성에 맞는 반 이름으로 명명하기도 함 (예: 3학년 1반, 잎새반, 2반 줄기반) ☑ **학교 배치도 작성** • 교실 배치(학년, 학급, 특별실, 관리실 등)	D-150
		☑ **실별 표찰 제작 의뢰** • 업체 선정과 실별 표찰 시안 확정 – 돌출형 및 벽면 부착형 선택 – 영문 표기 여부 선택 가능 부록 Ⅱ-1-나-①	D-60
		☑ **실별 표찰 부착** ☑ **각종 안내 표시물 부착** • 학급 안내판, 학급 게시판 등(부착 위치를 미리 표시하여 둠)	D-20
2	**실별 비품 선정 및 구입**	☑ **실별 비품 선정 및 구입** • 실별 목적사업비 확인(개교준비경비 등) • 물품선정위원회 및 구입 방법 결정(행정실 협조) – 가구 구입 등은 조달구입으로 추진하되 금액에 따라 다수공급자 계약 검토 • 가구 배치에 따른 실측 필요 – 문, 창문 위치 확인하여 실의 특성에 맞게 선정 • 충남교육청 각급학교 교구·설비 기준에 의거 선정 • 교육청 일괄 구입 여부 확인 필요 물품 – 급식실 관련 비품 전체 – 일반교실 비품 전체 – 출입구 내빈용 신발장 – 특별실 학생용 책걸상 – 일반교실, 특별실 교사용 책걸상 – 교원용 pc(교원 수 기준 여유 수량 확보) • 교육청 지급 외 필요 비품 자체 선정 후 구입 – 우수 조달등록 물품 우선 구입 – 도서실 전체 비품 – 관리실 비품(확인 필요) – 특별실 수납 및 정리용 비품 부록 Ⅱ-1-나-② – 기타 비품 (체육관, 과학실, 상담실, 교사연구실, 휴게실 등) • 교무실 사무용품 선정 및 구입	D-180 ~150

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
3	**무선 네트워크 구축**	☑ **무선 AP 설치** • 실별 정보화기기 무선 AP 수량의 적정성 확인	D-40
4	**누리집 개설 및 도서관 DLS 신청**	☑ **학교 누리집 개설과 학교 알리미 관련 앱 선정** • 학교 누리집 구성 기본사항 결정 후 누리집 개설신청 • 학교 누리집 개설 후 각종 포털 사이트 등록 신청 ☑ **도서관 DLS 신청**	D-40
5	**현관문과 창문 작업**	☑ **실별 블라인드(커튼) 의뢰** • 업체 선정(수의 계약) 또는 조달등록 물품 • 1,000만원 이상 계약시 직접생산확인증명서 제출 – 관련 근거: 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 • 실별 블라인드 예시 – 과학실: 실사 암막(복도 및 창 쪽 모두) – 방송실 및 시청각실: 암막 – 도서실: 실사 및 패브릭 블라인드 – 교실, 관리실, 특별실별 디자인 선택 ☑ **유리문 또는 유리창 선팅 의뢰** • 업체 선정(수의 계약) • 선팅 예시 – 급식실, 도서실: 실사 디자인 – 관리실: 불투명 – 학교 출입문: 띠 라벨(교육 비전 및 교표, 교명)	D-50
	학교 안내 배치도	☑ **학교 안내 배치도(점자 안내도) 의뢰** • 업체 선정(수의계약) • 학교 안내 배치도 예시(벽부착형 및 스탠드형) ☑ **기타** • 복도 및 급식: 게시판, 안내판 • 계단: 학급안내판, 우측통행 • 보안 유지 지역 출입제한 표시 • 업체 선정(수의계약)	D-20
6	**실별 비품 검수**	☑ **실별 비품 검수 및 배치** • 비품 이상 여부 확인 • 가구 비품 위치 선정 • 전자제품 설치(전원, LAN, IP주소 확인) • 관리실 책상 유리와 소파 등받이, 방석 구입 ☑ **추가 필요 비품 선정 및 구입** • 예산 확인 필요	D-10

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
7	**청소**	☑ **준공청소 확인 및 추가 청소 시행** • 1순위: 교실, 복도, 창문, 관리실 • 2순위: 강당, 특별실, 화장실 ☑ **교내 청소용품 구입 및 청소 구역 배정** 부록 Ⅱ-1-나-③ ☑ **실내 환기와 공기청정기 상시 가동** • 1주일 이상 환기 필요 • 겨울철: 난방기 가동과 환기 동시 실시 ☑ **실내 공기질 검사 및 먹는 물 검사, 개교 전 저수조 청소**	D-10
8	**최종안전 점검**	☑ **실별 및 교내 시설 안전 관련 점검** • 시설 안전 점검 후 수정 요청 – 시공 업체 또는 학교시설과 – 모서리, 계단, 출입구, 체육관 기구 안전 상태 등	D-7

참고사항

- 예산에 따른 업체 수의 계약, 입찰, 조달 물품 구입을 적절히 선택
  ※ 물품 제작 및 구입 시 2,000만 원 이상 입찰 시행
  – 조달 물품(금액 상관없음), 입찰 선정(2,000만 원 이상), 수의 계약 (세금 포함 2,000만 원 이하)
  ※ 각종 시안은 업체 자체 디자인을 활용하여 수정하거나 개교 전담조직에서 원하는 디자인을 구상하여 요구
- 건물 전체 장시간의 환기 필요
- 준공청소 시 창틀 먼지 청소 의뢰
- 실별 준비실 여부에 따른 비품 조정 필요
- 특별실(영어실, 도서실, 시청각실, 미술실, 과학실 등) 학생용 책걸상은 확인 필요

참고

- 충청남도 각급학교 교구 · 설비 기준
- 학교회계 세출예산 집행 지침
- 학교시설 행정업무 매뉴얼
- 교육시설사업 점검단 운영계획
- 교육시설 안전점검 매뉴얼
- 학생이 편리한 학교시설 만들기

다 실외 환경 구축

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**교문 명판 제작 의뢰**	☑ **명판 디자인, 서체, 글자 색 등 결정 제작** ☑ **정문과 후문이 있을 시 디자인 부착 방법 고려**	D-50
2	**어린이 보호구역 지정신청**	☑ **어린이 보호구역 지정 신청서 제출** 부록 Ⅱ-1-다-① • 제출처: 해당 시(군) 도로(건설)교통과 – 해당 시군마다 처리과의 명칭이 다르므로 확인 • 방법: 공문, 주변 약도	D-230
3	**학교 안내 표지판 및 건물번호판 설치**	☑ **신청: 도로 점용허가 신청** 부록 Ⅱ-1-다-② • 관련 법규: 도로법 제61조 제1항, 동법시행령 제54조 제1항 • 제출 서류: 신청서, 설계도면 각 2부 • 해당 시군 민원실 접수: 도로(건설)교통과에서 경찰서와 협의 후 처리 ☑ **도로명 주소 건물번호판 신청** 부록 Ⅱ-1-다-③ • 관련 법규: 도로명주소법 시행령 제11조 제1항 및 시행규칙 제22조 제1항 • 제출 서류: 신청서, 건물 등의 배치도, 건물 인접 도로 현황도 • 해당 시군 민원지적과 접수 ※ 도교육청(지원청) 시설과에서 처리하기도 하므로 확인 필요	
4	**학교이용 안내판 설치**	☑ **급식실 출입구** • 급식실 관련 안내문 • 식재료 운반 차량은 학생의 통로와 분리 ☑ **학교 안전 관리 안내판** • CCTV 설치 안내문 ☑ **주차장 관련** • 주차선, 주차 방지턱, 전기차충전소 확인 • 장애인이나 민원인 주차 구역 표시 및 안내 표지 ☑ **보도블록 상태 및 현수막 게시대 확인** • 보도블록에 점자 표시 확인 ☑ **운동장 진입로** • 평상시는 통제, 학교 행사 시 차량 진입할 수 있도록 설치 ☑ **학교 자연(생태) 학습장** • 자연(생태)학습장 안내 표시판 • 수목 표찰(걸이형, 꽂이형)	D-20

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
5	**외부 시설물 설치**	☑ **학교 놀이 시설** • 학교 놀이 시설 설치 위치 확인 • 놀이 시설 선정 및 구입 • 놀이 시설 및 운동기구 설치시기는 시공사와 반드시 협의 ☑ **배움터 지킴이실** • 배움터 지킴이실 구축 예산 확인(공사비 포함) • 배움터 지킴이실 설치 위치 확인 • 배움터 지킴이실 선정 및 품의 • 시공사와 공사 시기 협의	D-20
6	**최종 안전 점검**	☑ **모든 외부 시설물의 안전 최종 점검** • 구성원에 의한 다수 점검 • 변경 및 보수작업 필요시 해당 시공사 및 도교육청과 협의 ☑ **학교 자연(생태)학습장** • 수생식물이나 연못이 조성되었을 때 특히 시설 안전에 유의	D-10

참고

- 학교회계 세출예산 집행 지침
- 학교시설 행정업무 매뉴얼
- 교육시설사업 점검단 운영계획
- 충남교육청 행정과 신설학교 추진현황
- 교육시설 안전점검 매뉴얼
- 학생이 편리한 학교시설 만들기

라 학교상징 제작

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**학교 교육목표 선정**	☑ **학교 교육과정 기저** • 교육 비전 부록 Ⅱ-1-라-① • 지향점, 추구하는 인간상 • 교육목표, 교훈 • 학생상 등 ☑ **교육과정 각론은 인사발령 교직원과 협의하여 작성** ☑ **교직원 의견수렴 과정을 거쳐 추진**	D-40
2	**상징물 제작**	☑ **교표 제작** 부록 **Ⅱ-1-라-②** • 교육 비전, 교훈 확정 후 업체 선정 • 교표 제작 의뢰 • 시안 수정 및 확정	D-120
		☑ **교목, 교화 확정과 교기 제작** • 학교 교육철학과 의미가 연결되도록 지정 • 지역의 특성, 교육의 지향점을 살려 지정	D-90
3	**교가 제작**	☑ **교가 작사 및 작곡** • 의뢰 또는 공모 – 학교의 특성과 지역의 현황을 잘 파악하고 있는 지역 인사의 교육 기부 적극 활용 – 학교급 학생의 특성에 맞는 가사 내용과 곡으로 구성하여 쉽게 익혀 부를 수 있도록 함	
		☑ **교가 녹음 의뢰** • 업체 의뢰 제작 – 녹음 및 반주(MR) 제작 – 교가 악보 제작	
4	**상징물 설치**	☑ **교표 상징물 설치 위치** • 학교 외벽 교명 좌측 • 강당 상부 중앙 또는 무대막 위 • 강의용 단상 • 방송실 배경 막 • 출입구 유리문 띠 라벨 ☑ **교훈 표지판 설치 위치** • 문주석 및 출입구 • 학교 현황판 등 ☑ **교목과 교화 상징물 설치 위치** • 출입구 현황판 또는 교장실 현황판 등	D-20

마 인력 채용

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**채용 인력**	☑ **교원인사 배치 현황 파악** • 유치원 및 초·중등 기간제 교사 등 • 자격 기준, 공고 등 계약제 인사 매뉴얼 준수 부록 Ⅱ-1-마-① ☑ **스포츠강사: 지원청 선발, 학교장 계약** ☑ **방과후학교 프로그램 강사** • 프로그램 확정 후 방과후학교 프로그램 강사 공고 채용 ☑ **계약직 영양사** ☑ **돌봄교실 프로그램 강사** ☑ **위촉직 계약** • 배움터 지킴이 • 도서관 자원봉사자 • 유치원 놀이 지원 자원봉사자 • 통학버스 안전요원 등	D-40
2	**채용 절차**	☑ **채용 계획 수립 -공고문 포함** • 자격 기준 • 채용 기간 • 서류 및 면접 심사 방안 • 결과 통지 방법 등 ☑ **채용 공고: 교육지원청(도교육청) 및 대한민국 공무원 되기 누리집 공고** ☑ **서류 심사** • 심사계획 미리 확정: 추후 결정 시 민원 발생 • 심사 결과 통지: 개인별 또는 누리집 ☑ **채용 관련 면접 시행 및 합격자 처리** • 기간제 교원: 수업 시연 및 교육 관련 문답식 질의 포함 • 위촉직: 면접 • 채용 확정 기안 ☑ **합격자 통지 및 계약: 계약 시 제출 서류 준수** • 충남교육청 인사 실무 매뉴얼 확인 • 채용 대상자 필수 - 성범죄 및 아동학대 범죄 조회 부록 Ⅱ-1-마-② - 결격사유 조회 - 교육활동 종사자 건강검진(잠복결핵 등) 의무 • 채용 관련 서류-등본, 통장 사본, 자격증, 경력증명서, 졸업증명서, 채용 건강검사서(잠복결색검사결과 포함) 등 ☑ **계약제 교원 임용 제청 보고: 개교 전담조직 업무 담당자** 부록 Ⅱ-1-마-③	D-20
3	**주관 및 유의 사항**	☑ **주관: 개교업무준비위원회** • 채용 관련 면접 계획 수립 • 면접 평가표 및 면접 질문 준비 • 면접 준비 - 면접실 및 대기실 준비 • 대상자에게 면접 일시 및 장소 공지 ☑ **채용 확정** • 합격자 결과 발표: 개별 또는 누리집 ☑ **주의사항** • 객관성과 공정성 확보 • 민주적 합리적인 절차 • 절차와 방법은 공개하되, 결과 보안 유지 • 심사위원의 제척·기피·회피 사항 확인	

참고

- 유·초·중 인사 실무 매뉴얼
- 호봉 획정 및 NEIS 인사 실무 매뉴얼
- 계약제 교원 운영 지침

2. 유치원

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**구축 계획 수립**	☑ **개원업무 추진 계획 수립** 부록 Ⅱ-2-① • 개원업무취급유치원 지정 • 개설사무추진 근무 장소 마련 • 개원업무추진단 구성 및 역할 분담 ☑ **개원 예정 유치원 시설 확인** • 신설유치원 기초자료 수집 – 학급수, 유아 수, 유치원 시설 등 ☑ **최근 개원유치원과의 정보 교류** • 최근 개원유치원과 선진유치원 방문 – 개원업무추진단과 최근 개원유치원 업무 담당 교사와의 만남을 통한 정보 공유 – 최근 개원유치원이나 선진유치원 방문을 통해 각 유치원의 환경 및 운영 특성 반영할 점 파악 **참고 사항** • 개원업무추진단은 개원업무 경험자 및 근무 희망자를 중심으로 구성 • 최근 개원유치원과의 정보 교류	D-170
2	**유아 모집**	☑ **유아 모집 계획 수립** 부록 Ⅱ-2-② • 학급편성 시 학급당 인원은 충청남도교육청 유치원 학급편성 지침에 따름 • 교육지원청 특수유아 선정·배치 명단 확인 • 유아 모집 대상과 인원 결정 – 연령별 유아 모집 인원 결정 – 우선순위 기준 및 지원 대상, 선발 비율 결정 • 유아 모집 방법, 일정, 제출 서류 확인 • 유아 모집 요강 공고문 탑재 및 홍보(현수막 게시, 누리집 탑재 등) ☑ **유아 모집 준비** – 「처음학교로」유치원 등록 – 「처음학교로」모집 요강, 인원 관리 설정 점검 및 수정·보완 ☑ **유아 모집 시행** – 우선 모집 접수 및 추첨: 입학관리시스템 「처음학교로」 – 유치원 방문 현장 접수 가능(위임장 작성 시) – 일반모집 점수 및 추첨: 입학관리시스템 「처음학교로」 ☑ **합격자와 대기자 명단 확인** – 유아 모집 결과 및 합격자 명단 보고 ☑ **대기자 지속적 확인(2월 말까지)** – 추가모집(유치원 자체 계획으로 진행) **참고 사항** • 「처음학교로」로 시스템 일정, 충남교육청 유아 모집 관련 안내 확인	D-160

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
3	**유치원 교육과정 기초 수립**	☑ **유치원 교육과정 기초 작성** • 교육 비전, 원훈, 교육목표 등 설정 • 유치원 특색교육 등 설정 • 충청남도 유치원 교육과정, 유아교육 계획, 주요 업무 계획 적용 • 학사일정 초안 작성 **참고 사항** • 교육과정은 병설 및 단설유치원 규모에 적합한 교육과정 자료 수집 제공 • 교육과정은 초안 작성하여 추후 유치원 구성원이 조직된 후 의견 반영하여 수정 보완	D-120
4	**교재 교구 및 도서 구입**	☑ **교재·교구나 놀잇감 선정 및 구입** • 일반교실, 특수학급, 특별실 등 • 유치원 교구설비 기준에 근거하여 유치원 실정에 맞는 자체 기준 설정 • 교재·교구 구입 계획 수립 • 교재·교구 선정을 위한 선정위원회 개최 및 결과 보고 ☑ **도서 선정(교사용, 유아용, 보호자용) 및 구입** • 놀이 주제별 도서 목록 수집 • 유치원 권장 도서 수집 • 구입 도서 목록 및 권수 선정 **참고 사항** • 충청남도 각급학교 교구설비 기준 참고(충청남도교육청 고시 제2019-1호)	D-120
5	**환경 구성**	☑ **업무환경 구축** • 원장실, 교무실, 보건실, 급식실, 행정실 등 업무환경 조성 ☑ **실내·외 시설 및 환경조성** • 유치원 실내·외 환경조성을 위한 자료 수집 • 환경 구성 주요 내용 선정과 업체 의뢰 추진 • 각 실 환경 구성 – 유치원 중앙 현관 환경 구성 – 교무실 환경 구성 및 시설 설비 구입 – 자료실과 교구장 설계 – 교실 및 복도 환경 구성 – 교실, 화장실 위생 관리 – 강당 시설 설비 환경 구성 • 놀이공간 조성 등 실외 환경 구성 ☑ **실별 소요 물품 선정** • 일반교실, 특수교실, 보건실, 급식실, 방송실, 도서실, 화장실 등 ☑ **새 건물 증후군 대비 공기 정화 등** ☑ **건물 내 청소(용역업체)**	D-100

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
6	**통학 차량**	☑ **통학 차량 기초정보 수집** • 이용 예상 유아 수: 유아 주소도-노선도-노선 확정 • 통학 차량 이용 예상 운행도 작성 (운행구간, 통학 시간, 적정성, 탑승 장소, 안전성 고려)	D-30
7	**신입생 보호자 예비교육**	☑ **신입생 보호자 예비교육 계획 수립** 부록 Ⅱ-2-③ • 등록부, 안내문 발송, 반별 안내판(삼각대, 표지판 등) • 입학 관련 제출 서류 등 보호자 안내 서류 준비 부록 Ⅱ-2-④ • 환경 구성 및 준비물 점검, 방송 기자재 점검 ☑ **학급편성 및 유아 명부 작성** ☑ **유아 입학 관련 문의 담당자 지정** • 입학 문의 대장 작성, 등록포기자 발생 시 대기자 즉시 알림 등 ☑ **문자 알리미 시스템 유아 등록** ☑ **유치원 안내 사항 및 홍보(홈페이지, 유치원앱 등)** **참고 사항** • 보호자 설문은 설문 형식을 이용하거나 유치원 애플리케이션 활용 • 가방, 체육복 등 신학기 용품은 표본을 전시하고 보호자 선호도 조사를 통해 선정	D-20
8	**개원 준비**	☑ **개원 준비** • 유치원 상징: 원표, 원기, 원훈, 원가, 원화, 원목 선정 • 유치원 교육과정 운영계획 수립 • 실내 환경: 실별 표찰, 학급 안내판, 유치원 현황판, 특별실 환경 구성 • 사무 시설, 방송시설, 강당 시설 점검 • 유아 학비 시스템 입력 • 유치원 규칙 및 규정 제정: 인사자문위원회, 보결수업, 교무위원회 • 업무 분장 및 담임 발표 • 예산 편성: 사업별 운영비, 유아학비(교육과정과 방과후과정 예산 분리)	D-20
9	**입학식**	☑ **입학식 계획 수립 및 준비물 구입** 부록 Ⅱ-2-⑤ • 입학 관련 보호자 사전 안내 시행 • 당일 업무분장에 따른 업무 추진 • 입학 관련 물품 구입, 환경 구성 준비 ☑ **유아 학급 배정 및 교사 소개** ☑ **유아 개인물품 준비(가방, 체육복 등)** ☑ **유아 이름표 작성(신발장, 사물함, 목걸이 이름표 등)** **참고 사항** • 유치원 상징은 교직원의 의견수렴, 원가는 전문가 협조 의뢰(음원, 악보) • 입학식 이후 교육과정 정상화를 위해 담당 업무별 추진 일정 계획	D-20

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**개교 전담조직 협의회**	☑ **전담조직 역할 분담 및 협의회 일정 논의** • 개교 준비 업무 파악 및 역할 분담 • 역할별 추진 업무 파악 • 추후 협의회 시기 및 장소 협의 • 자료를 공유할 수 있는 온라인 협의방(인터넷 카페, 밴드 등) 개설 **참고 사항** • 정기적인 모임을 통해 개교 준비 상황 파악 • 11월 하순부터 접수되는 다음 학년도 각종 교육(문화예술강사, 각종 외부 강사 방문 교육, 스포츠강사 신청, 수영 체험학습, 자유학기제 진로체험프로그램 등) 신청 공문 확인 • 현장체험학습, 수련회, 수학여행 관련 숙박 및 버스 구두 계약 (어린이통학버스 요건 충족 확인)	D-30
2	**교과서 신청**	☑ **교과서 선정 및 신청** • 인근학교 검정, 인정도서 조사 – 교육과정 연계를 위해 인근 학교 검정, 인정도서 중심으로 선정 • 검정도서, 인정도서 선정 협의 후 협의록 작성 – 학교운영위원회 심의는 개교 이후 심의 • 최종 확정된 교과서는 학생 수 고려하여 담당자가 공문 발송(12월 이전 해당 교육지원청과 상의) – 학급 수 고려하여 교사용 교과서와 지도서 신청 **참고 사항** ☑ **초등** • 국정교과서는 한 학급 분량 여유분 신청 – 1학년: 예상 학생 수보다 여유 있게 신청, 입학초기 적응활동 교재 배부 수 확인(교육지원청 및 교육과정평가정보원 의뢰) – 3, 4학년: 사회과 지역화 보완교재는 교육지원청에 보유 수 확인 • 1학년: 모든 교과서 신청 • 2~6학년: 국정교과서는 전출 학교에서 배부하므로 주문할 필요는 없으나 해외 전입자 및 타 시도 전입 학생을 고려하여 한 학급 분량 여유분 주문 • 3, 4학년 지역 교과서는 타시군, 타 시도 전입 학생 수 고려하여 교육지원청에 주문	D-20
3	**이전(기) 개교학교 방문**	☑ **이전(기) 개교학교와의 정보 교류** 부록 Ⅱ-3-① • 이전(기) 개교학교 방문 – 전담조직과 이전 개교 업무 담당 교사와의 만남을 통해 정보 교류 – 학교 둘러보며 반영할 점 파악 ☑ **보호자 및 지역사회와의 의견수렴**	D-20

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
4	**각 실 비품 구입 목록 작성**	☑ **교육지원청 각 실 비품 구입 목록 확인** • 관리실과 교실, 특별실 등 사무용 가구 및 가전제품 구입 목록 확인 후 수정 및 보완사항 작성 제출 • 관리실과 일반교실, 특별실 비품 배치계획 수립 **참고 사항** • 일반 교실 내 비품 위치 정하기 (교사용 책상, 사물함, 청소함, 책꽂이, 거울, 시계 등)	D-180
5	**신설학교 공사 현장 방문**	☑ **학교 공사 현장 방문** • 건축설계도 점검 및 확인, 구조 확인 – 특수학급, 보건실 등 특별교실 위치 확인 • 위험 요소 및 보완사항 점검 • 점검 후 협의록 작성, 교육지원청 담당과에 공문 발송 • 통학로, 버스 진입로, 어린이 승하차장의 안전 확보 • 안전 휀스, 신호등 등 안전시설 확인 • 음식쓰레기 보관함, 게시대 설치 및 쓰레기 처리장 위치 확인 **참고 사항** • 학교 공사 현장 방문 시기는 개교 전담조직 구성 후 빠른 시일 내로 하며 내부 공사 시행 전 방문해야 시설 보완사항 요구할 수 있음	D-180
6	**신입생 예비 소집**	☑ **신입생 예비소집 자료 제작** • 신설학교 및 입학 관련 안내 • 반 편성 공지 일정 및 입학식 안내 • 돌봄교실 신청 일정 안내 • 취학 대상 학생 수보다 여유 있게 자료 인쇄 ☑ **신입생 예비 소집** • 예비소집 등 업무처리를 위한 인근 학교와 협력 체제 구축 • 취학통지서 및 취학학교 변경신청서 접수 • 취학 대상 학생 명단 작성 • 취학학교 변경 신청자 명단 작성 후, 기 배정받은 학교에 통보 공문 발송 **참고 사항** • 입주 예정으로 인한 취학학교 변경 신청 시 입주계약서 사본 및 입주 확인 각서 작성하여 위장전입생 방지 • 예비 소집 응시 학생 수와 교과서 주문 수 비교하여 부족 시 추가 주문 **[초등]** 1학년은 돌봄교실 신청자 수가 많으며 예민한 사항이므로 예비 소집 시 돌봄교실 신청 안내 사항 강조	D-65

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
7	**교재 교구와 도서 구입**	☑ **일반 교실 및 특별실 교재·교구 선정** • 일반 교실 교재교구 선정 • 특별실 구성 확인 및 교재·교구 선정 ☑ **도서실 도서 선정** • 학년별 필독 도서 목록 반영 – 학년별 온 책 읽기 도서 및 교육과정 반영 도서 • 주변 학교의 최근 3년 이내 구입 도서 및 대출 인기도서 목록 반영 • 개교 준비 예산 내에서 1차 도서 구입 목록 선정 및 협의록 작성 **참고 사항** • 도서관 예산 확보방안 및 도서 기증 방법 추후 협의	D-60
8	**정보화기기 구입**	☑ **정보화기기 선정** • 관리실, 일반교실, 컴퓨터실, 특별교실 정보화기기 선정 – 사양 및 구매 대수, 비품 구매목록 선정 및 협의록 작성 • 특별실 구성 확인 및 교재 교구 선정	D-150
9	**학교 교육과정 기초 수립**	☑ **학교 교육과정 기초 작성** • 교육 비전, 학교장 경영 의지, 교육목표 등 설정 • 교육과정 브랜드 및 특색교육 설정 • 충청남도 교육과정 편성·운영 지침을 반영한 교육목표 구현계획 수립 • 학사일정 초안 작성 **참고 사항** • 학교 교육과정 초안을 작성하되, 추후 교육공동체가 조직된 후 의견을 반영하여 수정 보완	D-30
10	**학교상징 제작**	☑ **교표·교기 제작** • 학교 실정에 맞게 교육공동체의 의견수렴 ☑ **교훈, 교화, 교목 선정** • 학교의 교육목표, 지역적 특성 반영하여 선정 ☑ **학교명 글자체 선정** • 실내외 디자인(외벽, 교문, 현수막, 출입문 등)에 사용되는 학교명 글자체 선정 **참고 사항** • 교훈, 교화, 교목은 개교 전담조직에서 안을 작성하여 개교 후 학생, 보호자, 교직원의 의견을 수렴하여 개교식 전까지 결정 • 학교명에 적용되는 글자체는 저작권 준수	D-120 D-90

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
11	**실내·외 환경 구성**	☑ **실내 환경 구성** • 특별실과 공동의 공간 명칭 선정 – 도서실, 학생 쉼터 및 놀이공간 명칭 선정 • 표찰 도안 선정 – 관리실, 일반교실, 특별실 표찰 도안 선정 • 커튼 선정 – 일반교실, 특별교실, 관리실 등 커튼 설치장소 결정 – 장소별 특성을 고려하여 일반커튼, 버티컬, 로만셰이드, 방염 커튼 등으로 설치 ☑ **실외 환경 구성** • 교명판 선정, 놀이공간 조성 등 실외 환경 구성	D-100
12	**전입생 서류 접수 안내 및 준비**	☑ **전입생 서류 접수 안내** 부록 Ⅱ-3-② 부록 Ⅱ-3-② • 교육지원청 홈페이지 공지, 관내 학교 협조 공문 발송(전입 예정 학생 안내), 입주 예정 아파트 관리사무소 협조 요청(안내방송, 엘리베이터 안내문 공지, 입주자 카페 또는 누리집 공지) ☑ **사전 준비** • 아파트별 접수 관련 당일 업무 역할 분담 • 전입 신청서, 개인정보 활용 동의서, 안내장 인쇄 • 접수처 안내 표시 부착 • 노트북, 복사기, 집게, 필기도구, 스테플러 등 접수 관련 물품 구비	D-180
13	**전입생 서류 접수**	☑ **전입생 서류 접수** 부록 Ⅱ-3-③, 부록 Ⅱ-3-④ 부록 Ⅱ-3-③, 부록 Ⅱ-3-④ • 이사 완료 학생 처리 절차 – 전입 신고증 또는 입주 후 발행된 주민등록등본 제출 ▶ 전입 신청서, 개인정보 활용 동의서 작성 ▶ 안내장 배부 • 이사 예정 학생 처리 절차 – 입주계약서 사본, 가족관계 증명서류 제출(전입 신고증 제출 후 입주계약서, 가족관계 증명서류는 반환) ▶ 전입 신청서, 개인정보 활용 동의서 작성 후 제출 ▶ 안내장 수령 및 안내받기 • 해외 전입 학생 처리 절차: 인정 유학, 미인정 유학 구분 후 학적 관리 매뉴얼에 의거 처리	D-65
		참고 사항 • 전입생 서류 접수 시 교과서 배부 및 반 배정 공지 계획 강조하여 안내 • 이사 예정 학생의 경우 입주 확인 각서를 작성하게 하여 위장전입생 방지 • 동사무소 방문 전입신고 시 전입 신고증이 발급되지만, 온라인으로 신청 시 발급되지 않으므로 구분하여 안내	

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
14	**돌봄교실 입실 학생 선정 [초등]**	☑ **돌봄교실 신청 접수** • 돌봄교실 입실 조건 관련 서류 제출 ▶ 돌봄교실 신청서 작성 후 제출 ▶ 접수번호증 발급(서류 제출 확인을 위함) ▶ 추후 일정 안내 ☑ **돌봄교실 입실 학생 선정** • 추천순으로 돌봄교실 입실 학생 선정 • 신청자 초과 시 추첨	D-20
15	**각종 교재 교구 검수**	☑ **정보기기, 교구, 비품 검수** • 정보기기와 교구 검수 – 일반교실, 특별교실, 학년(부서) 연구실, 돌봄교실 등 • 비품 검수 – 교사·학생 책걸상, 사물함, 청소용 물품 등	D-10
		참고 사항 • 개교와 동시에 수업에 필요한 기본 교구 확인하기	

참고

- 학적관리 매뉴얼
- 충남 초등돌봄교실 운영 기본 계획

4. 특수학교

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**개교 업무 추진 계획 수립 및 전담조직 구성, 운영**	☑ **개교 업무 추진 계획 수립 및 전담조직 위촉** 부록 Ⅱ-4-① • 개교 업무 추진 계획 수립 • 개교 전담조직 구성 및 역할 분담 – 학교급별(유·초·중·고·전) 교사 구성 – 자료 수집, 선진학교 정보 공유 – 교육과정 편성·운영, 기자재 구입 업무, 학생통학 지원 등 ☑ **개교 전담조직 협의회 실시** 부록 Ⅱ-4-② • 도교육청에 협의 결과 보고	D-270
2	**선진학교 방문**	☑ **선진학교 방문** 부록 Ⅱ-4-③ • 최근 신설 특수학교 현황 파악 – 국립특수교육원 홈페이지 참고 • 선진학교 방문 계획 수립 및 보고서 작성 • 교육과정 정보공유 • 방문 보고서 작성(전담조직 생각 나눔 자리에 자료로 활용) **참고 사항** • 여러 지역의 다양한 학교 방문하여 각 학교의 특색 정보공유 • 과정별로 담당자가 참석할 수 있도록 일정 조정	D-260
3	**공사 현장 방문**	☑ **공사 현장 방문** • 건축설계도 점검 • 위험 요소 및 보완사항 점검 후 교육지원청에 공문 발송 **참고 사항** • 내부 공사 진행 전 특별식 특성에 따른 시스템 점검 – 가사실, 세탁실, 직업교육실 등은 전기, 배수, 급수 시스템 위치가 중요(공사 기간이 지나면 변경 불가)	D-250
4	**학교 교육과정 기초 수립 및 환경 조성 자료 수집**	☑ **학교 교육과정 기초 수립** • 충청남도 특수교육 교육과정 편성·운영 지침 참고 • 유·초·중·고·전공과 각 과정 교육과정 운영계획 수립 ☑ **실내 시설 및 환경조성 자료 수집** • 특별실 및 실내 환경조성을 위한 자료 수집 • 환경 구성 및 설비 구축 • 교육과정에 따른 실별 특성 파악 **참고 사항** • 교육과정 운영계획 수립 후 실별 목적 명확히 확정 • 각 지역 특수학교의 교육과정 자료 수집 제공	D-240

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
5	**특수교육대상자 선정 배치 및 재배치 학생 확인**	☑ **충청남도교육청, 해당 지역 특수교육지원센터 선정 배치 공문 확인** • 유·초·중: 지역교육청 특수교육지원센터 공문 확인 • 고등·전공과: 도교육청 공문 확인 • 해당 지역 학생이 누락 없이 배치되었는지 확인 • 타지역 전학 희망 학생은 특수교육지원센터에서 재배치 가능 여부 확인 • 학생 명단은 날짜별로 확인	D-140
6	**학생 특성 파악**	☑ **학생 실태 파악** 부록 Ⅱ-4-④ • 진단평가 자료, 현 소속교 등을 통해 파악 • 특수교육 관련 서비스 지원을 위한 파악(보조공학기기, 지원인력, 치료지원, 통학 편의 지원) • 교육과정 수립, 지원인력 및 특장차 요구, 학급편성 기초자료로 활용 **참고 사항** • 치료지원 예산 신청(언어치료, 바우처 이용 영역과 기관 파악)	
7	**교과서 신청**	☑ **학생 교과서 및 교사용 지도서 신청** • 학생 수 변동 경우 반품 또는 추가 신청 **참고 사항** • 교과서 신청 누락되지 않도록 유의 • 시각장애학생 확대교과서 상반기 사전 신청	D-140
8	**전공과 입학전형 추진**	☑ **전공과 입학전형 계획 수립** • 전공과 입학전형 위원회 구성(교사, 지역사회, 보호자 위원 등 전문가) • 도교육청 특수교육대상자 선정 공문 참고 부록 Ⅱ-4-⑤ ☑ **전공과 입학전형 계획 수립 및 입학전형 실시** ☑ **전공과 최종합격자 명단 도교육청으로 발송**	D-120
9	**통학 편의 지원**	☑ **통학 차량 노선 수립** • 특장차(관용차) 구입 및 지원 여부 파악 • 관용차 구입 및 임차 결정(조달 구입, 물품선정위원회) • 지역별 통학 노선표 작성 • 통학노선 임시 운행 점검 시행 부록 Ⅱ-4-⑥ • 보호자 의견수렴과 충분한 안내로 민원 발생 예방 • 통학 편의 지원 대상자 보호자에게 안내	D-90

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
10	**교재교구와 도서구입**	☑ **일반 교실 및 특별실 교재·교구 선정** • 수준별 교수학습 자료 • 중도중복장애학생 교육 자료	D-270
11	**실내외 환경 구성**	☑ **실내 환경 구성** • 특별실 및 공간별 명칭 선정 – 도서실, 학생 쉼터 및 놀이공간 명 선정 ☑ **실외 환경 구성** • 교명판 선정, 놀이공간 조성 등 실외 환경 구성	D-260
12	**인력 요구 및 기타 사항**	☑ **교육공무직 인력배치 요구** 부록 Ⅱ-4-⑦ • 지원인력, 통학안전요원, 방과 후 돌봄강사, 급식실 조리원, 교무행정사, 청소 용역원 등 ☑ **기타 인력배치 요구** • 배움터지킴이, 당직요원 ☑ **스포츠강사 신청** • 초등이 설치된 특수학교의 경우 스포츠강사 신청 ☑ **방과후학교 예산 편성 보고 및 강사 선발** • 방과후학교 강좌 및 신청 수요 조사 • 개설 강좌 강사 공고 및 선발 ☑ **기자재 선정** 부록 Ⅱ-4-⑧, 부록 Ⅱ-4-⑨ • 물품선정위원회(기자재 선정) 협의 • 교사 컴퓨터나 노트북 등 ☑ **학생 관련 물품 관리전환 신청** 부록 Ⅱ-4-⑩ • 학생이 기존에 사용하고 있던 맞춤형 보조공학기기(휠체어, 보조 시트, 침대 등) 사전 파악 **참고 사항** • 스포츠강사 신청, 방과후학교 예산 등 사전 확인 • 스포츠강사, 체육전담교사 중복신청 여부 파악	D-180 D-60 D-30 D-10
13	**사전 학교 설명회 실시**	☑ **공문 및 가정통신문 발송** 부록 Ⅱ-4-⑪ • 교육지원청 특수교육지원센터에 일정 안내 • 참석 대상(보호자, 학생, 교육지원청 장학사 등) ☑ **학교설명회 실시** 부록 Ⅱ-4-⑫ • 학교교육과정 및 통학노선 안내 • 필요시 입학생(초등학교) 설명회 따로 실시 **참고 사항** • 사전 학교설명회는 통학노선, 교육과정 등 문의 많음	D-40

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
14	**정보화기기 구입**	☑ **정보화기기 선정** • 관리실, 일반교실, 컴퓨터실, 특별교실 정보화기기 선정 – 사양 및 구매 대수, 비품 구매목록 선정 및 협의록 작성 • 특별실 구성 확인 및 교재 교구 선정	D-40
15	**개교 준비**	☑ **개교 준비** • 학교 규칙 및 규정(안) 제정: 인사자문위원회, 결·보강 계획 수립, 기타위원회 조직 • 예산 편성: 사업별 운영비, 부서별, 과정별 예산 편성 ☑ **교재·교구 구입(교구설비기준 참고)** • 교수·학습 자료, 시청각기자재, 학습준비물 구입 ☑ **입학 준비** • 학급편성: 반 편성, 담임 발표 부록 Ⅱ-4-⑬ • 학부모 안내: 학사일정, 교육과정 운영시간 및 내용, 준비물, 등·하원시간, 학교 운영방침, 방과후 특성화 활동 • 교실 환경 구성: 교구 및 학습자료 준비, 교과서 배부 • 기타: 학생 이름표, 반 표시 **참고 사항** • 입학식 이후 교육과정 정상화를 위해 담당 업무별 추진 일정 계획 • 학습준비물의 경우 한 달 정도 사용할 수 있는 수량으로 충분히 구입 • 나이스 학적 반영 및 개별화 교육계획 등 개교 후 확인 필요	D-10

5. 이전 개교학교

가 업무 추진 개요

업무 추진 순	주요 내용
기초자료 수집	☑ 이전 개교학교 기초자료 수집
▼	
전 직원 신축교 사전 답사	☑ 각 담당 실별 확인 실측 ☑ 물품과 비품 배치 구상 ☑ 이전 배치도 구상
▼	
이전 개교 전담조직 구성	☑ 교감, 행정실장, 부장을 중심으로 7~8인 구성
▼	
이전 개교 추진 계획 수립	☑ 현 물품 활용 계획, 신규 구입 계획, 신축교 실별 구축 계획, 이사계획 ☑ 소모품 구매비용, 교재교구 구입비, 이사경비, 개교식 예산
▼	
이전 신축학교 실별 구성계획 수립	☑ 실별 물품 배치도 구상 ☑ 기존의 물품과 구입할 물품 목록 작성
▼	
기존 각 교실 물품 정리	☑ 활용할 물품과 폐기할 물품 목록 작성 ☑ 신설학교에서의 물품 재배치 계획 포함
▼	
이전 신축교 실별 물품 및 환경 구축	☑ 신축교 물품과 비품 구입 및 배치 ☑ 커튼, 선팅, 잠금장치 등
▼	
이사 업체 선정	☑ 입찰 및 수의 계약
▼	
이사	☑ 이사 진행 방법 협의 후 진행
▼	
각 교실 물품 및 환경 정리	☑ 담당 실별 이사물품 확인 배치
▼	
비품 배치	☑ 각 교실 및 특별실 비품 납품 및 검수 및 배치 완료
▼	
개교 준비 물품 점검	☑ 개교에 필요한 부서별 교과별 물품 점검 및 보완사항 추진

나 일정별 세부 추진 사항

일 자		세부 추진 내용	완료 여부 (○/×)	담당
~ 공사완료 전	1	학교 공사 현장 수시 방문 및 상황 점검, 안전을 고려한 건축		
	2	이전 경비 교부 시 성립전 예산 수립		
	3	공사 진행 중 이전 진행(기념비, 나무, 놀이시설, 운동기구, 배움터지킴이실 등)		
	4	전 직원 이전 신축교 현장 방문 후 실별 구축 계획 구상		
D-60	1	이전 개교 준비 위원단(전담조직) 구성 및 사전 협의회		
	2	이전 개교 세부 추진 계획 수립		
	3	실별 구축 계획 수립		
	4	제1차 학교 이전 물품 전수(재물) 조사(물품, 장비, 기록물 등)		
D-50	1	신축교 실별 집기 및 물품선정위원회 개최		
	2	제2차 학교 이전 물품 전수(재물)조사(물품, 장비, 기록물 등)		
	3	교실 공통 비품과 학생용 책·걸상 구입 품의		
	4	특별실 물품과 비품 구입 목록 작성 구입 품의		
	5	어린이보호구역 지정 변경 신청		
	6	이정표 설치를 위한 도로 점용 허가신청		
	7	이사물품과 폐기물품 결정		
	8	교재교구 선정(수학, 음악, 미술, 체육, 실과, 기타)		
	9	유치원 놀이 시설 및 기구 이전 및 구입 계획 수립		
D-40	1	실별 명칭 확정(강당 명칭 등)		
	2	학교 배치도 작성		
	3	이사계획 수립		
	4	신입생 예비소집 안내자료 제작· 이전 학교 안내		
	5	실별 물품 배치 시작		
	6	물품 재물조사 완료 및 물품 재배치 계획 수립		
D-30	1	이사 업체 선정		
	2	신설학교 안전시설 관리 가동(시건, 화재, 통신, 전기 등)		행정실
	3	불필요 물품 타 학교 관리 이전 및 불용 처리 시행		
	4	이사 당일 담당자별 역할 사전 협의		전직원
	5	실별 이름표, 안내 표지, 커튼, 블라인드 등 설치		행정실
이사일 (2월 또는 8월)	1	물품 반출 및 반입 책임자 지정 관리		
	2	실별 담당자(물품 배치계획에 의거 배치)		
이사 후	1	실별 정리 정돈		전직원
	2	구 학교 불용물품 폐기(매각) 처리 지원		행정실

다 전담조직 업무 추진

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
1	**전담조직 구성 및 계획 수립**	☑ **신축교 사전 방문하여 각 실 배치 확인** • 설계상의 각 실의 용도에 따라 사용할 수 있는 것인지 확인 – 교사협의회실: 학생 관리에 가장 쉬운 곳에 위치 여부 등 – 돌봄교실: 가용인원, 면적 고려 등 – 특별실: 미술실, 과학실, 특수교실, 위클래스, 컴퓨터실, 음악실, 가사실 등 급수, 배수구, 전기배선 위치 확인 *일정 공사 기간이 지나면 변경 불가이므로 신속 파악 ☑ **실별 물품과 수납장 배치 구상** • 기존의 물품 및 수납장과 새로 구매해야 할 물품과의 재배치 구상 • 이사 후 기존 물품의 재배치 확정 등	D-60
		☑ **자료 수집** • 이전 학교의 가구 수납장 등의 이사 배치 가능 여부: 크기 확인 • 기자재(비품)의 재물조사 시행 후 물품 분류 정리 • 물품 및 교재교구의 재배치 구상	D-55
		☑ **전담조직 구성: 교감, 행정실장, 업무별 대표자 7~8명으로 구성** ☑ **계획에 포함할 사항** • 구 교실 재물조사 • 물품 구분 정리: 관리전환 물품, 이전 물품, 불용 물품 부록 Ⅱ-5-다-① • 이전물품과 새로 구입할 물품 목록 작성 및 품의 • 이전학교 교실 배치 및 평면 환경 구성계획 • 이사 일정 및 준비: 행정실 주관으로 실시하되 전직원 협조 필요 • 신축교 현관, 유리창, 평면 환경 구성계획 • 교재교구 물품 구입 계획 (조달등록제품을 우선으로 선정하되, 이외 제품은 입찰 또는 수의계약 추진)	D-50
2	**마감재 선정 관리** 공사부서협의	☑ **교실 외벽을 비롯한 건축물 마감재 선정** • 친환경적 마감재와 안전을 고려한 디자인으로 선정 ☑ **마감 시설 부착물에 대한 위치 선정** • 학생의 눈높이, 상징성 등을 고려하여 적절한 위치 선정 ☑ **각종 페인트 색상 선정** • 학교급별 학생의 특성과 건물의 쓰임새에 따라 선정	수시
		참고 사항 • 관리자 또는 전담조직에서 수시로 신축교를 방문하여 담당자와 협의 • 화장실 문 선정: 여자 화장실과 남자 화장실의 색깔 고려 • 페인트 색깔 선정: 저학년과 고학년	

순	추진업무명	세부 추진 내용	시기
3	**개교 전 중요 시설물 이전 설치 및 배치**	☑ **공사 공정 중에 이전 설치할 물품에 대한 사전 계획 수립 및 이전** • 교화 교목과 주요 수목 – 나무는 정원의 바닥 정리 작업 전에 미리 옮겨 심어야 하므로 공정 시기에 맞춰 옮김 – 금전적 가치가 있거나 재산으로 등록된 수목 등 보전 가치가 있는 중요 수목은 공사 공정에 맞춰 미리 이전 식재 • 교문, 교훈 탑, 기념비 등 무게가 있는 시설 건축물 – 학교시설이 완공된 후 이전 하면 조성된 환경 훼손 우려 발생 – 현장 감독과의 협조로 공정 시기에 맞춰 이전 설치할 때 비용 절감 ☑ **운동장 운동기구 및 유치원 놀이기구 이전 물품 선정 및 시기 수립** • 운동기구 중 이전 사용이 가능하거나 비용 절감 효과가 있는 기구 선정 • 공정 시기에 맞춰 이전하여야 추후 설치 비용 발생하지 않음	필요시
		참고 사항 • 유치원 및 운동장 놀이기구: 유원장, 운동장 바닥공사 전에 이전 배치 • 기타 주요 기념비: 이전 설치장소 공사 완료 전에 미리 이전 설치	
4	**이전학교 교육 환경 조성**	☑ **이사물품 재배치를 위한 노력** • 이사용품의 규격이 새 건물과 맞지 않으므로 재배치 구상 필요 ☑ **실내 환경조성** • 실별 확인 및 명칭 표시 부착 • 실별 비품 선정 및 구입 및 검수 배치 • 현관문과 창문 작업 • 학교 안내 배치도 • 청소 및 최종 안전 점검(소화기 등) ☑ **실외 환경조성** • 교문 명판 제작 및 외부 시설물 설치 • 어린이 보호구역 지정신청 및 각종 안내판 구안 설치	D-40
5	**안전 마감 관리**	☑ **학생 안전을 위한 마감처리 확인** • 각종 문의 학생 출입 안전 관리 • 각 실의 창문 및 통로별 이동 안전 관리 • 학생의 안전한 통행과 합리적이고 분산적인 학생 동선 고려 ☑ **합동 안전 점검 시행** 부록 Ⅱ-5-다-② • 다양한 시각에서 안전 점검이 이뤄져야만 안전사고 발생률 최소화 – 마감재, 손잡이, 학생의 동선 관리 등 확인 – 각 창문의 안전장치 및 시설 확인 • 계단 등의 마감재 안전 관리	D-50
6	**이 사**	☑ **별도 계획 참조** 부록 Ⅱ-5-다-③	D
7	**정 리**	☑ **실별 담당자 지정 정리**	D+1

Ⅲ

실별 구축 안내

1. 공통 | 59
2. 유치원 | 73
3. 초등학교 | 78
4. 중 · 고등학교 | 79
5. 특수학교 | 82

5. 특수학교 | 82

Ⅲ

실별 구축 안내

충청남도 신설학교 교무학사
개교 업무편람

가 일반교실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **학년, 반 배치 결정** • 층에 따라 저학년과 고학년의 순차적 배치 • 화장실 등 부대시설과의 접근성 고려 • 출입구 분산 배치 및 각종 특별실과의 학년별 적절한 동선 관리 배치 ☑ **전담조직 위원 협의 결과에 따라 공통 비품 위주로 구입**	D-50
	☑ **표찰 구안 및 부착** • 학년별 반 이름 결정 • 학교급의 특성에 맞는 학년 학급 표찰 디자인 구상 결정 • BF인증제도를 고려한 위치 선정과 부착	D-40
	☑ **공통 비품 구입 목록 작성** • 전면: 인터렉티브화이트보드(전자칠판), 중앙TV 삽입형 칠판, 태극기, 교탁, 교사용 책걸상, 컴퓨터 등 • 후면: 환경판, 게시판, 사물함, 청소도구함 • 측면: 기자재 및 자료 보관함, 거울, 벽시계, 창 블라인드 • 기타: 냉난방 시설, 신발장, 쓰레기통, 분리수거함, 도서장, 우산꽂이	D-30
	☑ **검수 후 비품 배치** • 학년 및 학생의 특성에 맞는 배치 • 교사용 컴퓨터 및 전자칠판 연결(벽면 콘센트 및 바닥 콘솔박스 확인)	D-20

참고 사항

- 학생용 책걸상은 교육지원청에서 주로 구매하기는 하나, 수업 형태에 따라 책걸상 배치 변형이 쉬운 재질로 선택할 수 있도록 사전의견 제시
- 초등 저학년의 경우 무겁지 않은 것으로 선택
- 시건 장치는 화재 등 안전사고를 고려하여 자세히 검토 후 설치
- 전자칠판(인터랙티브 화이트보드) 및 칠판 보조장 설치
- 전자칠판과 보조장 설치 시 가장 뒷자리 학생들의 칠판 시야 확보와 지도교사 판서 편의를 고려하여 설치 높이 협의 필요

참고

- 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

나 교장실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **구입 기본 비품 선정** 부록 Ⅱ-1-가-① • 필수: 업무용 책상과 의자 세트, 책장, 옷장, 소파(교직원 규모와 교장실의 크기와 맞도록 선정), 태극기, 국정지표, 충남교육비전, 진열장, 이동식 서랍장, 냉장고, 교원용 PC, 프린터, 시계, 소화기 등 • 선택: 운영위원회 인원에 맞는 회의용 탁자 및 의자겸용 • 기타 비품: 탕비실 물품 준비(전기주전자, 다기 세트 등) • 운영위원회 회의실과 겸용 사용 여부 확인	D-180
	☑ **평면 환경 구성** • 학교장 발령 시점 고려: 부임 교장 의견을 반영하여 구성 • 구성 방향 및 방안: 학교의 철학과 학교장의 경영의지가 담기도록 구상 – 현황판: 학생과 교직원 현황, 교지 및 시설현황 등 – 학교연혁: 선택사항 – 학교교육과정이 함축되어 나타나도록 구상	D-30
	☑ **검수 후 비품 배치 및 환경 구성** • 가구 배치에 관해 부임 예정 교장과 충분히 협의 • TV 설치 위치 확인(벽걸이형, 스탠드형) • 태극기 및 교육지표 위치 • 월중 행사판(스탠드형, 부착형) • 수납장과 칸막이, 싱크대, 세면대 등	D-10

참고 사항
- 결재량을 고려한 사양의 컴퓨터 배치
- 최근 교장실 구성 동향: 복잡하고 많은 게시물 지양, 간결하면서도 함축적인 교육 특색과 의지가 담기도록 구성, 변동이 있는 자료를 수시로 교체할 수 있는 현황판 구축
- 별도의 시건이 가능한 도어락 설치 추천

다 교무실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **활용 방안 및 가구 배치도 구상** • 회의용 공간: 회의를 위한 공간과 1~2인의 업무용 테이블(교감 좌석)과 조화로운 배치 구상 • 업무용 공간: 11자 형, ㄷ형, T형, 원형 등 가구 배치 • 회의와 업무 겸용 공간: 업무용 공간과 회의용 공간의 자연스럽고 조화로운 배치	D-180
	☑ **비품 구입 필수 목록 작성 및 구입** 부록 Ⅲ-1-나-① • 필수: 책상, 의자, 책장, 옷장, 진열장, 이동식 서랍장, 붙박이 수납장, 음수기, 제빙기, 공기청정기, 냉장고, 교원용 PC, 프린터(복합기), 문서 세단기 • 선택: (교무)회의용 탁자와 의자, OA 칸막이 • 기타: 교직원용 다과 공간 비품(싱크대 등)	D-150
	☑ **평면 환경 구성 디자인 구안** • 월 행사일정표 • 학교 현황판 디자인 구상	D-20
	☑ **환경 구성** • CCTV 모니터 설치 위치(벽면) 확인(행정실 협의) • 검수 후 비품과 가구 전자제품 배치 • 교무실 방송시설 위치 – 방송시설 사용 방법 부착 • 학교 현황판, 시정표, 학교 행사판 등 위치 확인 및 부착 • 탕비실과 겸할 시 구역 공간 재구조화 • 교무실 상주 업무 인원 확인하여 배치 – 업무전담팀 구성 시: 컴퓨터 수 추가	D-10

참고 사항
- 기존의 교무실 구성 개념에서 탈피하여, 용도에 대한 정확한 결정 우선
- 개교 업무 추진을 위해 타 교실보다 우선 구축
- 보안을 위해 도어락 등 별도 시건 장치 설치

라 교사연구실(교사 휴게실)

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **활용 방안에 대한 논의** • 교수·학습 자료 제작이 가능한 연구실 • 회의 용도의 연구실 • 휴식 공간과 겸하는 연구실 등 ☑ **활용 방안에 따른 가구 배치 구상** • 연구용 공간: 교과서 등 교수·학습 연구자료 배치 공간과 업무용 책상으로 배치하며 학년 단위 또는 전체교사용 공간 여부에 따라 가구 배치 달라짐 • 연구와 자료 제작 겸용 공간: 연구 활동을 위한 자료 및 교구 제작을 위한 제작대와 제작 기자재 필요 • 연구와 휴식 겸용 공간: 연구와 휴식 공간의 조화로운 공간 구성 방안	D-180
	☑ **활용 방안 결정에 따른 비품 목록 선정** • 필수: 회의용 테이블, 붙박이 수납장, 의자, 개인용 PC, 파쇄기 • 선택: 책장, 자료장, 칠판, 냉장고, 소파, 전기주전자 등	D-150
	☑ **검수 후 비품 배치 환경 구성** • 기본 가구 배치 – 테이블을 중심으로 의자 배치 – 개인용 PC 사용 업무 환경조성 – 벽면에 캐비닛 설치 • 회의용 칠판 또는 이동식 칠판 – 의견을 교환할 수 있는 테이블 – 회의 결과를 공유할 수 있는 컴퓨터 복사기 등 – 공지 사항을 알릴 수 있는 공간 • 연구실(자료제작실) 겸 환경 구성 – 대형 작업대 및 작업용 기구 – 컴퓨터, 복사기, 프린터기 등 – 기본적 제작 기구	D-10

참고 사항
- 교무실과의 활용 방안이 중복되지 않도록 유의
- 각 교실과의 근접성 고려
- 다양한 용도로의 활용이 가능하도록 구상
- 상시전원 콘센트 유무 및 상시전원이 필요한 위치에 있는지 확인

마 과학실험실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **과학실 및 준비실 확인 : 비상 샤워기 배수, 시약장 환기시설 등** ☑ **비품 선정 및 구입** • 교사용 책걸상, 실험실 모둠 책상, 걸상 • 실험장, 시약장, 비상샤워기, 청소도구함, 폐시약장, 릴콘센트 • 배수관, 전원장치, 환기장치, 세면대	D-180
	☑ **과학교구 선정** • 학교급별 학년별 주제별 목록 선정	
	☑ **과학실험실 부족 시 특별실 확보 요청** 부록 Ⅲ-1-마-① • 학급 상황에 따른 특별실 조정 필요	
	☑ **과학실험실 안전 관련 게시물** • 실험실 안전 수칙, 안전사고 대처요령 • 안전사고 시 비상 연락망	D-20
	☑ **과학실험실 각종 장부 제작** • 안전 점검표, 일일 화재 예방 점검표 • 과학실험실 사용 일지 • 폐수 관리 대장	
	☑ **과학 교구 검수 후 배치 및 안전 관리** • 각종 시약품 및 약품 보관 철저 • 영역별 배치 – 공통, 시약, 생명과 지구, 물질과 에너지로 구분 • 자료의 접근 용이성 및 안전성 확보 • 비상샤워기 및 안전설비 위치 확인(배수시설 연계)	D-10

참고 사항
- 최소 개교 한 달 전 입찰 의뢰 완료
- 배수관과 전원의 위치에 따라 실측 후 미리 실험용 책걸상의 배치를 구상하여 구입
- 일체형 비상 샤워기와 비상 세안기 확보
- 실험대에 간이 소화기 비치
- 학교 발주 과학기구(폐시약장 등 환기나 다른 기타 시설 설비가 요구되는 기구)는 시설과 설비 담당자와 협의하여 폐시약장 등이 설치될 위치에 환기설비(기타시설 설비)가 되어 있는지 또는 설비 가능한지 여부 등을 확인 후 구매

바 컴퓨터실 및 전산실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **비품 선정 및 구입** • 학생용 컴퓨터 구입 부록 Ⅲ-1-바-① – 학급 정원에 맞는 컴퓨터 대수와 사양 결정 – 사전 도교육청 지원 검토 (미래인재과 등) • 학생용 컴퓨터 책상 구입 • 태블릿PC, 노트북 등 지급 요청 또는 구입 • 전자칠판(인터렉티브화이트보드) 구입	D-180
	☑ **각종 전자 비품 구입 및 설치 위치 확정** • IP 및 네트워크 확인 • 책상 배치를 고려하여 전원, 네트워크 포트 위치 확인/ 무선AP 2대 이상 설치 ☑ **교내 컴퓨터 점검 (전산실)** • 교실 및 특별실 부팅 및 윈도우 암호 설정 • 내 PC지킴이, PC필터, 한컴오피스, MS office, V3 등 설치 – 한글 및 MS office 구입 예산 지원(기본경비) – 업체와 협의 후 구입 계약서 작성	D-30
	☑ **환경 구성** • 컴퓨터 및 교육기자재 검수 • 시건장치는 화재 등 안전사고를 고려하여 자세히 검토 후 설치 • 고가 장비 도난 예방을 위해 CCTV 설치 권고 ☑ **정보 관련 각종 점검 양식 준비 및 활용 시간표 작성** ☑ **전자칠판 사용 연수 – 업체 지원** ☑ **태블릿PC 사용 연수** ☑ **원격수업 운영을 위한 준비(웹캠, 핀마이크 등)** ☑ **스마트 장비 이용을 위한 무선 AP 설치** ☑ **마주온 기관 아이디 생성 및 학생 등록**	D-20

참고 사항

- 개학(입학) 전 스마트 패드 활용 및 스마트 시설 활용 연수 필요
- 장비 관리 대장과 관리 라벨 제작 및 장비 사용 방법을 기기에 부착
- 학생용은 용량이 클 필요가 없으므로 속도가 빠른 SSD 저장장치를 사용하는 노트북을 구입하는 것이 좋고, 교사용 컴퓨터는 영상 수업자료 저장을 위하여 용량의 크기 고려
- 모니터의 경우 업무 및 수업용의 경우 TV 화면이나 전자칠판의 규격과 맞추기 위하여 16:9 이상의 비율의 모니터가 적당함. 선 정리가 깔끔하게 가능한 모니터가 좋고, 높이 조절이 가능하여 학생들이 시야를 확보할 수 있는 것이 좋음

참고 • 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

사 강당(체육교구실 포함)

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **강당의 용도 확인** • 시청각실, 체육실, 다목적실 등이 있을 때 용도에 대한 정확한 결정 필요 ☑ **환경 구성안 확정** • 무대막, 블라인드 색상 정하기 • 코트 규격을 확인하여 바닥 라인 선정(배구, 농구, 배드민턴 등) • 강당 내 장애인 이동 리프트 • 강당 내 화장실 및 샤워실 표찰 • 벽면 전자시계(대) 및 강당 내 샤워실(탈의실) 사물함	D-50
	☑ **강당에서 개최되는 학교 행사용 물품 목록 작성** • 접이식 의자와 책상, 테이블보, 빔프로젝터 • 강의용 단상(대1, 소1) ☑ **체육 교구 목록 작성** • 학교급별 학년의 교육과정을 분석하여 체육 교구 결정 • 체육 교구 보관 앵글 설치(조립식 권고)	D-40
	☑ **체육교구실 구축** • 교구 정리 선반(철재) 견적 의뢰 • 철재 앵글 2단 선반 제작 의뢰 • 체육 교구 검수 후 배치 정리 정돈	D-30
	☑ **시설 사용법 숙지** • 부피가 큰 교구(농구대 등)는 강당에 보관해야 하므로 항시 안전사고 위험 ☑ **시설 안전 점검 확인** • 날카로운 모서리, 문 고정장치, 벽면 고무(안전장치) 높이, 강당 샤워실 및 화장실, 천장 농구대 안전 확인 ☑ **체육소위원회 구성 및 운영** • 학교체육 주요업무 참고	D-20
	☑ **학급별, 학년별 강당 사용 시간 배정**	D-10

참고 사항

- 체육건강과에서 관련 교구 지원 예산을 확인한 후 교구 구입
- 입찰을 통해 교구를 구입하기 때문에 최소 개교 한 달 전에 입찰 의뢰를 마쳐야 하며 최저가 입찰은 권장하지 않음[체육교구실에 교구 정리 선반(앵글) 제작]
- 안전 점검을 통해 시공사(또는 시설과)에 시설 보수 및 수정 요청 필요 부록 Ⅲ-1-사-①

참고 • 충청남도 각급학교 교구·설비 기준, 학교체육 주요업무

아 방송 및 시청각실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **방송실과 시청각실의 공간 구분 확인** • 학교급별 학생의 특성에 따라 공간 배치가 달라질 수 있음 ☑ **환경 구축(안) 확정** • 방송실: 무소음 바닥재, 암막, 방송 배경 막(크로마키), 방송 데스크 및 의자, 방송용 캠코더 • 시청각실: 암막 및 의자 색상 결정 ☑ **구축 비품 목록 선정 및 구축 설비**	D-40
	☑ **정보 비품 관련 양식 준비** ☑ **장비 사용 숙지** • 업체로부터 인수인계 ☑ **방송 정비 및 관련 장비 확인** • 교내·외 방송 및 TV 방송 시설(방송실, 교실) • 카메라 삼각대, 리모컨 • 카메라, 노트북, 빔프로젝터 영상 및 음향 송출 케이블 • 유선, 무선 마이크와 마이크대(T자형, I자형) ☑ **수업녹화시스템 및 원격 스튜디오 구성**	D-20

참고 사항

- 교육청에서 지원하는 방송 관련 장비와 비품 확인: 노트북 등 추가 구입 필요
- 장비 관리 대장과 관리 라벨 제작 및 장비 사용 방법을 기기에 부착
- 방송환경 구축의 예

- 디지털 전관 방송시스템 구축
  * 디지털 프로그램 제어용 PC와 TV 모니터 설치
  * CD player, 라디오, 마이크 등 음원 장비 설치
  * 900MHz 4CH 무선 마이크 설치로 스튜디오 및 운동장 사용
  * FULL HD 영상 송출시스템 구축
  * 실시간 및 저장된 자막방송 가능
  * 스튜디오 촬영장 비용 및 연결 단자 설치
  * 스튜디오 모니터 설치
  * 3원 방송시스템 구축
  * 민방위 훈련을 위한 라디오 튜너 및 화재경보기와 연동 시스템 구축
- 각 교실 스피커 및 선로 점검
- 교무실 간이 방송용 리모트 앰프 설치
- 옥외 방송시설 점검(옥외 스피커와 잭박스, 선로 점검)
- 이동식 앰프 구입
- 무상 A/S 보증기간 확인

자 도서실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **비품 선정 및 구입** • 도서 대여 카운터, 북트럭, 교사용과 도서 검색용 컴퓨터, 모니터, 바코드 리더기, 책 소독기 • 서가(초등 2~4단 서가) 및 스툴(소파), 책걸상 • 4인용 열람대, 1인용 열람대 등 다양한 공간 구성 필요 • 도서 대출, 반납을 위한 키오스크	D-90
	☑ **구입 도서 목록 수합** • 학년별 교과서 수록 도서 조사 • 기관별 추천 도서 조사 • 구입 도서 목록 및 권수 선정 • DLS 등록 및 분류라벨, 바코드 작업까지 포함	
	☑ **신설학교 독서교육지원시스템 확인(DLS)** • 독서교육지원시스템(DLS) 매뉴얼 확인 ☑ **도서실 시스템 구축 및 평면 구성 물품 의뢰** • 이용 안내, 십진 분류표 등 시안 의뢰 • 시안 수정 및 확정 및 부착 위치 정하기 ☑ **사서 도우미 공고 및 채용**	D-30
	☑ **물품 검수 후 도서실의 최적 환경 구성** • 학생의 이동을 고려한 물품 배치 • 서가의 위치와 독서대의 배치 • 독서를 증진할 수 있는 아늑하고 편안한 분위기 • 인터넷 위치 확인에 따른 열람대 배치 • 컴퓨터 배치 여부 확인 • 좌식 공간과 입식 공간 구성의 다양성도 필요 ☑ **서가 정리** • 한국 십진 분류표(KDC)에서 800(문학)이 가장 많이 차지하므로 서가 배열 시 반영	D-10

참고 사항

- 신설학교 도서구입 예산에 대한 지원 여부 확인
- 도서 구입 전, DLS 기관등록을 우선 마쳐야 함

참고

- 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

차 영어실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **영어실의 활용도 결정** • 영어수업실: 영어 교수·학습 위주 환경 구성 • 영어체험실 겸용: 영어적 언어 환경을 위한 코너 등 구성 ☑ **교수·학습 자료 및 기자재 구입** • 필수: 교사용 책걸상, 학생용 책걸상, 청소도구함, 시계, 교구장, 영어교육자료 • 선택: 영어환경 롤스크린, 영어환경 코너 등 ☑ **원어민 교사와 팀티칭을 위한 공간 구성** • 컴퓨터, 책상 등 배치	D-60
	☑ **영어 교구 검수 후 배치 정리** • 영어 담당 교사의 의견을 수렴하여 배치 • 영어 도서 등은 손쉽게 꺼내 볼 수 있도록 위치 • 가변형 체험 코너 등은 전문 업체의 도움이 필요	D-20

참고 사항

- 영어 교구는 업무 담당 교사가 직접 선정할 것
- 영어 도서의 구비: 도서관과 별개로 영어 도서 구비
  - 학교급, 학년별 알맞은 도서 선정
  - 생활영어의 흥미를 제고할 수 있는 도서 선정
  - 영어권 문화의 이해를 증진할 수 있는 도서 선정
- 전자칠판의 구비: 활용도 및 필요성을 고려하여 적극 권장 필요
- 가변형 체험 코너 조성: 흥미를 유발할 수 있도록 가변형으로 다양하게 구성하되, 예산 대비 교육적 효용성을 고려하여 구입
- 모둠학습이 가능한 공간 구성: 책상과 의자는 모둠별 및 개별학습이 가능한 것으로 구입

참고 • 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

카 음악실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **음악실 비품 확인** • 교사용 책걸상, 학생용 책걸상, 보면대, 시계, 쓰레기통, 청소도구함, 제습장치 또는 제습기, 피아노 등 ☑ **음악 관련 교구 선정** • 학교 급별 학년별 교육과정에 필요한 악기 선정 • 최소한의 합주가 가능하도록 악기 구입 ☑ **방과후학교 음악 관련 부서 악기 구입 여부 선정** ☑ **향후 지속적으로 악기 수리와 보수 비용 발생** • 기본적으로 사용하는 악기 위주로 구입 • 향후 발생하는 악기 수리 비용 확보	D-60
	☑ **악기장(가구 제작) 견적 의뢰** • 음악 준비실 한쪽 벽면 또는 여유 공간 • 구매한 악기의 크기와 종류에 따라 제작 의뢰 • 습기와 온도에 민감한 악기 보관 유의	D-30
	☑ **음악 교구 검수 후 배치 정리** • 악기 수납장에 보관하여 악기의 보관성 제고 • 악기 관리를 위한 각종 양식의 장부 비치	D-20

참고 사항

- 음악 교구 구입 시 악기장 제작비를 고려하여 구입
- 합주 등에 사용하는 악기는 주로 부피가 커서 보관하는 자료실이 꼭 필요
- 자료실이 없을 때 악기 수납장을 이용하여 보관
- 학교급별 학년별 악기를 사되, 방과후학교 프로그램의 악기 구입과 협의
- 개인별 악기는 개인별 구입을 원칙으로 하나, 초등학교의 경우 학교 일괄 구입 시 소독 등 철저
- 공간이 큰 경우에는 연주공연이 가능한 작은 공간 확보
- 전자칠판 구비(적극 권장)

참고 • 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

타 보건실과 보건교육실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **보건실과 보건교육실 위치 선정** • 보건실: 교실 1실을 전용으로 확보하며 각 실 및 운동장에서 이동이 쉽고 응급상황 대처에 쉬운 1층으로 장소 선정(설계 시 반영) • 보건교육실: 응급상황 발생 시 대처가 쉽고 업무 효율성을 높이기 위해 보건실 옆 교실로 선정하거나 일체형으로 두 실 사이를 유리창으로 설계	D-60
	☑ **보건실 공간 재구조화 및 보건교육실 구축 예산 확인** • 보건실은 세면대 등이 꼭 필요하므로 공사 현장에 신속 방문하여 점검 • 개교경비를 확인하여 보건실 등 인테리어 실시 검토 • 기타실(특별실)과 함께 추진 가능성으로 행정실과 협의 필요	D-50
	☑ **해당 시군 보건교사 협의회 의견수렴** • 효율적인 공간 구성 및 기구 배치에 대한 의견수렴	D-50
	☑ **환경 구성계획 수립** 부록 Ⅲ-1-타-① • 보건실 확보 면적에 따른 구축 계획 • 보건교육실은 한 학급 기준 수업이 가능하도록 책걸상 및 기자재 비치 • 보건교육실이 확보되면 교구 비치는 보건교육실에 비치하며, 미확보일 때 보건실에서 보건 교육용 교구장 확보	D-50
	☑ **기구 및 교구 구입** 부록 Ⅲ-1-타-② • 개교경비 학급별 재정 기준에 따른 기구 및 교구 목록과 수량 확보 • 보건(교육)실 기구 및 교구 구입 선정 협의 자료 준비 • 자동심장충격기 설치 장소 및 구입에 대한 협의 • 침구류 구입 시 하절기, 동절기 침구 세트 구입 • 심폐소생술 애니, 안전배낭가방	D-30
	☑ **약품 및 의약외품 구입** 부록 Ⅲ-1-타-③ • 학생 수 기준에 따른 약품 및 의약외품 수량 확보 • 학교급별에 따른 약품 선정(유, 초, 중등 사용 약물 구별) • 보건교사 미배치 시 학년별로 비상용 구급함을 비치하여 응급치료 상황에 대비 • 물(약)품 구입 시 입찰일 경우 모델명(상품명) 및 규격, 단가까지 정확히 기술	D-30
유아	☑ **유아 성장 발달에 맞는 보건실 환경 구성 및 약품 구입** • 보건실 침대 및 기구 구입 시 유아용 구입 • 취침실과 분리	

참고

- 학교보건법 제3조(보건시설 등)
- 학교보건법 시행령 제2조(보건실의 설치기준 등)
- 학교보건법 시행규칙 제2조(보건실의 시설과 기구 및 용품)

파 특수학급 교실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **교실구축 절차 및 방법** • 학생의 장애 유형 특성 조사 – 학생의 장애 특성, 연령, 발달단계, 흥미 등 고려 – 교실의 공간 구성은 개별화 교육을 효과적으로 할 수 있도록 재구성 • 보호자 상담을 통한 의견수렴	D-100
	☑ **학생 특성을 고려한 교육기자재 선정**	D-40
	☑ **시설·설비 및 환경 구성계획 수립** 부록 Ⅲ-1-파-① • 특수교육대상자의 특성 고려 수립 ☑ **예산 집행 계획 수립** • 공사계약 체결 방식 선정, 업체와 세부적인 협의를 통한 공사 준비 ☑ **통합교육을 위한 교실 교구와 시설 배치도 작성** • 「장애인 등에 대한 특수교육법 시행령」제16조(통합교육을 위한 시설·설비 등)	D-90
	☑ **교재교구 선정위원회 협의: 교재·교구 선정의 투명성과 객관성** ☑ **특수학급(교) 교실 설비 교구 기준에 의한 기본 설비 구축 또는 구입 계획 수립** • 「특수학교 시설·설비 기준령」 제4조(교사에 두는 시설의 종류 및 기준) ☑ **시설 설비, 각종 기자재, 소모품 등은 신·증설경비에서 구입**	D-20
	☑ **적절한 배치 및 시설 안전 점검** 부록 Ⅲ-1-파-② ☑ **일반 학교 내 특수학급 설치장소 및 시설의 조건** • 안전성, 미관성, 융통성, 연계성, 이용성, 관리성 측면 고려 • 「장애인 등에 대한 특수교육법」제27조(특수학급 설치 기준) ☑ **환경 구성의 유의 사항: 학습 동기를 유발할 수 있는 자극제** • 자유롭고 변화가 있는 환경으로서 입체적, 구성적, 계속적 구성 • 즐겁게 배우고 생활할 수 있는 미적, 매력적, 가정적인 환경 • 정서적 안정감을 길러주는 환경 구성 • 학생 요구에 적합한 환경 구성 ☑ **개별화 교수를 위한 공간 구성** • 독립적으로 공부하는 학생에게 유용한 장소 • 공통적인 관심이 있는 학생들이 모여서 학습할 수 있는 장소 • 쉴 수 있는 안락한 곳으로 흥미 학습이나 소집단 활동이 가능한 장소 • 교육자료를 보관하여 학생이 수시로 자료를 이용할 수 있는 장소	D-10
유	☑ **장애 유형별 공간 구축 및 교구 구비** • 기본놀이시설, 모래놀이, 목공놀이, 물놀이, 감각 놀이 • 취침과 간식 제공이 가능한 시설 및 공간 구비 • 통합교육활동이 이루어질 수 있도록 영역구성 및 활동 공간 구성	
중등	☑ **진로·직업 교육이 가능한 시설구비**	

하 기타실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
미술(작업)실	☑ **구축 방안 협의** • 작업대: 나무 작업대 • 각종 교구 용품: 기본적인 미술 도구	D-40
	☑ **교구 검수 및 미술실 정리**	D-20
실과(실습)실	☑ **구축 방안 협의** • 작업대: 방수 처리 상판 조리대, 나무 작업대 등 • 각종 조리용품: 칼, 도마, 냄비, 그릇류 기본 세트 구입 • 교육과정에 나오는 요리수업을 검토하여 예산 확보	D-40
	☑ **교구 검수 및 실과(실습)실 정리** ☑ **시설 점검 및 안전 점검** • 수도, 수압, 싱크대 상태 • 실과실 작업대(상판 대리석)	D-20
상담실	☑ **구축 방안 협의** • 상담실의 구성은 되도록 밝은색 계통으로 하는 것이 좋음 • 좌식 휴게공간을 두어 학생들이 신발을 벗고 들어가서 자유롭게 놀고 휴식을 취할 수 있는 공간을 구성하는 것도 좋음 • 시설 관리 및 유지 보수: 시설과 설비 관리대장 비치 활용, 주 1회 정기적으로 관리 점검 시행	D-40
	☑ **교구 검수 및 상담실 정리** ☑ **효율적인 물품 관리 방법** • 비품 관리대장 비치하고, 월 1회 정기적으로 관리 점검 시행 • 물품 분류 스티커 부착(행정실과 협의)	D-20

참고
• 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

가 교실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **교실 배치** • 층별 배치 – 1층: 만 3세 교실 ○학급, 특수교실 ○학급, 돌봄 전용 교실 – 2층: 만 4세 교실 ○학급, 만 5세 교실 ○학급	D-90
	☑ **실별 공간 재구조화 및 구축 예산 확인-추진위원단 구성** • 개원 경비에 포함된 재정 기준 목록 및 공간 재구조화 예산 확인 • 실별 구축 전담조직 구성-사업설계, 설치비에 대한 최종협의	D-80
	☑ **교직원 및 연령별 담임교사 협의** • 교실 내 효율적인 공간 구성 및 유아 안전 환경조성 • 책상, 교구장 등 비품 배치에 대한 의견수렴	
	☑ **보통 교실 환경 설비** • 유치원은 기본적으로 냉·난방시설, 바닥 난방시설, 교실 내 수도시설이 설비되어야 함 • 화장실이 교실과 통할 수 있어야 하며 남, 여 칸이 구분되어 가려져야 함	D-60
	☑ **환경 구성계획 수립** • 놀이공간 구성 예시: 쌓기 놀이, 역할 놀이, 언어, 수·조작, 과학, 미술, 음률 등 • 유아들의 흥미와 생각을 반영한 교실 환경 및 놀이공간 구성	
	☑ **기구 및 교구 구입** 부록Ⅲ-2-가-① • 교재교구 선정위원회 협의: 교재·교구 선정의 투명성과 객관성 • 필수: 책상, 의자, 교구장, 책꽂이, 사물함, 다목적 칠판, 게시판, 컴퓨터, 모니터, TV, 피아노 또는 전자오르간, 오디오기기, 살균 소독기, 전화기, 공기청정기, 진공청소기, 태극기, 시계, 청소도구 및 보관함, 쓰레기통, 신발장, 우산꽂이 • 권장: 복합기, 디지털카메라, 실물 화상기, 정수기, 카펫 • 자유 놀이 교재교구 및 놀잇감 선정 및 구입 부록Ⅲ-2-가-②	D-40
	☑ **시청각 기자재 설치** • 텔레비전 또는 전자칠판: 교실 전면 중앙 설치(교실 여건에 따라 위치 조정) – 유아 눈높이를 고려하여 연령별 설치 높이를 다르게 함 (예: 만 3세 교실-바닥에서 60cm, 만 4세-바닥에서 65cm, 만 5세-바닥에서 70cm) • 교육용 PC 또는 노트북: 인터넷 설치 및 텔레비전과 호환 여부 확인	D-30
	☑ **교수용 비품 배치** • 칠판, 피아노 또는 전자오르간, 교사용 컴퓨터 또는 노트북, 책상, 의자 – 교수용이므로 교실 전면 방향으로 적절하게 배치함 – 전선이 사용되는 기자재와 연결하고 변형이 가능하게 함	

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **자유 놀이공간 구성** 부록 Ⅲ-2-가-③ • 쌓기 놀이, 역할 놀이 등 자료장 및 유아 책상 배치로 놀이공간 구성 • 놀이공간 자료 비치 – 준비물: 투명 바구니(대, 중, 소), 교재·교구, 놀잇감 등	D-20
	☑ **유아 개인물품 보관 공간 마련** • 복도 배치: 사물함, 옷걸이, 실내화 정리장은 교실 내 배치가 어려운 경우 복도에 배치하고 유아 이름표 부착(VIC 아크릴케이스 7cm*3cm)	D-20
	☑ **새학교증후군 대비 공기 정화** • 공기청정기 설치 및 지속적 가동 – 교실 크기에 적정한 공기청정기 설치 • 실내 공기 정화용 화분 비치	D-20
	☑ **교실 및 화장실 내 청결 위생용품 비치** • 교실: 칫솔소독기, 휴지, 핸드타월, 물티슈, 쓰레기통, 정수기(온수 기능 제외) • 화장실: 손 세정제, 휴지, 실내화(유아용, 교사용)	D-10
	☑ **학급 표찰 및 안내판 설치**	

참고 사항

- 만 3세 학급은 현관에서 가까운 쪽으로 1층을 주로 배치하나 특수학급 및 돌봄교실이 우선 배치되며 유치원의 사정에 따라 변경될 수 있음
- 유아 사물함 및 신발장 등 이름 부착에 VIC 아크릴케이스를 사용하면 수시로 교체할 수 있고 코팅하지 않아도 되어 업무적으로 효율적임
- 화장실 내 '핸드 드라이어'가 소음이 크므로 '핸드타월'이 쉬울 수 있으며 기존에 설치된 유치원에서 잘 활용되지 않는다는 의견이 있음
- TV-전자칠판, 스마트 TV: 전자칠판을 설치하면 교수에 쉬움
- 놀이공간 구성할 때는 연령별 유의점을 참고하기를 바람
- 책상, 의자, 교구장, 책꽂이, 다목적 칠판은 유아의 연령을 고려하여 높이를 다르게 함

참고

- 충청남도 각급학교 교구·설비 기준

나 도서실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **신설학교 장서 지원** • 신설학교 장서 구입비 지원 내용 확인(교육혁신과 평생교육팀) • 예산편성: 선택적 교육활동(정책)-독서활동(단위)-독서활동운영(세부)	D-90
	☑ **도서실 인테리어 벤치마킹 및 시공** • 도서실 구성을 위한 타 유치원과 도서관 등 시설 참관 • 도서실 설치 전문 업체 의뢰 및 인테리어 시안 비교 • 유아의 안전과 편안함을 줄 수 있는 인테리어 시안 확정 및 시공 의뢰	D-80
	☑ **도서실 비품 선정 및 구입** • 필수: 열람용 테이블, 열람용 의자, 대출용 컴퓨터, 모니터, 유아용 도서, 도서 수납 책장, 바코드 스캐너, 도서 반납함, 도서 반납, 대출표, 공기청정기, 진공청소기, 시계, 청소도구 및 보관함, 쓰레기통 • 권장: 휴게용 소파	
	☑ **구입 도서 목록 수합** 부록 Ⅲ-2-나-① • 놀이 주제별 도서 목록 수집 • 유치원 권장 도서 수집 • 구입 도서 목록 및 권수 선정	D-50
	☑ **도서선정위원회(개원 준비 위원회)** 부록 Ⅲ-2-나-② • 위원단 조직(외부위원 포함) • 위원회를 통한 도서 선정 및 구입 심의	
	☑ **도서 구입 관련 품의 및 입찰 의뢰** • 현행 관련 규정과 지침 확인	
	☑ **학교 도서관 업무지원 확인** • ○○행복교육 통합누리집 〉 학교지원 〉 학교도서관업무 지원 확인 – 도서실 장서 점검 및 폐기, 서가 및 도서 정리 등	
	☑ **도서실 환경 구성 물품 의뢰** • 이용 안내, 십진 분류표 등 시안 의뢰 • 시안 수정 및 확정 • 부착 위치 정하기	D-40
	☑ **도서실 비품 배치** • 전화선, 인터넷 위치 확인 • 책 소독기. 무인도서 대출 반납기 설치 등	

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **환경 구성** • 도서실 이용 안내판, 권장 도서 비치대, 방염 블라인드 • 비품: 책장, 책꽂이, 도서 관리를 위한 컴퓨터, 책상, 의자 배치 • 도서: 분류번호에 따라 도서 정리 • 인테리어 소품 – 도서 내용에 관련된 소품 비치(예: 구름빵 주인공 인형, 피노키오) – 작은 화분, 독서대 등	D-30
	☑ **서가 정리** • 총류 100~역사 900(문학 800이 가장 많음)	D-10
	☑ **도서관 이용 안내** • 도서 대여 프로그램 설치와 유아 등록 • 도서관 이용 계획 수립	D+10

참고 사항

- 신설학교 장서 구입비 지원을 통해 양질의 도서를 신속하게 비치
  * 동 사업비 지원과 별도로 학교 자체 장서(도서) 구입비 반드시 편성
- 입찰을 통해 도서를 구입하기 때문에 최소 개교 한 달 전에 입찰 의뢰를 마쳐야 3월부터 원활하게 도서실을 운영할 수 있음
- 유아용 도서는 놀이 주제별로 사되 유아의 발달 수준을 고려하여 연령별로 구입
- 놀이 주제별 교육과정 관련 도서는 별도로 보관하여 수업 활용
- 유아가 스스로 책을 꺼내 볼 수 있도록 칸별로 적정량 비치

다 자료실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **자료실 공간 재구조화 및 구축 예산 확인** • 개원 경비에 포함된 재정 기준 목록 및 공간 재구조화 예산 확인 • 실별 사업설계, 설치비에 대한 최종협의	D-70
	☑ **물품선정위원회 개최** • 자료장 제작 형태 협의 및 교육기자재 등 구입 목록 작성 • 교재·교구 우선 구입 순위 목록 작성 • 자료실 관리 계획 수립 부록 Ⅲ-2-다-①	D-60
	☑ **환경 구성** • 학급별 구분 표지판, 자료 목록표, 자료실 물건 배치도	D-40

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **비품 선정 및 구입** • 필수: 교재교구장, 캠코더, 기자재 보관함, 자료 제작용 책상, 의자, 코팅기, 종이 재단기, 제본기, 종이류 보관함(A4, A3, 8절, 4절, 2절), 각 소모품 보관함	D-30
	☑ **학습준비물 및 소모품 구입** 부록 Ⅲ-2-다-② • 학습준비물 및 소모품 구입 계획을 수립하여 사들인 후 정리장에 정리	D-20

참고 사항

- 자료실 교재교구장은 이동식 서가형이 공간을 적게 차지하고 자료를 효율적으로 분류하여 보관하기에 쉬움

라 강당(유희실)

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **강당(유희실) 구축 예산 확인** • 개원 경비에 포함된 재정 기준 목록 및 공간 재구조화 예산 확인 • 실별 사업설계, 설치비에 대한 최종협의	D-70
	☑ **물품선정위원회 개최** • 유치원 설비 교구 확인 • 교재 교구 목록 작성 및 우선 구입 순위 목록 작성	D-60
	☑ **강당(유희실) 환경 설비** • 냉·난방 시설, 바닥 난방시설, 화장실 • 정수기, 환풍기	D-50
	☑ **공간 재구조화 업체 시안 확인 및 결정** • 유아의 안전을 고려한 벽면 쿠션 설치 • 붙박이 도구 정리장 등 실내 환경 구성 협의	
	☑ **신체활동 교구 선정 및 구입** • 필수: 도구 정리장, 신체활동 기구, 전통놀이 기구, 기타 활동 기구, 매트	D-30

3. 초등학교

가 돌봄교실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **수요 조사와 결과 분석** • 초등돌봄교실, 늘봄학교 희망 학생 등 파악 • 초과 수요 대처를 위한 초등돌봄교실 즉각 대응 체제 구축 ☑ **돌봄인력 운영** • 초등돌봄전담사 외 돌봄교실 필요 인력 확인 및 채용 ☑ **비품 선정 및 구입** • 필수: 책상, 의자, 교구장, 책꽂이, 컴퓨터, 모니터, 프린터, 사물함, 다목적 칠판, TV, 냉장고(보존식 보존 가능), 전화기, 공기청정기, 청소기, 청소도구 및 보관함, 신발장 등 • 선택: 식수대, 체온 측정기(손소독 겸용), 암막 블라인드 등	D-40
	☑ **교수·학습자료 목록 작성 및 구입** • 각종 돌봄교실 관련 교구: 돌봄 담당 교사, 돌봄전담사와 협의 • 초등학생용 도서, 신체활동 기구 등	D-30

참고 사항
- 연간 운영계획 수립과 작성 후 학교운영위원회 심의
- 휴식을 위한 공간 확보 및 출입문 및 창문 잠금장치 확인
- 청결하고 위생적인 간식 제공을 위한 환경 구비(냉장고(보존식, 간식 보관), 식기, 싱크대, 살균 소독기 등 구비)
- 정서적 안정을 도모할 수 있는 편안하고 아늑한 시설·설비 및 학습을 병행할 수 있는 교재·교구 구비
- 안전시설 관리 고려(안전 및 대피시설 포함)
- 학생 안전 보호시스템(비상벨, 인터폰, 소화기 등) 구축
- 출입이 편리하고 화장실, 보건실, 교무실 등과 인접한 교실로 가급적 1층에 마련 권장

나 병설 유치원

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
공통	☑ **비품 선정 및 구입** • 필수: 책상, 의자, 교구장, 책꽂이, 사물함, 다목적 칠판, 게시판, 컴퓨터, 모니터, TV, 피아노 또는 전자오르간, 오디오기기, 살균 소독기, 전화기, 공기청정기, 진공청소기, 태극기, 시계, 청소도구 및 보관함, 쓰레기통, 신발장, 우산꽂이 • 권장: 복합기, 디지털카메라, 실물 화상기, 정수기, 카펫	D-40
	☑ **교수·학습자료 목록 작성 및 구입** • 자유 놀이 교재·교구와 놀잇감 구입 • 유아용 도서, 신체활동 기구 등 구입	D-30

참고 사항
- 유치원 놀이터 및 자료실이 초등학교와 별도로 필요함
- 63쪽~67쪽 유치원 실별 구축 안내자료 참조

4. 중·고등학교

가 성적처리실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **성적처리실 위치 선정** • 보안을 위해 학생 동선과 분리 • 성적처리실 외 겸용으로 사용하지 않도록 제한 ☑ **성적처리실 구축 예산 확인** • 개교경비에 포함된 재정 기준 목록 확인 • 사업설계, 설치비에 대한 최종협의	D-40
	☑ **성적처리실 환경 구성계획 수립** • 효율적인 공간 구성 및 가구 배치에 대한 의견수렴 • 스마트 채점기기 사용 관련 협의를 통해 비품 구입 • 보안에 철저한 환경 구성(출입문 및 창문 개폐, 성적처리기기 배치 등)	D-30
	☑ **성적처리실 비품 구입** • 필수: 탁자와 의자, 고속 스캐너, 컴퓨터, 캐비닛, 잠금장치, CCTV 보안장치, 암막 블라인드 • 선택: 레이저프린터, 인쇄 장비, OMR카드, 시험지 봉투(개교 후 구비 가능)	D-20
	☑ **비품 검수 후 배치**	

참고 사항
- 성적처리 보안지침 확인을 통한 환경 구성 필요
- 스마트 채점기기 사용 관련 협의 필요
- 출입문 및 창문 잠금장치 구입
- 성적처리실 관리자 지정(정/부) 책임관리

나 학생 동아리실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **동아리실 위치 선정** • 학생 접근성 고려와 소음 발생 등을 고려 ☑ **동아리실 구축 예산 확인** • 개교경비에 포함된 재정 기준 목록 확인 • 사업설계, 설치비에 대한 최종협의	D-40
	☑ **동아리실 환경 구성계획 수립** • 특성에 맞는 동아리실 구성 : 전면 거울, 매트리스, 방음시설 등 • 다양한 동아리 활동이 가능한 가변적 공간(접이식 책걸상 등) 조성	D-30
	☑ **동아리실 비품 구입** • 필수: 회의용 탁자와 의자 • 선택: 전면 거울, 빔프로젝터, 음향시설, 이동식 화이트보드 ☑ **비품 검수 후 배치**	D-20

참고 사항
- 동아리 운영 협의를 통한 동아리실 환경 구성
- 무용, 댄스, 밴드 등 전용실 활용에 대한 협의 필요
- 학생회의실 등 다용도 목적으로 활용 가능
- 소음 방지 환경 구성

다 기술실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **기술실, 기술준비실 위치, 규모 선정** • 기술 수업의 다양한 활동이 가능한 넓은 공간이 확보된 장소 선정 • 일반교실과 분리된 장소 선정 권장 • 기술준비실은 기술실 재료 보관을 위해 바로 옆 교실로 선정 ☑ **기술교과 교구 구입 예산 확인** • 개교경비에 포함된 재정 기준 목록 확인 • 기술실 환경 구성 전반 협의 • 교구 선정 및 구입 협의	D-180
	☑ **기술실 환경 구성계획** • 기술 수업에 적합한 테이블 비치: 실습 테이블 사이즈 확인 • 기술 수업 작품 보관에 적합한 수납장 교실 내 비치 • 수도시설 구비 및 환기시설 정비 (3D프린터 설치 시 별도 환기 공간 설치)	D-30
	☑ **기술 교과 교구 검수**	
	☑ **시설 점검 및 안전 점검** • 기술실 작업대(상판 대리석) 상태 점검 • 공구 안전 상태 점검	D-20

참고 사항
- 개교 후 물품 구입 가능(기술교사 의견 반영)
- 안전 점검을 통해 시공사(또는 시설과)에 시설 보수 및 수정 요청 필요

라 가정실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **가정실, 가정준비실 위치, 규모 선정** • 담당자 공사 현장 방문 : 수전, 배전 등 실정에 맞게 시설 변경 요청 • 가정 수업의 다양한 활동이 가능하고 넓은 공간이 확보된 장소를 선정 • 일반교실과 분리된 장소 선정 권장 • 가정준비실은 가정실 재료 보관을 위해 바로 옆 교실로 선정 ☑ **가정교과 교구 구입 예산 확인** • 개교경비에 포함된 재정 기준 목록 확인 • 가정실 환경 구성 전반 협의	D-180
	☑ **가정실 환경 구성계획** • 가정 수업에 쉬운 테이블 비치 : 실습 테이블 사이즈 확인 • 가정 수업 작품 보관에 쉬운 수납장 교실 내 비치 • 수도시설 구비 및 환기시설 정비(수전 수량 및 위치 확인) ☑ **가정 교과 교구 검수**	D-30
	☑ **시설 점검 및 안전 점검** • 수도, 수압, 싱크대 상태, 하수 처리 상태 점검 • 가스, 환기시설 점검	D-20

참고 사항
- 개교 후 물품 구입 가능(인덕션 설치 등 가정교사 의견 반영)
- 안전 점검을 통해 시공사(또는 시설과)에 시설 보수 및 수정 요청 필요

마 진로실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **진로실, 진로상담실 위치 선정** • 진로실: 일반교실과 분리된 장소 선정 • 진로상담실: 진로실과 연계해 별도 조성	D-40
	☑ **환경 구성계획 수립** • 진로실, 진로상담실 확보 면적에 따른 구축 계획	D-30
	☑ **진로실 정리**	
	☑ **시설 점검 및 안전 점검**	D-20

참고 사항
- 진로교사의 의견을 최대한 반영하여 교구를 선정함
- 진로실 및 진로상담실을 별도로 운영하는 것을 권장함
- 진로 포트폴리오 보관을 위한 충분한 교구장 확보함
- 직업심리검사를 위한 진로 탐색용 컴퓨터를 구입할 수 있음

마 미술실

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	• 미술실: 다양한 활동이 이루어질 수 있는 충분한 공간 확보 • 작품 건조, 채색 등이 가능한 야외공간 확보(폴딩도어 활용) • 미술 준비실 확보	D-40
	☑ **환경 구성계획 수립** • 미술실 확보 면적에 따른 구축 계획 • 수도시설(개수대), 환기시설 구축 • 여유 공간을 활용한 갤러리 구성 권장	D-30
	☑ **미술실 정리**	
	☑ **시설 점검 및 안전 점검**	D-20

참고 사항
- 미술교사의 의견을 최대한 반영하여 교구 선정
- 각종 미술작품 보관을 위한 충분한 교구장 확보(미술실 내 및 미술 준비실)

5. 특수학교

가 유치원

구분	업무처리 절차 및 내용	시기
구축	☑ **교실구축 및 환경조성** • 특수 교육 대상자 연령 및 장애 특성, 발달 상황 파악 • 장애유형 및 특성 파악 – 휠체어 및 지체 장애 학생 포함의 경우 침대, 매트, 칸막이 등 설치 필요) • 유아용 활동 공간 구성 – 역할·언어·조작·음률영역 등 유아의 연령과 장애 정도를 고려하여 교실 환경 구축 ☑ **안전한 야외놀이 시설 구축**	D-70
	☑ **유희실 환경 구축 교재교구** • 신체활동 및 놀이에 필요한 교재교구 구입 ☑ **잠자는 방 환경 구축 및 교재교구** • 벽 매트와 바닥 매트 설치 ☑ **자료실 구축** • 연령별, 주제별, 영역별 교재교구 선정 및 구입 • 자료실 자료장 제작 및 상부장 설치 • 자료 대장 기록 및 자료실 정리	D-50
	☑ **교재교구 구입** • 장애유형 및 특성을 파악하여 발달단계에 맞는 교재교구 구입 • 누리과정 운영을 위한 교사용 지도자료, 표준보육과정, 누리교육과정 해설서, 중도·중복 장애학생 교수·학습자료 구입 • 자유 선택 활동을 위한 주제에 따른 영역별 지도자료 구입 • 신체활동 및 실외 활동을 위한 교재교구 구입 ☑ **기본 학습준비물 구입** ☑ **배치도 작성**	D-40

참고 사항
- 화장실
  – 남녀 구분이 아니라 화장실 한 칸 안에서 칸막이를 사용하여 남녀 구분 필요
  – 유아용 변기 설치, 세면대 높이 유아용으로 조절. 교사용 변기 포함
  – 건식장소 필요(기저귀 교체 및 옷 갈아입을 장소 필요)
- 장애인 전용 화장실 설치

나 초·중·고 교실

실	업무처리 절차 및 내용	시기
초·중·고등학교 교실	☑ **교실구축 및 환경조성** • 장애유형 및 특성 파악 – 휠체어 및 지체 장애 학생 포함의 경우 침대, 매트, 칸막이 등 설치 필요 • 책상과 의자, 학생 사물함, 청소용품함 구비 – 장애 특성에 따라 넓고 높낮이 조절할 수 있는 책상과 의자 구입 – 학생 사물함 및 청소용품함의 디자인 및 높이 통일 필요 • 게시판, 옷장, 교사용 탁자, 책장, 학급용 칠판, 교구장과 정리장 구비 • 교실 뒤편 휠체어용 싱크대 혹은 세면대 설치(학교급별 높이 및 실별 특성 고려하여, 휠체어 진입할 수 있는 디자인 설치) ☑ **중·고 중도·중복장애 교실구축** • 화장실 및 심리안정실 등의 교실 구축 필요	D-80
	☑ **교재교구 및 학습준비물 구입** • 학년별 특성 고려, 과목에 따른 교재·교구 준비 • 기본 학습준비물 구입	D-50

참고 사항
- 교재·교구와 학습준비물을 기본적인 것만 구입 후, 개교 후 추가 지원(과목별 운영비 예산 편성 필요)
- 개교 후 실제 교육과정 운영 교사가 필요한 물품으로 구입 필요
- 초등 교과 교실구축: 음악실, 미술실 등
- 중·고등 교과 교실 구축: 음악실, 미술실, 과학실, 기술가정실, 영어실, 사회실 등
- 초 1, 2 저학년의 경우 바닥 매트 필요, 좌식 학습공간도 고려 필요

참고
- 유치원 특수학급 운영 안내
- 충청남도 특수교육 교육과정 편성·운영 지침
- 특수학교 시설·설비 기준령

다 중·고·전공과 직업교육실(공통)

실	업무처리 절차 및 내용	시기
중·고·전공과 직업교육실 공통	☑ **학교교육과정 수립** • 학생 특성, 지역 특성 분석하여 특수성 있는 교육과정 수립 • 교육과정 운영에 필요한 특별실 및 직업교육실 파악 ☑ **전공과 교육과정 승인요청** • 특수학교 교육과정 전문교과 Ⅰ~Ⅲ를 참고하여 교육과정 수립 후 교육감 승인 요청	D-90
	☑ **동선에 맞는 실별 위치 선정** • 학교급별 교실과 학생 동선을 고려하여 직업교육실의 위치 선정 – 같은 층에 같은 급별 학생이 이용할 수 있도록 교과교실(직업교육실)로 배치 – 농생명실(원예실)의 경우 실습지 옆 1층에 배치 – 고등, 전공과 과정이라도 바리스타 교육과정 운영을 위한 카페 설치할 경우, 1층에 배치	D-80
	☑ **실별 구축 협의** • 각 실 배치도 작성 및 실 특성에 맞는 시설 구축 • 기본 교재교구 및 준비물 구입 • 실별 도면을 확인하고 직접 현장을 신속 방문하여 창문, 출입구, 교실 구획, 전기 배선, 수전, 배수 확인(일정 공사 기간이 지나면 변경 불가) • 협의를 통한 물품 선정 및 협의록 작성	
	☑ **특별 공사가 필요한 실 파악** • 공간 재구조화 공사가 필요한 실 파악(도서실, 언어치료실, 카페, e스포츠실, 감각통합실, 심리안정실, 일상생활훈련실 등 전체 또는 부분 공사가 필요한 실 파악) • 전기승압 공사가 필요한 실 파악(도자기 공예실, 제과제빵실, 바리스타실, 세탁실 등 전기 사용이 많은 교과)	

참고 사항

• 각 실 조성 전 충남교육청 시설과와 충분한 협의 필요(예산 범위, 지원할 수 있는 시설 설비, 설계 변경 가능 여부 등)

라 중·고 직업교육실

실	업무처리 절차 및 내용	시기
중·고 직업교육실	☑ **도자기 공예실** • 실습실: 교사 실습대, 학생실습대, 작품 진열장(높은 장, 낮은 장), 싱크대, 이동식 도구함 • 준비실: 수납장, 토련기, 작업대 • 건조실: 건조대, 작업대 • 가마실: 가마(전기승압 공사), 작업대 • 건조실과 가마실의 벽을 없애거나 하나의 공간으로 사용할 수 있게 문 설치	D-100
	☑ **제과제빵실** • 실습실: 오븐, 발효기, 믹서, 선반, 교사 실습대, 학생실습대, 벽면 큰 싱크대 • 준비실: 냉장 냉동고, 철제선반, 수납장 • 전기승압 공사 필요	
	☑ **농업실** • 교사 실습대, 학생실습대, 큰 싱크대, 수납장, 창가 벽면 선반 • 1층에 배치하여 실습지와 연결(설계 시 반영)	
	☑ **가사실** • 실 구축 전 수도와 싱크대, 인덕션 위치 및 개수 확인 – 교사의 피드백이 쉽도록 'ㄷ'형태, 아일랜드식 'ㅣ'형태, 'T' 형태 중 결정 • 빌트인 할 물품(오븐, 밥솥, 레인지 등)과 위치 결정 • 전기승압 고려	D-100
	☑ **진로와 직업실** • 농업, 제조업, 서비스업의 기초를 골고루 학습할 수 있도록 기자재 및 교재·교구 마련 • 수전과 싱크대 위치, 전기 공사, 배수 등 실 사용에 따른 판단 필요 • 전기승압 고려	

마 전공과 직업훈련실

실	업무처리 절차 및 내용	시기
전공과 직업훈련실	☑ **농가공실** • 업소용 냉장고, 식품 건조기, 싱크대 등 배치 • 수도와 쿡탑이 있는 조리대 2개 이상 배치 • 작업대는 위생을 고려하여 상판 인조대리석 혹은 스테인리스가 적당함 (넓은 작업대를 구매하여 배치하는 것도 고려)	D-100
	☑ **생활공예실** • 천정형 릴콘센트 권고(휠체어와 수레 이동 고려) • 공예실의 특징을 살릴 수 있는 진열장 선택	
	☑ **사무지원실** • 다양한 사무용품 배치: 복사기, 문서 세단기, 코팅기, 컴퓨터 등	
	☑ **세탁·용역실** • 손세탁이 가능한 넓은 싱크볼 필요 • 업소용, 일반 가정용 세탁기 중 세탁실 운영을 고려한 선택 • 옷과 도구를 수납할 수 있는 충분한 장 설치 • 수전, 배수, 전기 시설의 확인이 꼭 필요, 전기승압 공사 필수	
	☑ **바리스타실** • 커피머신 2대 이상 설치할 수 있는 크기의 싱크대 설치 • 설거지가 잦은 실별 특성을 고려하여 온수 수도 설비 구축 • 카페 현장과 비슷한 카페용 탁자와 의자 마련 • 교사용 실습대는 위생을 고려하여 상판을 인조대리석으로 하고 아래는 수납할 수 있도록 제작 • 수전, 배수, 전기 시설의 확인이 꼭 필요, 전기승압 공사 필수	
	☑ **공동작업실** • 천정형 릴콘센트 권고(휠체어와 수레 이동 고려) • 수레의 이동이 편리하도록 출입문 철제 여닫이문으로 선택 • 안전한 작업을 위한 넓고 튼튼한 철재 소재의 작업대 선택(직사각형 혹은 원형 작업대) • 수납장, 선반들은 부품이나 공구를 안정적으로 보관하도록 철재 소재 선택 • 완성품과 부품 등을 운반할 수레 구비	

참고 사항
- 실별 특성과 장애 학생의 특성에 맞는 의자 선택(등받이가 있고 너무 무겁지 않은 의자, 소재는 플라스틱이 적당)
- 작업을 위해 일반 책상보다 넓고 튼튼한 작업대 선택
- 교육과정에 따라 업소용 싱크대 설치 유무 판단

바 기타 특별실

실	업무처리 절차 및 내용	시기
자료실	☑ **환경 구축** • 교재교구장, 종이류 보관함, 소모품 보관함 설치, 제본기, 코팅기, 종이 재단기 등 • 과정별, 층별 자료실 구축 – 과정별 특성에 맞는 교재교구 구입 후 과정별 관리 – 과목별 표지판, 자료 목록표	D-30
	참고 사항 • 과정 특성에 맞는 자료실 구축 • 교재교구장 제작 시 자료의 특성 고려하여 높이와 넓이 등 다양하게 제작 • 붙박이장 설치 고려	
언어치료실	☑ **교실구축 및 환경조성** • 언어치료실 2개 실 이상 확보(순회 언어치료사가 학교로 들어와서 치료) • 교실구축: 교사용 책상과 의자, 교사용 컴퓨터, 학생용 책상과 의자, 교구장, 오디오 세트 구비	D-30
	☑ **교재교구** • 그림 퍼즐 세트(멜로디 퍼즐 등), 단어 카드(일상생활 훈련용, 사물, 음식, 동물 등 실사), 놀잇감, 소프트웨어, 감각 훈련자료, 언어훈련용 전화기, 보완·대체 의사소통 기기, 음성기록 장치, 발성발어촉진기, 구강 자극 치료 세트	
	참고 사항 • 언어치료실 필수로 확보: 각도 및 높낮이 조절 책상 구입 필요	
감각운동실	☑ **환경 구성과 실 구축** • 벽과 바닥 매트 시공 • 클라이밍 월 설치(충분한 넓이와 높이 고려) • 사다리 세트 설치(사다리 오르기, 그물 오르기, 암벽 오르기, 흔들사다리) • 천장 감각 훈련 세트(그네 기본 장비와 높낮이 조절 장치 천장 부착, 스윙 그네, 글라이더 볼스터, 플랫폼 스윙 등) • 촉각 놀이(벽면 촉간판 설치, 촉감 자극 세트, 촉감 훈련 세트 구비) • 터널, 플레이 세트, 실내 놀이 시설 설치	D-20
	참고 사항 • 안전을 생각하여 벽 매트 필수 설치 • 안전을 고려한 바닥 매트 두께 설치 • 스윙 그네나 클라이밍 월 등을 충분히 사용할 수 있도록 넓은 교실 선택 • 유아, 초등저학년뿐 아니라 중·고등학생도 사용할 수 있도록 다양한 사이즈와 크기로 구비	

실	업무처리 절차 및 내용	시기
심리안정실	☑ **환경 구축** • 물방울 기둥, 광섬유, 음악 소리 빛 반응, 행동 반응시스템, 물침대, 진동수파 등 충분한 휴식과 흥분을 가라앉힐 수 있는 환경 • 따뜻하고 안정적인 분위기로 구성하여 심리안정 공간 • 작은 소음이나 외부 환경에 과도하게 반응할 때 자극이 없는 장소 • 심신을 편안하게 하고 긴장감 완화와 주의 집중력이 가능한 공간	D-20
	참고 사항 • 학생의 요구에 따라 감각기관의 자극 및 자극 차단에 대한 공간 구성 필요	
일상생활훈련실	☑ **환경 구축** • 시설 공사 시 일상생활훈련실 구축 여부 신속 확인(수·배전 위치 확인) • 독립적으로 생활할 수 있는 자조 기술 지도를 위해 실제 가정집 같은 인테리어 필요(가구 및 구조 고려)	D-30
	참고 사항 • 안전사고 등을 예방하기 위해 주방용품 관리주의	
샤워실	☑ **모자 샤워실 구축** • 기본 화장실 시설: 변기, 세면대, 거울, 수건, 샤워기 등 구성 • 침대 마련: 눕거나 앉아서 씻기가 가능한 침대 구비 • 수납함: 수건, 기저귀, 위생용품 보관 장소 마련 • 세탁실 마련: 세탁기, 세탁용품, 빨래 건조대	D-20
	참고 사항 • 세제나 세탁용품이 보이지 않게 보관되도록 문이 있는 수납함 사용	
교육공무직실	☑ **실 구축 및 환경 구성** • 기본 설비: 바닥 난방, 책상, 의자, 옷장, 컴퓨터, 티 테이블 • 세면대 설치 • 특수교육지원인력, 통학보조원 역할에 따른 실 분리 필요	D-20
	참고 사항 • 직종과 인원수 고려하여 교육공무직실 확보 • 적절한 휴식이 이루어질 수 있는 공간으로 구성	
돌봄교실	☑ **돌봄교실 구축** • 안전한 시설과 기자재로 구축 • 바닥 난방 및 세면대 설치 • 화장실 포함된 교실이거나 가까운 쪽 실 이용 • 수납장 및 신발장 등 편의시설 구축 • 교구와 소모품, 도서 구입 • 강사 명찰 준비 • 교사 책상과 의자, 컴퓨터 필요	D-20
	참고 사항 • 유, 초, 중, 고 학생들이 혼재하여 운영되므로 책상, 의자, 기타 장 사이즈 고려 • 자율 귀가로 인해 보호자들의 접근이 쉽고 안전이 보장되는 장소로 선정 • 휴식과 안정이 이루어질 수 있는 공간도 한쪽에 마련	

IV

학교급별 업무 추진

1. 유치원 | 91
2. 초 · 중등학교 | 96
3. 특수학교 | 109

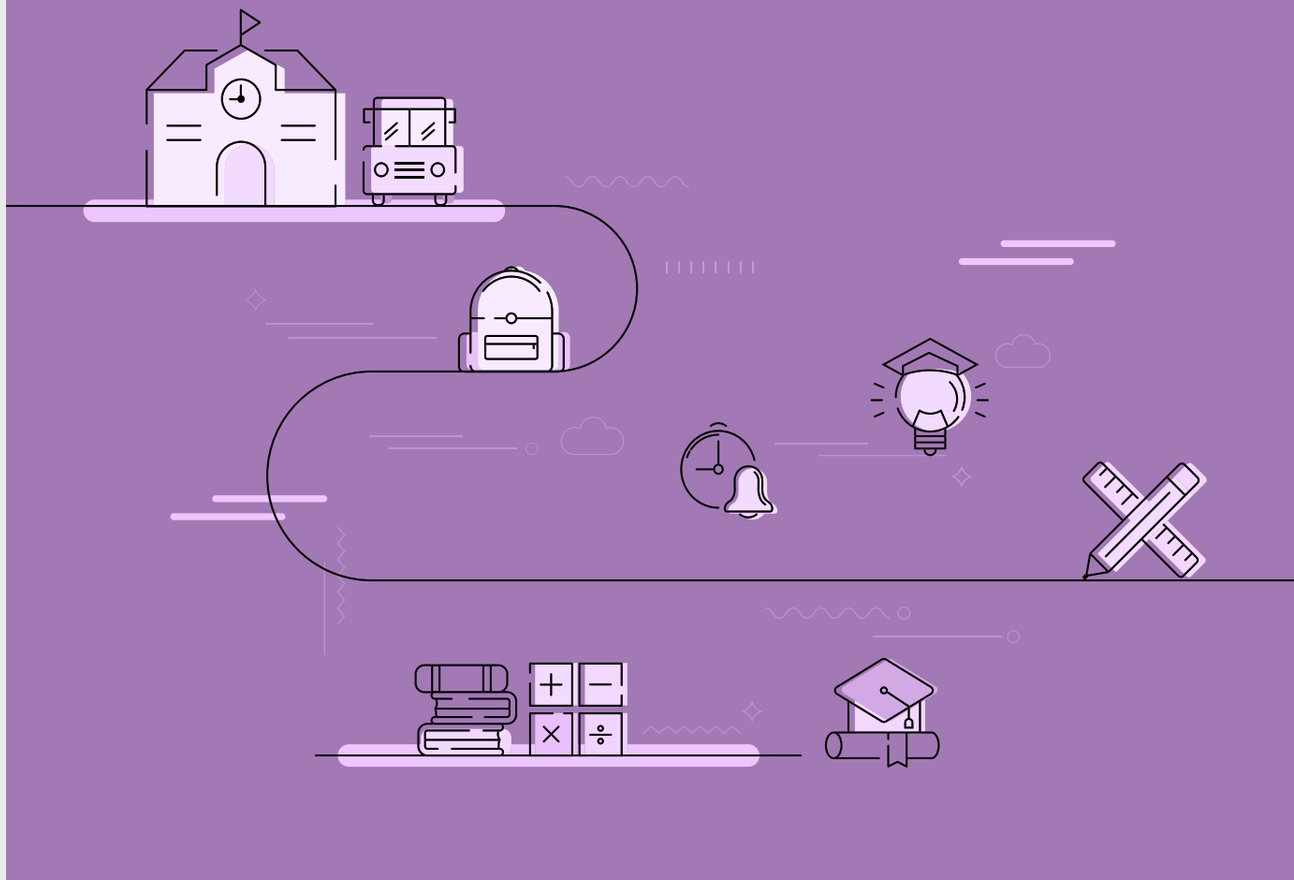

Ⅳ
학교급별 업무 추진

충청남도 신설학교 교무학사
개교 업무편람

가 교무부

업무명	업무처리 절차 및 내용		시기
교육과정	운영 계획 수립	☑ **유치원 교육과정위원회 조직과 교육과정 편성계획 수립** • 교육과정 편성·운영 지침 분석 • 실태 조사 분석 및 시사점 추출 • 유치원 교육과정 편성 운영의 기본 방향 및 구성 체계 결정 • 교육과정 지원계획 수립 • 유치원 교육과정 시안 심의·확정 ☑ **원격 수업 운영** • 원격수업운영위원회 구성 • 원격 수업 운영계획 수립 및 운영	D-60
	참고 사항 • 교육과정 운영계획은 학급 담임 및 업무분장에 따라 사업 및 영역을 1차 계획하고 협의를 통하여 수정·보완하여 완성		
신입생 보호자 예비교육	예비 교육	☑ **신입생 보호자 예비교육 계획 수립** • 등록부, 안내문 발송, 반별 안내판(삼각대, 표지판 등) – 입학 관련 제출 서류 등 보호자 안내 서류 준비 – 환경 구성 및 준비물 점검, 방송 기자재 점검 ☑ **학급편성 및 유아 명부 작성** ☑ **유아 입학 관련 문의 담당자 지정** • 입학 문의 대장 작성, 등록포기자 발생 시 대기자 즉시 알림 등 ☑ **문자 알리미 시스템 유아 등록** ☑ **유치원 안내 사항 및 홍보(홈페이지, 유치원앱 등)**	D-20
	참고 사항 • 보호자 예상 질문에 대한 답변 준비(새 학교 증후군 대응 방안, 온종일 돌봄교실 이용 조건 등)		
입학식	입학식	☑ **입학식 일정 및 계획 수립** ☑ **입학식 행사 준비** • 유치원별 특색 있는 입학식 진행 • 안내장 제작 및 발송(알리미 전송) • 입학생 명단 및 출석부 준비 • 명단과 미비 서류, 유예신청자 등 확인 • 현수막 제작 의뢰 ☑ **식전 준비 사항** • 입학 허가서 준비 • 방송시설 및 국민의례 음원 점검 • 입학식 현수막 게시 • 보호자석 준비	D-10

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
입학식	입학식	☑ **입학식 진행** • 식순에 따라 입학식 진행 • 개식사 → 국민의례 → 입학 허가선언 → 담임 소개 → 환영사(원장) → 입학선물 증정 → 폐식사 ☑ **유치원 운영 안내 및 보호자 교육**	D-10
	참고 사항	• 병설유치원의 경우 초등학교 1학년 입학식과 연계하여 진행(권장)	
교육활동보호		☑ **교권보호위원회 구성 및 운영** ☑ **교육활동 보호 교원, 보호자 연수 계획 수립**	

나 연구부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
각종 계획 수립	계획 참고 사항	☑ **전문적 학습공동체 운영계획 수립** ☑ **교원연수 운영계획 수립** ☑ **교원능력개발평가 계획 수립** ☑ **수업 나눔 활성화 및 자율장학 추진 계획 수립** ☑ **교육실습 협력 유치원, 유아 평가, 보호자 교육 등 계획 수립**	D-10

다 정보부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
인터넷 구축 및 정보 보안	☑ **서버구축** • 유치원 홈페이지 관리 • 신규임용자 나이스 발급 • 원내 PC 인터넷 활용 환경조성: 전문 업체 관리 및 필요 사항 요청 • 메신저 시스템 등록: 원내 교직원 간 업무연락망 • 교사 업무용 및 교수용 PC, 노트북 수량 확보 ☑ **강당 내 정보 환경 구축** • 각종 행사 시 정보기기 활용: 빔프로젝터, 무선마우스, 포인터기 ☑ **개인정보보호** • 개인정보 내부 관리 계획 수립 ☑ **정보보안 추진 계획 수립**	D-30
참고 사항	• 교무실 환경 조기 조성으로 (PC와 프린터기 연결) 적기에 업무처리 • 교육지원청에서 발령기관 업무포털 사용 체계 구축	

라 안전부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
안 전	계획 수립	☑ **안전교육 계획 수립** • 유치원 안전교육 및 안전관리(학교 안전사고 예방) 계획 수립 • 아동학대 예방계획 수립 • 보건교육과 연계(예: 성폭력 및 신변안전)	D-30
	환경 구축	☑ **유치원 환경 안전 구축** • 실내외 시설 환경 안전 점검 – 출입문 안전 점검(손끼임방지 시설, 문닫힘 장치) – 외부인 출입 통제 시설(인터폰, 모니터 설치 확인) – 전기 안전 캡, 모서리보호대, 정수기와 수도시설 적정온도 조절 – 계단 난간 안전규격 파악, 계단 미끄럼방지 부착 – 유아용 책상, 의자, 교구장 등 불량제품 파악 – 실내 전기선과 PC 전선 등 노출 위험 요소 파악 – 음수기와 실별 공기청정기 설치 – 실외 놀이터 안전 점검필증 확인 – 화장실 안전시설 확인 (남, 여 칸막이 확인)	
	통학 차량 안전	☑ **통학 차량 안전 환경** • 통학 차량 통학로 점검 – 통학 차량 출입구 방향, 유아 승하차 방향 점검 – 보호자 차량, 교직원 차량 등 주차장 현황 파악 • 운전자와 안전요원 인력 관리 – 통학 차량 운전자와 안전요원 사전연수 – 안전요원: 통학 차량 탑승 유아 명단 제공으로 유아 파악 – 비상 연락망: 통학 차량 이용 유아 비상 연락망 구축(운전자, 안전요원, 담임교사, 보호자) • 차량 이용 유아의 보호자 확인 체제 구축: ○○보호자 명패(목걸이형) 제공 및 착용 안내	
	등·하원 안전	☑ **등·하원 안전 수칙 안내(보호자와 교직원 대상)** • 등원 안내: 등원 시간 이후 인터폰 사용 • 하원 안내: 하원 시간 및 보호자 대기 장소, 귀가 순서(차량 탑승 유아, 학부모 동행 유아, 학원 등)	
	급식 안전	☑ **급식시설 안전 확인(영양교사와 협력체계 구축)** • 유아 신체에 적합한 시설 설치 – 음용수대, 컵 소독기 고정 • 유아용 급·간식 도구 구입(식기류, 숟가락, 젓가락, 포크)	
참고 사항		• 보호자 예상 질문에 대한 답변 준비(새 학교 증후군 대응 방안, 온종일 돌봄교실 이용 조건 등)	

마 방과후부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
방과후 과정	계획 수립	☑ **방과후 과정 운영계획 수립** ☑ **방과후 특성화 프로그램 강사 채용**	D-10
	간식	☑ **간식위탁업체 선정**	
	참고 사항	• 방과후학교 특성화 프로그램 인력은 공개모집 및 절차에 따라 채용 • 방과후 특성화 프로그램을 희망하지 않는 유아의 경우 대안 계획 수립	
	돌봄 교실	☑ **돌봄교실 운영계획 수립**	D-10
	참고 사항	• 돌봄교실은 입학식 첫날부터 정상 운영할 수 있도록 사전 준비 철저 • 추가 돌봄이 꼭 필요한 유아 우선 참여를 원칙으로 하되 참여 대상 기준 조정 가능함(운영위원회 심의)	

바 생활·환경부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
환경 조성	실내 환경	☑ **유치원 실내 청결 및 실내공기질 검사** • 공사 잔여물 제거 – 청소전문업체(교실 및 각 실, 현관, 창틀, 복도바닥, 화장실 등) – 인테리어 공사 후 잔여물 제거 • 실내공기질 검사 – 모든 집기류 등은 친환경 용품 구입 – 공기순환장치·난방기·공기청정기 가동, 창문 개폐 조절 – 실내 공기 정화 식물 비치	D-30
	참고 사항	• 공사 잔여물 제거는 2~3회 실시 • 각 교실 집기류는 공사 잔여물 제거 후 투입	
	실내 환경	☑ **실내 환경 구성** • 교실 및 복도 환경 계획 – 자유 선택 활동 영역 표시 및 달력, 학급판 등 설치 – 복도 환경판 또는 소품 등 설치 • 특별실 환경 구성 – 특별실 소모품 구입 및 설치	D-30
	참고 사항	• 실별 환경 구성 용품은 온라인 확인으로 다양한 제품 정보 활용	
학습 환경 조성		☑ **학습 자료실 구축** • 교수 자료 정리장 설치: 연령별 교수 자료 정리(모빌렉 또는 오픈형 정리장) – 연령별 교수 자료 및 자유 선택 활동 자료, 안전교육 자료, 행사용품 등 정리 • 학습 소모품용 정리장 설치: 오픈형 정리장 – 학습 소모품 정리 상자 구입 및 라벨 작업 – 학습 소모품 종류별 정리 • 학습용 우선 소모품 구입 – 기본 소모품: 가위, 풀, 색연필, 사인펜, 도화지, 스케치북, 색종이, 스티커 종류, 모양 펀치, 테이프 등	D-30
	참고 사항	• 교수 자료 정리장: 모빌렉(고가지만 협소한 공간을 효율적으로 활용할 수 있는 장점이 있음) • 입학식 후 사용할 학습 소모품 목록 작성 후 구입	

가 교무(기획)부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
전입 교원 협의회	공통	☑ **전입 교원 2월 근무 협조 요청 공문 발송** ☑ **학교 안내자료 제작** • 학교 현황, 교실 배치도, 학급편성 자료 안내 ☑ **전입 교원 소개자료 및 업무 희망 조사** • 보직교사와 담임 배정, 업무 분담 희망서 및 비상 연락처 작성 ☑ **개교 준비 현황 및 2월 일정 안내** ☑ **학교 안내 및 둘러보기**	D-20
반 편성	공통	☑ **신입생, 전입생 반 편성** • 학급편성 계획 수립 – 지역, 학교 실정 등 고려	D-20
	공통	☑ **학급편성 공지** • 학교 누리집을 통해 사전 안내 일정에 의거 공지 • 반 편성 게시 자료는 학생의 개인정보가 노출되지 않도록 하며 개별로 식별할 수 있는 정보만 작성	D-10
		참고 사항 • ○○초 사례: 전입생(2~6학년)을 대상으로 개교 2~3일 전 예비소집을 운영하여 담임 소개, 교실 위치 확인, 준비물, 등하굣길 등을 안내하여 개교일에 혼잡하지 않았음	
교육 과정 작성	공통	☑ **학교 교육과정 편성** • 학사일정, 일일 시정표, 교육과정 편제 및 시간 배당, 교과전담 및 특별실 이용 시간표 작성 • 교과 활동, 창의적 체험활동 등 운영계획 수립 • 원격 수업 운영계획 수립	D-20
	공통	☑ **학년 및 학급 교육과정 편성(초등)** • 학년 교육과정 편제 및 연간 진도 및 평가 운영계획 수립	D-10
각종 양식 제작	공통	☑ **각종 양식 제작** • 기초환경조사서(개인정보 관련 유의), 가정통신문, 각종 계획서, 협의록 양식 제작	D-10
교과서 배부	공통	☑ **교과서 검수 및 배부** • 기선정한 검인정 도서의 확인 필요 • 신청 부수 확인 후 학년별 배부	D-10

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
시업식 및 입학식 준비	공통	☑ **시업식 및 입학식 준비** 부록 Ⅳ-2-가-① • 시업식 및 입학식 계획 수립 • 입학식 물품 구입(이름표, 입학식 선물, 현수막, 포토존 등) • 시나리오 및 입학 허가 선언문 작성 • 현수막과 포토존 게시 여부, 국기, 방송시설 등 점검	D-10
각종 규정 준비	공통	☑ **각종 규정 초안 작성** • 학교규칙, 보결수업규정, 인사관리규정, 위임전결규정, 생활규정, 방과후학교소위원회규정, 교무위원회운영규정, 교원능력개발평가관리위원회 규정, 결보강 규정, 출결관리 규정, 학생수상 및 장학금 관리 규정, 여비 지급 규정, 생활위원회 규정 등	D-10
각종 위원회와 장부 정비	공통	☑ **임시 인사자문위원회 규정 제정 및 조직** • 업무 분담 및 학년, 부장교사 배정 ☑ **각종 위원회 조직 검토 및 통합 운영계획 수립** 부록 Ⅳ-2-가-② ☑ **학교 비치 장부 목록 확인 및 준비** 부록 Ⅳ-2-가-③	D-10
부서별 개교 준비 확인	공통	☑ **부서별 개교 준비 사항 확인** • 부서별, 업무별 개교 준비 사항 목록 작성 및 배부 • 점검표 작성 및 부진 항목 보충	D-10
각종 현수막 설치	공통	☑ **현수막, 포토존 제작 및 설치** • 개교 현수막, 전·입학 환영 현수막, 입학식 현수막 등 설치 • 전 입학 환영 포토존 설치, 필요시 입간판 제작	D-10
현장 체험 학습	공통	☑ **현장체험학습 일정 계획 수립** • 전세버스 계약 관련하여 기간 확보 후 현장체험학습 계획 수립 ☑ **학년별 현장체험학습 장소 선정 및 계획 수립** – 학교운영위원회 심의는 추후 실시	D-10
특별 교실 정비	공통	☑ **특별교실 비품과 교구 정리** • 미술실, 음악실, 기술가정실, 과학실, 컴퓨터실, 다목적실, 체육관 등	D-5
보호자 교육	공통	☑ **학부모회 운영 및 보호자 교육계획 수립**	D-10

참고
- 교무학사 업무 매뉴얼
- 충남 참학력 초·중등 교육과정(충청남도 초·중등 교육과정 편성·운영 지침)

나 교육과정부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
교육과정 편성 기반 조성	고	☑ **학교 규정 및 체제 정비** • 학교 규정 정비 – 학교 규칙(총 이수학점 및 졸업에 관한 사항, 학기당 최소 수강학점 규정에 관한 사항 등) – 교육과정 편성·운영 규정(수강신청 절차, 선택과목 개설 및 폐강 기준, 선택과목 변경 절차, 공강 운영 사항 등) • 학점제형 학교 조직·업무 재구조화 – 교육과정전담부서 설치 및 교육과정이수지도팀 구성 계획	D-30
교육과정 편성	고	☑ **학생 선택형 교육과정 편성 운영 계획 수립** • 지역과 학교 특성에 맞는 학교 교육과정 초안 마련 – 교과 영역별 개방정도에 따른 선택과목 편성 계획 – 학기별 학점 배분 계획 – 학교 교육과정 편성·운영 기준안 마련 • 공동교육과정 및 학교밖 교육, 온라인학교 활용 계획	D-30

참고
- 고교학점제 도입·운영 안내서(교육과정평가원)
- 충남 참학력 초·중등 교육과정(충청남도 초·중등 교육과정 편성·운영 지침)

다 연구부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
학습 준비물	공통	☑ **1학기 학습준비물 물품 구입 목록 작성** ☑ **학습준비물 구입 선정위원회 개최 및 구입**	D-20
학력 업무	공통	☑ **학업성적관리위원회 구성 및 규정(안) 작성** • 충청남도교육청 학업 성적관리 시행 지침을 반영한 초안 작성 • 최소 성취수준 보장지도 운영 계획 수립 ☑ 과정 중심 평가 계획 초안 작성 • 원격 수업 중 학생평가 포함 ☑ 학습지원교육(기초학력) 운영계획 수립 • 기초학력 향상을 위한 학생지원, 역량 강화를 위한 교원지원, 온채움 선생님 등 협력 지원 포함	D-5
각종 계획 수립	공통	☑ **전문적 학습공동체 운영계획 수립** ☑ **교원연수 운영계획 수립** ☑ **교원능력개발평가 계획 수립** ☑ **수업 나눔 활성화 및 자율장학 추진계획 수립** ☑ **환경동아리 운영계획 수립**	D-5
독서·인문소양 교육	공통	☑ **독서인문교육 활성화 계획 수립** ☑ **도서관 운영계획 수립** • 사서 도우미 운영 및 도서 확충 계획 수립 • 도서관 운영 비품 주문 및 1차 구입 도서 검수	D-5
	참고 사항 • 사서 도우미는 개교 이후 학교 상황에 맞게 운영 • 도교육청 지원 예산 신청 여부 확인		
영어 교육	초등	☑ **영어 교육활동 계획 수립** • 원어민보조교사 및 영어회화전문강사 활용 계획 ☑ **영어 교육자료 구입 및 영어실 정비**	D-5
동아리 활동	공통	☑ **학년별 동아리 운영계획 수립** • 개교 이후 학생들의 수요 조사에 의거 계획 수립 • 동아리 및 봉사활동 운영계획 수립	개교 이후

참고
- 교무학사 업무 매뉴얼
- 충청남도 학업성적관리 시행지침
- 충남학력 디딤돌 운영계획

라 정보·과학부

1) 정보부

업무명	업무처리 절차 및 내용		시기
나이스 기관 인증서 발급	공통	☑ **기관용 인증서 발급 신청 부록** 부록 Ⅳ-2-다-① • 개교업무학교 기관장(또는 겸임 발령)이 업무관리 시스템으로 신청 – 개교학교 사업자 등록 번호가 필요 – 유·초·중학교는 관할 교육지원청, 고등학교는 도교육청에서 발급	D-60
		☑ **인증서 발급** • 인증 센터 홈페이지(www.epki.go.kr)에서 기관용 인증서 발급	
		☑ **기관 마스터 권한 부여 신청** 부록 Ⅳ-2-다-② • 개교업무학교 기관장(또는 겸임 발령)이 업무관리 시스템으로 신청	
		☑ **권한관리자 지정 및 권한 위임** 부록 Ⅳ-2-다-③ • 나이스(행정실/교무실), K-에듀파인 업무관리(교무부), K-에듀파인 학교회계(행정실) 권한관리자 지정	
	참고 사항 • 교육지원청의 재무과나 행정과, 충남교육청교육과정평가정보원 전산운영부(640-1911)로 연락하여 처리 • 1~2월 중 권한관리자 지정 및 권한 위임을 임시로 부여했다면, 3월 업무분장에 따라 다시 지정(3월~익년 2월)해야 함		
홈페이지 구축	공통	☑ **홈페이지(도메인) 구축요청 공문** 부록 Ⅳ-2-다-④ • 개교 업무 학교 기관장(또는 겸임 발령)이 K-에듀파인으로 신청	D-40
		☑ **홈페이지 검색 등록** • 포털 사이트에 홈페이지를 검색 등록	
		☑ **교육지원청 누리집-학교 현황에 등록 요청** • 교육지원청에 연락하여 홈페이지의 학교 현황에 홈페이지 주소 링크 요청	
		☑ **변경 사항 등록** • 포털 사이트에 교명, 주소, 전화번호 등이 확정되면 검색엔진 업체에 연락하여 수정 요청	
	참고 사항 • 교육지원청의 재무과나 행정과, 도교육청 미래인재과(640-7455)로 연락하여 처리		

업무명	업무처리 절차 및 내용		시기
정보보안 및 개인정보 보호	공통	☑ **정보보안업무 추진 계획 수립** 부록 Ⅳ-2-다-⑤ • 정보보안업무 추진 계획 수립	D-20
		☑ **개인정보 보호 내부 관리 계획 수립** • 내부 관리 계획 및 개인정보 처리 방침 수립	
		☑ **개인정보 관련 각종 대장 비치** • 개인정보(열람, 삭제, 정정) 요구서, 요구에 관한 결과 통지서 • 개인 영상정보(존재 확인, 열람) 청구서 • 개인 영상정보 관리대장 • 개인정보 파일 파기 요청서, 파기 관리대장 • 개인정보 목적 외 이용·제공 대장 등	D-10
		☑ **내 PC 지키미 프로그램, 개인정보 보호 프로그램(Privacy-i) 등 설치** • 교육지원청(재무과나 행정과)에 연락하여 프로그램을 받아 설치	D-20
	참고 사항 • 교육지원청의 재무과나 행정과, 도교육청 미래인재과(640-7455)로 연락하여 처리 • 개인정보 관련 업무는 업무분장이 발표된 이후에 처리해도 됨 • 내 PC 지키미의 설치는 컴퓨터 납품 일정에 따라 달라질 수 있음		
기타 정보 업무	공통	☑ **교육 정보화 지원** • 스마트기기와 디지털교과서, 각종 정보화 도구 활용 활성화 • 소프트웨어 교육 활성화 및 교수 학습 역량 제고를 위한 여건 조성 등	개교 이후
		☑ **저소득층 정보화 지원** • PC 또는 인터넷 통신비 지원	
		☑ **정보공시** • 공시총괄 관리자 선정, 공시항목별 공시 담당자 지정 등	
		☑ **정보화 교육** • 정보화 교육계획 수립, 정보화 교육 교육과정 반영 등	
		☑ **정보화기기 관리** • 전산실 관리 계획, 정보화기기 관리 계획 수립 등	
		☑ **학교 방송 운영** • 학교 방송 운영계획 수립, 방송부원 모집 등	
		☑ **학교통합홈페이지 운영계획 수립** • 학교통합홈페이지 운영계획 수립, 활용 연수 실시 등	
		☑ **소프트웨어(S/W)·인공지능(AI) 교육** • 소프트웨어·인공지능 교육 활성화를 위한 교육계획 수립	

참고

- 교무학사 업무 매뉴얼
- 충청남도교육청 개인정보보호 내부 관리계획

2) 과학부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
과학 실험실 관리	공통	☑ **과학실험실 안전관리 추진계획 수립** • 과학실 전담교원·안전관리 책임자 지정 및 비상 연락망 구축 • 과학실험실 안전점검의 날 운영 • 과학실무원 배정 여부	D-20
		☑ **과학실험실 각종 장부 제작** • 실험실 안전사고 발생 보고서 • 실험과 실습 폐수 관리 확인 점검표 • 실험실 폐수폐시약 관리대장 • 실험실 안전 관리 점검표 • 실험실 화재 예방 일일 점검표 • 과학실험실 사용 일지 등 • 과학실험실 안전수칙·과학실험 안전 매뉴얼·MSDS	
		☑ **과학실험 안전 매뉴얼 검토 및 시안 작업 의뢰** 부록 Ⅳ-2-다-⑥ • 사이언스올 자료 확인(사이언스올 홈페이지 – 사이언스 러닝 – 과학 교육 – 과학실험실 안전자료)하여 과학실 환경 구성 시안 작업을 의뢰	

참고
- 교무학사 업무 매뉴얼
- 과학실험실 안전관리 계획

마 생활·안전부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
생 활	공통	☑ **학교생활규정 제정 및 개정 위원회(안) 구성** ☑ **인성교육 및 생활지도, 학교폭력예방 계획 수립** ☑ **인성교육 계획은 학교운영위원회 심의**	D-5
		참고 사항 • 학교규칙, 학교생활규정 및 생활교육위원회 규정 수립·시행 • 학교폭력전담기구 조기 출범 및 학교운영위원회 심의	
안 전	공통	☑ **학교안전사고 예방계획 수립** • 학교안전사고 예방에 관한 학교계획 수립 • 학교운영위원회 심의 후 시행 ☑ **개교 후 1~2주차 등하굣길 교통지도 계획 수립**	D-5
	초등	☑ **녹색어머니 조직 계획 수립**	D-5
교육 활동 보호	공통	☑ **교권보호위원회 구성 및 운영** ☑ **교육활동 보호 교원, 학생, 보호자 연수 계획 수립**	
학생 자치 활동	공통	☑ **전교학생회와 학급학생회 운영계획 수립** ☑ **학생자치회 규약 수립**	D-5
진로 상담	공통	☑ **상담실 정비** ☑ **진로 상담 교육계획 수립** ☑ **We Class 운영계획 수립**	D-5
환 경	공통	☑ **실내외 환경 구성계획 수립** • 1차 실내 환경 물품 구입 및 구성 ☑ **청소 구역 배정** • 특별실 및 교내외 환경 청소 구역 배정 • 교실 및 특별실 청소 물품 배부	D-5

참고
- 교무학사 업무 매뉴얼
- 교육 활동 보호 기본 계획

바 방과후학교부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
방과후학교	공통	☑ **방과후학교 운영계획 수립** • 방과후학교 프로그램 구성 및 확정 • 위탁강좌 프로그램(외부 강사 또는 위탁업체) 결정 • 방과후학교 프로그램 강사 채용 시 잠복결핵 검사 안내 ☑ **방과후학교 예산 수립** • 교육청 배부 예산 확인 • 목적사업비 및 수익자부담금 구분하여 예산 수립 (강사료, 교재·교구비, 재료비, 수용비 등) ☑ **방과후학교 프로그램 운영 교실 사전 준비** • 방과후학교 운영 교실 확정 • 표찰 준비(각 실 표찰 밑에 게시) • 방과후학교 강사 명찰 준비 ☑ **방과후학교 신청 안내** • 안내문 작성 및 배부(맛보기 강좌, 프로그램 신청서) • 학교 누리집 탑재 ☑ **방과후학교 관련 각종 업무 및 양식** • 강사 출근부, 출석부, 지도계획서 등	개교 이후
		참고 사항 • 개교 후 방과후학교 운영 시작에 대한 문의가 많으므로 학교 누리집에 운영 절차 및 운영 시기에 대한 안내가 필요함 • 방과후학교 운영은 학교운영위원회 심의 사안이므로 최대한 빠른 시일 내로 시작할 수 있도록 사전 준비가 필요함	
돌봄교실	초등	☑ **돌봄교실 운영계획 수립** • 돌봄교실 배부 예산 확인 – 돌봄교실 운영 – 돌봄교실 공간 재구조화 • 목적사업비 및 수익자부담금 구분하여 예산 수립 (강사료, 교재·교구비, 재료비, 간식비, 수용비 등) • 돌봄교실 위탁 또는 돌봄전담사 운영 여부 확인(교육지원청 협조) • 돌봄교실 프로그램 및 계획 수립 • 돌봄교실 강사 선정(위탁 시 위탁업체와 상의) ☑ **돌봄교실 운영 교실 사전 준비** • 표찰 준비(겸용 교실일 경우, 각 실 표찰 밑에 게시) • 돌봄교실 교구와 소모품 구입 • 강사 명찰 준비 ☑ **돌봄교실 교구와 소모품 구입** ☑ **돌봄교실 도서 구입**	D-20

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
돌봄교실	초등	☑ **돌봄교실 운영 안내** • 돌봄교실 운영 안내문, 응급처치 동의서 등 배부 ☑ **돌봄교실 관련 각종 업무 및 양식** • 강사 출근부, 출석부, 지도계획서 등	D-5
		☑ **토요 돌봄교실 운영계획 수립** • 토요 돌봄교실 수요 조사 안내장 배부 • 토요 돌봄교실 프로그램 선정 및 운영계획 수립	D-5
		참고 사항 • 돌봄교실은 개교일부터 정상 운영할 수 있도록 사전 준비 철저 • 돌봄교실은 간식비(수익자부담)를 제외한 모든 예산은 목적사업비로 이루어지며, 프로그램별(오후/저녁)로 운영비가 각각 배부됨 • 돌봄교실 공간 재구조화 예산이 개교 준비 시기에 배부되므로 개교 이전까지 완료	

참고

- 충남 방과후학교 운영 길라잡이
- 충남 방과후학교 운영 기본 계획
- 충남 초등돌봄교실 운영 기본 계획

사 체육부

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
체육 시설과 기자재 관리	공통	☑ **체육 시설 및 체육 기자재 확보** • 교육과정 운영에 필요한 체육 교구 확보 • 스포츠클럽과 방과후학교 스포츠 프로그램과 연계한 교구 구입	D-30
		☑ **체육 시설과 기자재 관리 계획 수립** 부록 Ⅳ-2-바-① • 체육 시설 관리 계획, 체육 기자재 관리 계획, 정기 점검과 수시 점검 등 안전 점검 계획 등 포함	D-20
	참고 사항 • 시설과 기자재의 확보를 위한 물품 선정 등은 개교 업무임. • 계획 수립 등 실제 체육 관련 업무는 3월 업무분장이 끝나면 담당자가 처리해도 됨		
그 밖의 체육 업무	공통	☑ **체육 교육** • 연간 체육 교육계획 수립, 학교체육소위원회 조직 등 • 충남형 생존수영 운영계획 수립 – 전교생을 대상으로 실기 6시간, 이론 4시간	
		☑ **'쉼'이 있는 행복놀이** • 행복놀이 여건 조성, 놀이 경험 제공 등	
		☑ **학생건강체력평가제(PAPS)** • 학생건강체력평가제 계획 수립·실시 등	
		☑ **교내체육대회(운동회)** • 학교 교육과정에 따른 교내체육대회 계획 및 대회 실시 등	
		☑ **학교스포츠클럽(토요스포츠클럽) 운영** • 학교스포츠클럽(토요스포츠클럽) 계획 수립, 운영 및 관리 등	
		☑ **청소년단체 운영** • 청소년단체 조직 및 활동 계획, 운영 등	
		☑ **학교운동부 운영 관리** • 학교운동부 운영계획 수립, 운영 및 관리, 대회 출전 등	
		☑ **수련 활동** • 학생 수련활동 기본 계획 수립, 운영 등	

참고 • 교무학사 업무 매뉴얼

아 보건교육

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
학생 건강 관리	공통	☑ **학생 건강증진 계획 수립** • 학교보건사업 추진을 위한 자료 수집(인적, 건강 수준, 환경, 자원) • 학생 건강실태 조사 및 분석 – 신입생, 재학생 건강기초조사를 통한 요보호자 파악 및 관리 방안 • 요보호 학생 건강관리 계획 수립 – 건강실태조사를 통한 관리 계획 수립(소아당뇨 학생에 대한 지원·관리체계 등) – 건강 문제로 인한 교육활동 제한 학생에 대한 정보공유와 개인정보 보호 철저 • 건강검사 실시 계획 부록 Ⅳ-2-사-① – 건강검사 소요 예산 확보 – 건강검진 기관(병원) 선정을 위한 기초 자료 수집 – 건강검사 항목 실시 계획 수립(신체 발달, 건강조사, 건강검진 등)	D-10
		☑ **응급환자관리 계획 수립** 부록 Ⅳ-2-바-② • 응급상황 발생 시 신속한 처리를 위한 학교 주변 의료기관 파악 • 응급처치 동의서 및 보호자 비상 연락망 구축 • 학교 내 응급상황 관리체계 강화를 위한 대책반 구성 • 보건교사 미배치 학교의 경우 학년별 응급처치 대응 매뉴얼 비치	D-10
		☑ **학교 감염병 예방 및 관리** 부록 Ⅳ-2-사-③ • 학교 내 감염병 예방 및 관리 계획 수립 • 취학아동 예방접종 확인 사업 안내문 작성 및 예비소집일 배부 • 방역소독 계획 수립(개교 전 학교 전체 소독) • 교직원 1개월 이내 결핵 검진(잠복 결핵 포함) 대상자 파악(신규, 복직자)과 관련 예산 확보 확인 • 학생 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼 비치 및 학급 방역물품 비치	D-10
	중등	☑ **건강기록부 전산 확인** • 학생 개인정보 및 학년 반 정보 확인으로 동명이인 학생에 대한 관리 철저 ☑ **별도 검사 항목 검사 계획 수립** • 결핵 검진(고2, 3) 등 별도 검사 계획 수립	
	병설 유치원	☑ **영유아건강검진 대상 학생** • 유아 출생 연월일로 건강검진 시기 알아보고 검진 안내하기	

참고 • 학생 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼(초·중·고·특수)

업무명		업무처리 절차 및 내용	시기
보건 교육	공통	☑ **보건교육 계획** • 중등학교 선택과목 채택·운영, 선택과목으로 운영하지 않는 초·중·고등학교에서는 1개 이상의 학년을 대상으로 연간 17차시 기준의 정기적인 보건교육 시간 운영계획 수립 • 보건교육 교과서와 교구 구입 계획 수립 • 보건교사 수업 중 학생건강관리 및 응급상황에 대한 대응체계 구축	D-10
		☑ **성희롱, 성매매, 성폭력 예방** 부록 Ⅳ-2-사-④ • 성희롱, 성매매, 성폭력 예방계획 수립 • 성희롱 고충상담원 지정-남성과 여성 직원이 반드시 각 1인 이상 포함 • 성고충 전담 창구 설치-해당실 표지판 부착 - 성고충 신청서, 성고충 접수 및 처리 대장 비치 • 성희롱 고충 심의 위원회 구성 • 예방교육통합관리 시스템 기관등록 여부 확인 부록 Ⅳ-2-사-⑤ - 여성가족부 권익증진국 권익기반과로 기관명과 등록 사유를 기재하여 기관등록 요청 ☑ **성교육 계획 수립** • 성교육 업무 담당 교사 의무 지정 • 성교육 및 성폭력 예방 교육계획을 학교 교육 계획에 반드시 포함 • 국가 수준의 「학교 성교육 표준안」을 적용하여 학년별 성교육 15차시 계획 수립(성폭력예방교육 3차시 포함) • 교직원과 보호자 대상 성폭력예방교육, 성희롱 방지 조치, 성매매 예방 교육 계획 수립(총 3시간 의무 시행) • 성교육 예산 확보 ☑ **양성평등 교육 계획** • 양성 평등한 학교의 조직문화, 학교 물리적 환경 지표 확인 • 양성평등 교육 계획 수립	D-10
		☑ **마약류 흡연·음주 포함 약물 오·남용 예방교육** • 학교 전체에 대한 금연 구역 지정·운영- 금연 시설물 안내판 부착 • 교육계획 수립 시 7대 안전교육 내용 체계(안) 적극 반영 - 약물 오·남용 예방교육에 대한 학교 자체 예산 수립 • 학교흡연예방사업 예산 지원 확보 계획(기본형 및 심화형)	D-10
		☑ **학교 심폐소생술 등 응급처치 교육** • 최소 1개 학년 이상의 모든 학생을 대상으로 실습을 포함한 교육 시행 • 모든 교직원을 대상으로 한 심폐소생술 교육계획 수립(실습 2시간을 포함하여 최소 3시간 이상 실시)	D-10

참고

- 학교 내 성 관련 사안 발생 시 업무처리 매뉴얼
- 교육부 양성평등 교육 매뉴얼: '우리 학교 양성평등은 어떤가요?'
- 학교 성교육 표준안

가 교무부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
전입 교원 협의회 및 안내	☑ **전입 교원 2월 근무 협조 요청 공문 발송** ☑ **학교 안내자료 제작** • 학교 현황, 교실 배치도, 학급편성 자료 안내 ☑ **전입 교원 소개자료 및 업무 희망 조사** • 보직교사와 담임 배정, 업무 분담 희망서 및 비상 연락처 작성 ☑ **학년 및 업무분장, 부장교사 임명** ☑ **지원 인력 배치** • 실무원 및 사회복무요원 관리 및 배치 ☑ **개교 준비 현황 및 2월 일정 안내**	D-20
학교 교육 계획 수립	☑ **학교교육과정운영계획 수립** • 학교교육과정임시위원회 구성 • 학교 현황과 조직에 따른 계획 수립 • 학교교육과정 시안 작성 및 심의	D-20
	☑ **학생 현황 조사 및 학급편성** • 나이스 학생 학적 반영 및 처리 ☑ **학교 현황 작성** • 일반 현황, 실별 현황, 교실 배치도 • 선정 배치 및 재배치 학생 명단 확인	D-10
	참고 사항 • 개교 이후 인사발령 및 학교 현황 변화에 따라 수정사항은 학교운영위원회 심의 후 확정	
각종 규정	☑ **각종 규정 초안 작성** • 학교규칙, 보결규정, 인사관리규정, 위임전결규정, 생활규정, 방과후학교소위원회 규정, 교무위원회운영규정, 교원능력개발평가관리위원회 규정, 결보강 규정, 출결 관리 규정, 학생수상 및 장학금 관리 규정, 학생 여비 지급 규정 등	D-20
위원회와 장부 정비	☑ **각종 위원회 조직 검토 및 통합 운영계획 수립** 부록 Ⅳ-2-가-② ☑ **학교 비치 장부 목록 확인 및 준비** 부록 Ⅳ-2-가-③	D-10
각종 양식 제작	☑ **각종 양식 제작** • 기초환경조사서(개인정보 관련 유의), 가정통신문, 각종 계획서, 협의록 양식 제작	D-10
보호자 교육	☑ **학부모회 운영 및 보호자 교육계획 수립** ☑ **학교 설명회** • 교육과정(안) 안내(학생 및 학급편성 현황, 과정별 교육과정 및 중점 내용) • 교직원과 담임 현황 안내, 학교 안내사항 전달	D-20
교육 활동 보호	☑ **교권보호위원회 구성 및 운영** ☑ **교육활동 보호 교원, 보호자 연수 계획 수립**	

나 교육과정부(유·초·중·고·전)

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
교육과정 수립	☑ **유치원** • 유아 장애유형 및 특성 파악하여 교육과정 계획 수립(유아 발달 현황 조사 및 진단) • 인근 유치원과의 통합교육 운영계획 수립 • 영유아 건강검진 관련 안내 ☑ **공통** • 학년별 연간교육계획 수립 및 학급 교육과정 수립 • 창의적 체험활동 계획 수립 및 현장학습 체험장소 선정 • 학급별 시간표 작성 및 교과 과목 선정	
개별화 교육계획	☑ **개별화 교육계획** 부록 Ⅳ-3-다-① • 개별화교육 작성 방법 연수 • 개별화교육계획 수립을 위한 기초정보 및 요구조사서 작성 • 개별화교육지원팀 협의록 작성 및 교육계획 수립 • 이전학교 개별화교육계획 자료 나이스 송부 확인	
초·중고·전 업무	☑ **초등학교** • 장애인식 개선 교육 수립 • 문화예술 대·내외 공연 업무 추진 • 통합교육 계획 수립 ☑ **중학교** • 자유학기제 관련 교육과정 운영 • 통합교육 계획 수립 ☑ **고등학교** • 기능경진대회 준비 • 대내외 진로직업행사 추진 • 고교학점제 관련 업무 추진 ☑ **전공과** • 희망 일자리 추진 • 현장실습 및 추수 지도 • 관계 기관 연계 장애 학생 취업 지원 사업 추진 • 취업업체 발굴 및 취업 연계	D-30
	참고 사항 • 과정별 협의를 통한 교과목 선정 및 시간표 작성 • 과정별 특색을 반영한 교육계획 수립	

다 연구부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
각종 연구 업무	☑ **수업 나눔 활성화 및 행복나눔 장학 추진 계획 수립** ☑ **교원 연수(특수분야, 국내외 자율연수) 준비** ☑ **학교혁신업무(전문적 학습공동체, 학교업무최적화, 민주적 협의 문화 등)** ☑ **교원능력개발평가 계획 수립** ☑ **학교 자체평가 준비** ☑ **교육 현장실습 관련 업무: 수요 조사**	D-30

라 학생·생활 안전부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
학생 안전	☑ **학생안전부** • 영상정보 처리기기 설치 운영계획(CCTV) 부록 Ⅳ-3-다-② • 교내 주간 순찰조 운영 및 교출 학생 발생 시 비상 탐색 계획 수립 • 학교 안전 교육계획 수립 • 아동 실종 예방을 위한 지문 등록 ☑ **학생생활부** • 학교폭력전담기구 구성 및 위원선출(학운위 심의) • 학생 인성교육 계획 수립(학운위 심의) • 학생 상담활동지원단 구성 및 보호자 상담 주간 운영 • 관심학생 지도계획 수립 • 학교생활규정(안) 제정 및 개정 위원회 구성 • 학교폭력전담기구 규정(안) 및 학교폭력예방 계획 수립 • 전교 학생자치회와 학급학생회 운영계획 수립 • Wee클래스 운영계획 수립	D-30
통 학	☑ **통학 차량 노선표 및 운영 계획 수립** • 통학차량 지도원 배치 ☑ **통학 편의 지원 대상자 선정 및 통학 편의 지원비 지급 계획 수립**	D-40
	참고 사항 • 도로교통법 제2조 제23호 요건 충족 사전 파악 • 통학버스 특장차 관련 내용 파악 • 통학버스 노선 관련 보호자 민원 지속적으로 파악	

마 방과후학교부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
방과후 학교 운영	☑ **방과후학교 운영계획 수립** • 방과후학교 수요 조사 및 강좌 개설 • 교육청 배부 예산 확인: 강사료, 교재·교구비, 재료비, 수용비 등 • 방과후학교 위탁 강사 프로그램(외부 강사) 운영 여부 결정 • 방과후학교 프로그램 시간표 구성 및 위탁 운영 여부 결정 • 방과후학교 외부기관 위탁 및 개인 위탁 운영에 따른 기관과 개인 모집 ☑ **방과후학교 운영 사전 준비** • 방과후학교 신청서 배부 • 방과후학교 운영 강좌 확정 및 반편성 확인 • 방과후 운영 물품 및 교재·교구 구입 ☑ **돌봄교실 운영** • 돌봄교실 수요 조사와 기준에 맞게 선발 • 하교 전 유·초등학생의 돌봄 학생 및 반편성 확인 • 하교 후 돌봄교실 대상자 관련 신청서 배부 • 돌봄교실 운영에 필요한 교재·교구와 학습준비물 구입	D-60

바 체육부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
스포츠강사 및 각종 대회	☑ **스포츠강사 신청 및 배정** ☑ **체육교과 교육과정 운영 준비(생존수영, 체육대회 등)** ☑ **장애 학생 체육대회(전국·충남 장애학생 체육대회)준비** ☑ **교내 체육대회** • 교육과정에 따른 교내 체육대회 계획 및 대회 실시	D-50
체육 시설, 기자재 관리 및 교육	☑ **체육 시설 및 체육 기자재 확보** • 교육과정 운영에 필요한 체육 교구 확보 • 장애학생의 흥미를 고려한 교구 구입 ☑ **체육 시설과 기자재 관리 계획 수립** 부록 Ⅳ-2-바-① • 체육 시설 관리 계획, 체육 기자재 관리 계획, 정기 점검과 수시 점검 등 안전 점검 계획 등 포함 ☑ **장애학생 건강체력평가제(D-PAPS)** • 장애학생 건강체력평가제 계획 수립·실시	D-30

사 정보부

업무명	업무처리 절차 및 내용	시기
나이스 기관 인증서 발급	☑ **기관용 인증서 발급 신청** 부록 Ⅳ-2-다-① • 개교업무학교 기관장(또는 겸임 발령)이 업무관리 시스템으로 신청 – 개교학교 사업자 등록 번호가 필요 – 도교육청에서 발급 ☑ **인증서 발급** • 인증 센터 홈페이지(www.epki.go.kr)에서 기관용 인증서 발급 ☑ **기관 마스터 권한 부여 신청** 부록 Ⅳ-2-다-② • 개교업무학교 기관장(또는 겸임 발령)이 업무관리 시스템으로 신청 ☑ **권한관리자 지정 및 권한 위임** 부록 Ⅳ-2-다-③ • 나이스(행정실/교무실), K-에듀파인 업무관리(교무실), K-에듀파인 학교회계(행정실) 권한관리자 지정	D-60
홈페이지 구축	☑ **홈페이지(도메인) 구축요청 공문** 부록 Ⅳ-2-다-④ • 개교 업무 학교 기관장(또는 겸임 발령)이 K-에듀파인으로 신청 ☑ **홈페이지 검색 등록** • 포털 사이트에 누리집 검색 등록 ☑ **교육지원청 누리집-학교 현황에 등록 요청** • 교육지원청에 연락하여 누리집의 학교 현황에 홈페이지 주소 링크 요청 ☑ **변경 사항 등록** • 포털 사이트에 교명, 주소, 전화번호 등이 확정되면 검색엔진 업체에 연락하여 수정 요청 참고 사항 • 교육지원청의 재무과나 행정과, 도교육청의 미래인재과(640-7455)로 연락하여 처리	D-40
정보보안 및 개인정보 보호	☑ **정보보안업무 추진 계획 수립** 부록 Ⅳ-2-다-⑤ • 정보보안업무 추진 계획 수립 ☑ **개인정보 관련 각종 대장 비치** • 개인정보(열람, 삭제, 정정) 요구서, 요구에 관한 결과 통지서 • 개인 영상정보(존재 확인, 열람) 청구서 • 개인 영상정보 관리대장 • 개인정보 파일 파기 요청서, 파기 관리대장 • 개인정보 목적 외 이용·제공 대장 등	D-40
정보화 지원	☑ **교육 정보화 지원** • 스마트기기와 디지털교과서, 각종 정보화 도구 활용 활성화 • 소프트웨어 교육 활성화 및 교수 학습 역량 제고를 위한 여건 조성 등 ☑ **정보화기기 관리** • 전산실 관리 계획, 정보화기기 관리 계획 수립 등	D-20

V

개교식

1. 개교식 추진 개요 | 117
2. 주요 행사별 준비 | 118

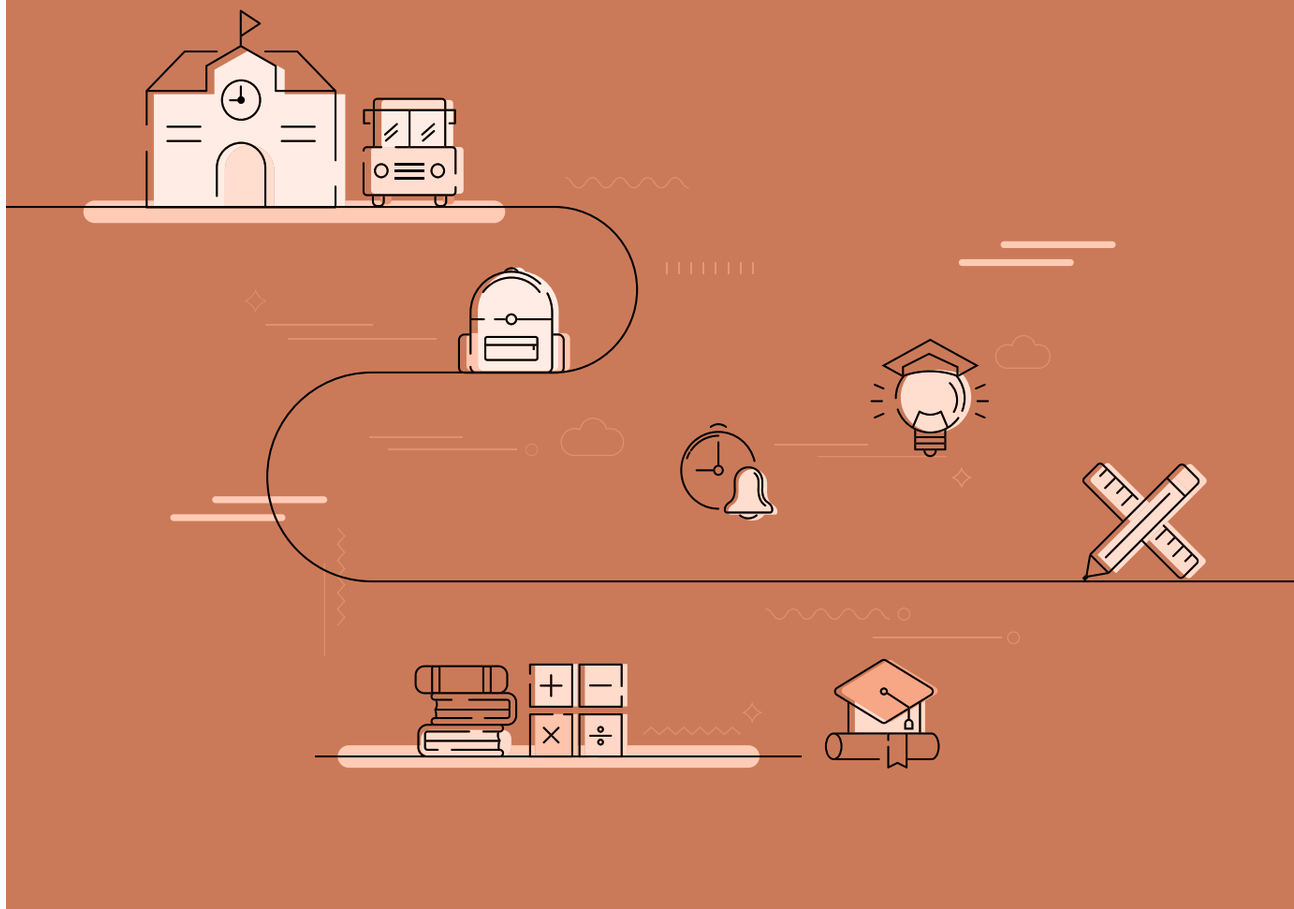

V
개교식

충청남도 신설학교 교무학사
개교 업무편람

1. 개교식 추진 개요

업무 추진 순		주요 내용 및 점검 사항
D-30	**사전 협의**	☑ 교무회의를 통해 학교의 특성에 맞는 개교식 구상 협의 ☑ 학생회 의견수렴
	개교식의 컨셉 결정	☑ 학교급별 학생의 대상에 맞는 개교식 방향 설정 ☑ 신설, 이전, 통합 개교 등 성격에 따라 다르게 구상할 수 있음 ☑ 보호자와 지역주민 등 교육공동체 의견을 수렴하여 결정
	개교식 계획 수립	☑ 일정: 충남교육청의 참석 내빈 일정과 조율 ☑ 계획: 일정, 초청 범위, 행사 규모와 방식, 소요 물품, 예산지출 계획 역할 배정 등 ☑ 식전 행사 준비: 지나친 연습 위주 프로그램 지양
D-15	**물품 제작 구입 의뢰**	☑ 행사 소요 물품 제작 의뢰 및 구입·품의 ☑ 물품: 감사패, 공로패, 기념품 등 ☑ 다과 물품: 다과 차림의 규모와 인원 결정
	초청장 제작 의뢰 발송	☑ 초청장 디자인 구상 후 삽입할 사진 그림 등 결정 ☑ 포함 내용: 개교식 일정 안내, 모시는 글, 행사 일정, 경과보고 학교 약도 등 ☑ 초청대상자에게 초청장 발송(최소 1~2주 전)
D-2	**주(부)행사장 준비**	☑ 개교식장(체육관, 다목적실 등) ☑ 테이프 절단식장(들어오는 입구로 하되 시각적 관점 고려) ☑ 오찬장(식당 등), 제막식장(교훈 탑, 교비 등), 기념식수장
	내빈 참석 확인	☑ 유선상으로 참석 여부 안내 확인
	예행연습	☑ 식전 행사 및 주 행사와 식후 행사로의 진행 연결 점검 ☑ 초청자들의 행사 진행에 따른 동선 확인(학교 안내 시) ☑ 사회자와 각 역할 담당자와의 상호 점검
D-1	**식장 준비**	☑ 개교식장, 커팅식장, 제막식장, 주요 내빈실, 다과회실
	물품 확인	☑ 행사 물품 최종 확인
D-day	**내빈 안내**	☑ 귀빈실 내빈과 일반 내빈 별도 안내 여부 및 동선 관리
	식전 행사	☑ 귀빈 관람 또는 비관람 여부 및 귀빈 입장 시점 확인
	본 행사	☑ 국민의례, 경과보고, 감사패(공로패) 수여, 학교장 식사, 교육감 치사, 축사, 교가 제창 등으로 하되, 학교별 특색 살려 진행
	식후 행사	☑ 시설 관람, 제막식, 기념식수, 다과회 등

2. 주요 행사별 준비

순	추진업무명	세부 추진 내용	비고
1	**식전 행사**	☑ **공연의 주관자와 프로그램의 내용 선정의** • 학생 공연 및 행사 – 학교급별 학생의 수준에 맞는 공연, 학생 주관의 내용으로 구성 – 학교의 특색교육이나 교육목표 구현이 가능한 공연 내용 – 무리한 연습 시간을 요하는 공연보다는 교육과정 연계 공연 선택 – 신설학교로서 공연이 어려운 경우 인근학교의 축하공연도 좋음 • 외부인 축하공연과 행사 – 학교의 교육목표와 지향점이 일치하는 공연단 – 마을교육 공동체 또는 지역사회의 축하공연 • 교육공동체 공연 또는 축하 행사 – 개교를 축하하고 학생을 환영하는 의미 ☑ **반드시 공연해야 한다는 취지보다는, 학교의 특성을 살려 창의적이며 축하 분위기를 고조시킬 수 있도록 다양한 측면에서 운영** ☑ **공연 시점: 주요 내빈이 착석한 후, 또는 식전 대기시간**	
2	**개교식 운영**	☑ **일반적인 개교식** 부록 V-2-①, 부록 V-2-②, 부록 V-2-③, 부록 V-2-④ • 국민의례, 경과보고, 감사패 수여, 교기 전수, 학교장 식사, 교육감 축하 인사, 축사, 교가 제창 등 ☑ **좌석 배치: 권위나 지나친 의전보다는 함께 축하하는 좌석 배치** ☑ **사회자: 교감** ☑ **특색 있는 행사 운영의 예** • 경과보고: 다큐멘터리 형식의 신축 과정 보고 • 감사의 글 낭독: 학생, 보호자 등	
3	**초청장 제작 대상 선정**	☑ **학교급별 특성과 학교의 교육목표나 교육활동을 반영한 디자인** • 삽입할 사진: 학교 전경, 학교 상징물, 기념비 학생 교육활동 등 • 삽입할 그림: 교화, 교목, 계절 상징 등 • 면 수 2단 4쪽, 1단 2쪽 등 크기에 따른 고려 • 포함할 내용: 개교식 일정, 인사말, 행사 일정, 경과보고, 오시는 길 등 ☑ **초청대상자 선정** • 교육계, 외부인사, 동문회, 지역사회와 관계기관의 범위 선정하되, 인근 마을의 주요 인사를 포함하여 지역과 함께 하는 축제의 장으로 운영 • 주요 인사: 초청장 발송 전 유선으로 일정 안내	
4	**패 제작 및 대상 선정**	☑ **감사패 또는 공로패 결정** ☑ **대상: 관계자의 의견을 수렴하여 합리적으로 결정** • 동문회, 지역유공자 선정 시 대상자 간 갈등의 소지가 있으므로, 가능한 많은 대상으로부터 의견을 수렴하여 결정하되, 정확한 기준으로 객관성과 공정성 유지 ☑ **인원: 행사의 매끄러운 진행을 위해 과다한 인원 지양**	

순	추진업무명	세부 추진 내용	비고
5	**커팅식**	☑ **장소** • 교문, 건물 입구, 건물 중정, 현관 등 고려 ☑ **진행: 교감** ☑ **준비물: 오색테이프, 테이프 고정대, 가위, 장갑** ☑ **커팅 시점: 개교식 전 개교식 후 등 위치에 따라 다르게 결정** ☑ **커팅 참석자: 교육감, 학교장, 주요 내빈, 학생대표, 지역 인사 등**	
6	**기념식수**	☑ **식재의 선정** • 교목 또는 주변의 식재와 잘 어울리는 식재로 선정하되, 뿌리 활착이 좋은 나무로 선정 ☑ **식수의 위치** • 개교를 상징할 수 있는 위치로 선정하되, 남향으로 용수공급이 쉽고 많은 사람의 눈이 잘 들어올 수 있는 위치로 선정 ☑ **식수 시기** • 개교식 후 행사로 진행하되, 개교식 직후로 실시하여 많은 축하 참관자 유도 ☑ **식수 방법** • 미리 식수할 장소에 식재 및 구덩이와 복토용 흙 준비 • 준비물: 삽, 흰 장갑 • 식수의 주체 (예-교육감 기념식수)에 따라 복토의 순서와 방법이 달라지나, 주체없이 하는 경우(개교기념 식수)는 주요 내빈이 한 삽씩 복토	
7	**제막식**	☑ **교비 또는 기념비 교훈비(교훈 탑) 등** ☑ **흰색 천으로 덮어 오색 천 실로 잡아당길 수 있도록 준비하되, 예행연습 필요** ☑ **시기: 개교식 직후로 실시하여 많은 축하 참관자 유도** ☑ **참가자: 교육감, 학교장, 주요 내빈, 학생대표, 지역 인사 등** ☑ **진행: 교감** ☑ **준비물: 방송시설, 흰 장갑, 사진 촬영**	
8	**타임캡슐 상징물**	☑ **개교기념물 또는 상징물** ☑ **학생들의 글, 편지 등** ☑ **학생 공동작품 등**	
9	**시설 관람**	☑ **타 행사와의 진행 순서에 대한 면밀한 검토 필요: 동선 고려** ☑ **안내 및 진행: 학교장** ☑ **안내 동선 계획 수립 후 진행** • 가장 짧으면서도 다른 행사와 연계될 수 있는 동선 미리 확보 ☑ **각 안내 시설물별 소개자료 작성 활용** • (예) 도서실: 확보 도서량, 동시 가용인원수, 특색 등	

순	추진업무명	세부 추진 내용	비고
10	다과회	☑ **좌석 배치 고려** • 주요 내빈에 대한 좌석은 지정석 등으로 중앙에 배치 ☑ **진행: 교장 또는 교감** ☑ **주요 행사: 케이크 절단, 음료 건배사 등** ☑ **다과회장 운영** • **음식 준비 등을 위한 인원 확보 필요** • **음식 위생 및 청결에 만전**	

참고

- 국민의례 규정 대통령 훈령 368호 (2017.8.10. 일부개정)
- 교육 행사 및 의전 실무 편람
- 신설학교 개교 행정업무 편람

부록 자료 목록

연번	구분명	자료명	관련(쪽)
1	Ⅰ-2-나-①	물품선정위원회 구성 및 개최 계획	15
2	Ⅰ-2-나-②	신설학교 안내(예)_(공통)	16
3	Ⅰ-5-①	개교준비위원회 개최 공문(예)_(공통)	27
4	Ⅰ-5-②	개교준비위원회 개최 결과 보고 공문(예)_(공통)	27
5	Ⅱ-1-나-①	교실 영문 표기(예)_(공통)	32
6	Ⅱ-1-나-②	공통 비품(예)_(공통)	32
7	Ⅱ-1-나-③	건물 청소용품(예)_(공통)	34
8	Ⅱ-1-다-①	어린이 보호구역 지정신청 공문(예)_(유, 초등)	35
9	Ⅱ-1-다-②	도로 점용허가 신청서(양식)_(공통)	35
10	Ⅱ-1-다-③	도로명 주소 건물번호 부여 신청 공문(예)_(공통)	35
11	Ⅱ-1-라-①	교육 비전(예)_(공통)	37
12	Ⅱ-1-라-②	교표(예)_(공통)	37
13	Ⅱ-1-마-①	기간제 계약직 교원 채용 계획 공문(예)_(공통)	38
14	Ⅱ-1-마-②	성범죄 및 아동학대 범죄 조회 공문(예)_(공통)	38
15	Ⅱ-1-마-③	계약직교원 채용 제청 및 보고 공문(예)_(공통)	38
16	Ⅱ-2-①	개원 업무 추진 계획(예)_(유)	40
17	Ⅱ-2-②	신입생 모집 계획(예)_(유)	40
18	Ⅱ-2-③	교육과정 설명회 계획서(예)_(유)	42
19	Ⅱ-2-④	입학 관련 각종 신청서 및 동의서(예)_(유)	42
20	Ⅱ-2-⑤	입학식 계획 및 안내장(예)_(유)	42
21	Ⅱ-3-①	최근 신설학교 현황_(공통)	43
22	Ⅱ-3-②	전입학 안내문(예)_(초등)	46
23	Ⅱ-3-③	전입학 원서(양식)_(초등)	46
24	Ⅱ-3-④	입주 확인 각서(양식)_(초등)	46
25	Ⅱ-4-①	특수학교 개교업무 추진 계획(예)_(특수)	48
26	Ⅱ-4-②	개교업무 전담팀 협의록(예)_(특수)	48
27	Ⅱ-4-③	선진학교 및 신설학교 방문 계획 및 보고서(예)_(특수)	48
28	Ⅱ-4-④	학생 명단(양식)_(특수)	49
29	Ⅱ-4-⑤	전공과 입학전형 자료(예)_(특수)	49
30	Ⅱ-4-⑥	통학노선 임시 운행 공문(예)_(특수)	49
31	Ⅱ-4-⑦	교육공무직 인력배치 요구 계획(예)_(특수)	50
32	Ⅱ-4-⑧	기자재선정위원회 협의 결과(예)_(특수)	50
33	Ⅱ-4-⑨	기자재선정 기초자료(양식)_(특수)	50
34	Ⅱ-4-⑩	학생 물품 관련 관리전환 공문(예)_(특수)	50
35	Ⅱ-4-⑪	학교설명회 가정통신문(예)_(특수)	50
36	Ⅱ-4-⑫	학교설명회 자료(예)_(특수)	50
37	Ⅱ-4-⑬	학생 현황 파악 및 학급 편성(예)_(특수)	51
38	Ⅱ-5-다-①	불용 결정 심의회의 공문(예)_(공통)	54
39	Ⅱ-5-다-②	신설학급 안전점검 및 구축 방안(양식)_(공통)	55
40	Ⅱ-5-다-③	이전 신설학교 학교 이사 계획(예)_(공통)	55
41	Ⅲ-1-가-①	교장실 비품 목록(예)_(공통)	59

부록 자료 목록

연번	구분명	자료명	관련(쪽)
42	Ⅲ-1-나-①	교무실 비품 목록(예)_(공통)	60
43	Ⅲ-1-마-①	특별실 조정 요청 공문(예)_(초등)	63
44	Ⅲ-1-바-①	컴퓨터 제품사양(규격)서(예)_(초등)	64
45	Ⅲ-1-사-①	하자보수 요청 공문(예)_(초등)	65
46	Ⅲ-1-타-①	보건실 및 보건교육실 구축 계획(예)_(공통)	70
47	Ⅲ-1-타-②	보건실 기구목록(예)_(공통)	70
48	Ⅲ-1-타-③	보건실 의약품 목록(예)_(공통)	70
49	Ⅲ-1-파-①	특수학급 환경구성 계획(예)_(특수)	71
50	Ⅲ-1-파-②	장애인 편의시설 설치 기준 및 안전관리 방안(예)_(특수)	71
51	Ⅲ-2-가-①	유치원 보통교실 비품 구입 목록(예)_(유)	73
52	Ⅲ-2-가-②	유치원 자유놀이 교구 및 놀잇감 구입 목록(예)_(유)	73
53	Ⅲ-2-가-③	유치원 자유놀이 환경구성(예)_(유)	74
54	Ⅲ-2-나-①	유치원 누리과정 도서구입 목록(예)_(유)	75
55	Ⅲ-2-나-②	유치원 도서선정위원회 관련 자료(예)_(유)	75
56	Ⅲ-2-다-①	유치원 자료실 관리 계획(예)_(유)	76
57	Ⅲ-2-다-②	유치원 3월 학습준비물 목록(예)_(유)	77
58	Ⅳ-2-가-①	입학식추진계획(예)_(중등)	97
59	Ⅳ-2-가-②	각종위원회 통합운영 관련 지침_(공통)	97
60	Ⅳ-2-가-③	학교 비치 장부 목록_(공통)	97
61	Ⅳ-2-다-①	기관용 인증서 발급 신청 공문(예)_(초등)	100
62	Ⅳ-2-다-②	기관마스터 생성 권한 신청서 공문(예)_(초등)	100
63	Ⅳ-2-다-③	권한관리자 지정 및 권한 위임 공문(예)_(초등)	100
64	Ⅳ-2-다-④	홈페이지 구축 요청 공문(예)_(초등)	100
65	Ⅳ-2-다-⑤	정보보안 추진 주요 내용_(초등)	101
66	Ⅳ-2-다-⑥	과학실험실 안전 관련 게시물 게시 요령_(초등)	102
67	Ⅳ-2-바-①	체육 시설 및 기자재 관리(양식)_(초등)	106
68	Ⅳ-2-사-①	건강검사 실시 계획(예)_(공통)	107
69	Ⅳ-2-사-②	응급의료관리 매뉴얼(예)_(공통)	107
70	Ⅳ-2-사-③	학교 방역물품 비축 모형_(공통)	107
71	Ⅳ-2-사-④	성희롱, 성폭력, 성매매 예방교육 자료_(공통)	108
72	Ⅳ-2-사-⑤	여성가족부 기관등록 공문(예)_(공통)	108
73	Ⅳ-3-다-①	개별화교육계획 양식(양식)_(특수)	110
74	Ⅳ-3-다-②	CCTV 운용 및 설치에 관한 규정(예)_(공통)	111
75	Ⅴ-2-①	유치원 개원식 업무 추진 계획_(유)	118
76	Ⅴ-2-②	초등학교 개교식 업무 추진 계획_(초등)	118
77	Ⅴ-2-③	중등 개교식 업무 추진 계획(예)_(중등)	118
78	Ⅴ-2-④	특수학교 개교식 업무 추진 계획_(특수)	118

만든 사람들

기획

·교 육 국 국 장 이병도
·교육과정과 과 장 신경희
·교육과정과 장학관 김태길
·교육과정과 장학사 김동렬

제작·편집

·서정문 정 산 중 학 교 교장
·이영선 천안능수초등학교 교장
·조시연 신 관 초 등 학 교 교감
·고미현 탕정미래병설유치원 원감
·이수진 음암초병설유치원 교사
·송경미 성 동 초 등 학 교 교사
·노정민 서산서남초등학교 교사
·강기철 신 방 초 등 학 교 교사
·한지석 남 포 초 등 학 교 교사
·김정희 이 순 신 고 등 학 교 교사
·이현정 이 순 신 고 등 학 교 교사
·손성빈 충남드론항공고등학교 보건교사
·지혜리 천안가람초등학교 영양교사
·송민정 아 산 성 심 학 교 특수교사
·백하영 예 산 꿈 빛 학 교 특수교사
·이삼일 예 산 꿈 빛 학 교 주무관
·노윤숙 천안능수초등학교 행정실장

검토

·유석현 서 동 초 등 학 교 교감
·박희량 천 의 초 등 학 교 교감
·김윤숙 고 덕 중 학 교 교감
·백재흠 온 양 고 등 학 교 교감
·송경미 성 동 초 등 학 교 교사
·한희숙 성 연 유 치 원 원감
·강화영 천 안 인 애 학 교 교감
·박인옥 안 면 중 학 교 교사
·배은경 이 순 신 고 등 학 교 주무관
·엄성윤 이 순 신 고 등 학 교 주무관
