모두 함께 성장하는 행복한 미래학교

행복한 학교 학생중심 충남교육

2026년 공간재구조화사업 추진 계획

2026. 2.

충청남도교육청

(미래학교추진단)

목 차

1. 추진 근거 및 추진 배경 1

2. 추진 현황 2

3. 추진 방침 3

4. 충남형 공간재구조화사업 모형 4

5. 세부 추진계획 5

6. 기대 효과 12

부록1. 용어의 설명 13

부록2. 주체 기관별 주요 역할 14

2026년 공간재구조화사업 추진 계획

1 추진 근거 및 배경

□ 추진 근거

○ 학교시설 환경개선 5개년 계획 (교육부, 2023. 12. 11.)
○ 공간재구조화사업 실행계획 (교육부, 2024. 8. 5.)
○ 공간재구조화사업 업무지침 (교육부, 2025. 8. 1.)
○ 2026년 충남교육청 주요업무계획 (2025. 12. 30.)

□ 추진 배경

○ **미래사회 핵심역량 함양을 위한 학교교육과 공간혁신 요구 증대**
- 초연결·디지털 전환·기후위기 등 불확실성이 증대됨에 따라 변화에 능동적으로 대응하는 창의융합형 미래인재 양성 필요성 대두

○ **충남미래교육 2030에 대응하는 새로운 학교공간 본보기 필요**
- 기후위기·환경오염·인구구조 변화 속에서 학생중심 교육과정 운영을 위한 창의·융합·협업의 학교공간 인프라 구축 시급

○ **디지털 전환에 대응하는 안전하고 스마트한 학습 환경 조성 필요**
- SW·AI 교육 강화, 에듀테크 기반 교수·학습 활성화를 위한 노후 시설 개선과 디지털 기반 미래형 학습 환경으로 전환

○ **지속적인 학생수 감소에 대응하는 유연한 학교 공간 조성 필요**

※ 학령인구(초중고) : 511만('25) → 408만('30) → 309만('35) → 293만('40) (통계청)

- 공급자 중심의 시설 확충에서 벗어나, 학습자 중심의 질적 공간 성능 향상과 유휴 공간의 복합·활용방안 모색 필요

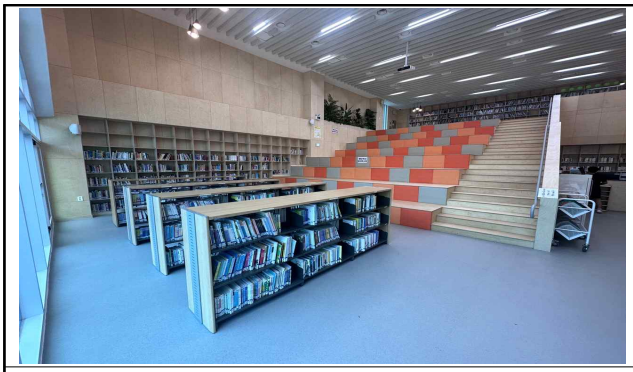
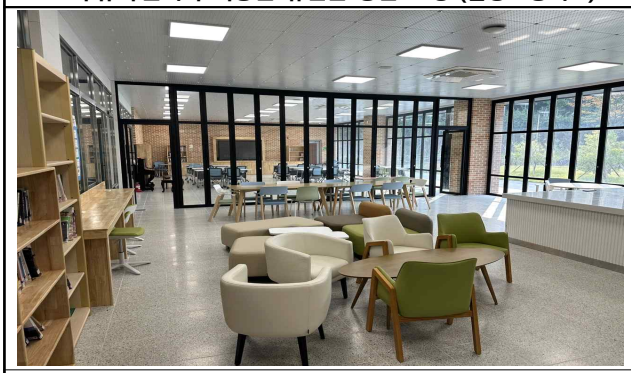
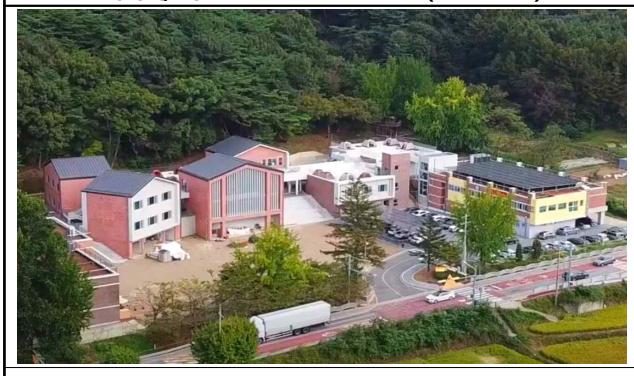
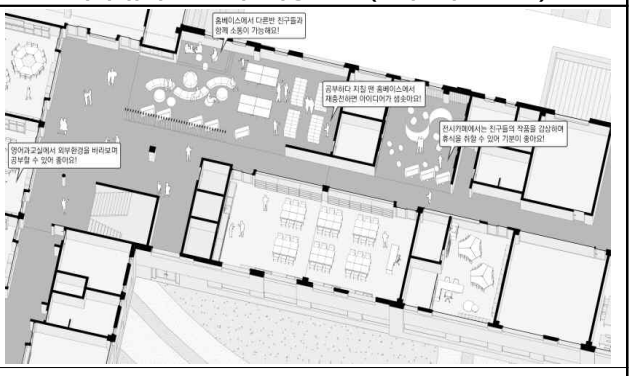
○ **지역소멸 대응을 위한 지역 중심 학교공간의 재정립 필요**
- 질 높은 공교육을 지원하고 체육·문화·예술·돌봄 기능을 아우르는 지역거점 학교복합시설 발굴 및 연계 필요

2 추진 현황

□ 2021년~2025년 추진 현황 (구. 그린스마트미래학교)

- ○ 2021년 대상 사업교 33교 준공, 8교 설계 또는 공사 진행
- ○ 2022년 대상 사업교 15교 준공, 10교 설계 또는 공사 진행
- ○ 2023년 대상 사업교 2교 준공, 16교 설계 또는 공사 진행
- ○ 2024년 대상 사업교 14교 설계 또는 공사 예정
- ○ 2025년 대상 사업교 15교 설계 및 사전절차 이행

□ 미래학교 조성 사례 (기획, 설계, 준공 관련)

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>교육·휴식·놀이가 가능한 유연한 공간 조성 (탑동초등학교)</td><td>공용공간의 학습공간화 (한올고등학교)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>다목적, 가변형 맞춤형 공간 조성 (송남중학교)</td><td>옥외 휴식 및 생태교육장 조성 (복자여자고등학교)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>미래교육 대응 공간재구조화 (거산초등학교)</td><td>교내 중앙 특화공간 조성 (고덕중학교)</td></tr>
</table>

3 추진 방침

□ 현장 중심 맞춤형 지원 체제 구축

○ 학교공간혁신 현장지원단 구성 및 단위학교 맞춤형 상담(컨설팅) 실시
○ 사업 단계별 설명회, 협의회, 사례 공유 등 체계적 배움 자리 추진
○ 현장 지원을 위한 사업 매뉴얼 및 공간 기획 도움 자료 제작·보급
○ 현장 이해도 제고를 위한 영상자료 제작 및 온라인 지원 채널 운영
○ 단위학교 현장 요구 수렴을 위한 온·오프라인 상시 상담 창구 마련

□ 체계적인 실행 계획 추진

○ 대상학교 선정과 사업추진 절차를 투명하고 체계적으로 관리
○ 사전기획 및 단위학교 여건을 반영한 사업유형·재정 방식 결정
○ 추후 공사비 상승분을 고려한 예산 편성과 집행관리로 사업 안정성 확보
○ 2021년~2026년 추진교에 맞는 연차별 사업추진 일정 통합 관리
○ 위험요인 사전 진단과 관리를 통해 예산·공정·안전관리 체계 구축

□ 학교 특색을 담은 사전기획 내실화

○ 교육과정 연계 사전기획을 강화하고 학교 특색이 드러나도록 추진
○ 충남미래교육 2030에 대응할 수 있는 학교별 공간 기획 추진
○ 사전기획 적절성 검토 전문기관 지정에 따른 사전기획 내실화
○ 교육기획가 배치를 통해 사전기획 내실화 및 학교 업무 경감 지원
○ 사전기획 결과의 설계·시공·사후관리까지 연계 환류 체계 마련

□ 홍보 체계 구축 및 강화

○ 준공교 공간 변화 및 교육 사례 소개 영상·기사·카드뉴스 제작 및 안내
○ 충남형 공간재구조화사업 비전과 성과 홍보 강화로 공감대 확산
○ 미래형 학습 환경 조성 우수사례 지속적 발굴 및 홍보
○ 학교공간혁신 VR·3D 투어 등체험형 콘텐츠 안내·보급으로 이해도 제고
○ 학생·교사·학부모가 함께 참여하는 학교공간혁신 캠페인 문화 확산

4 충남형 공간재구조화사업 모형

영역	요소	주요 내용
공간 혁신	미래 교육과정	- 충남미래교육 2030에 효과적으로 대응하는 공간 - 놀이 및 신체 활동을 강화하고 학교자율시간 운영할 수 있는 공간 - 자유학기제 및 고교학점제를 통한 개별 맞춤형 교육과정을 구현하는 다목적성의 학습공간 조성
	공간 유연화	- 사용자 참여 설계를 강화한 학교 공간 - 학습자 중심의 개방적인 교수·학습 공간 - 학습과 휴식이 공존하는 학교 공간
그린 학교	환경 생태교육	- 실내정원, 연못 등 학교 내 자연생태교육장 구축 - 자원 재활용 및 친환경 기술을 활용한 환경생태교육 - 교내 그린·생태 공간을 활용한 진로연계교육 운영
	탄소 중립 실현	- 신재생에너지 비율 34% 이상 권장 (개축 대상교, 연면적 1,000㎡) - 탄소 저감량 실시간 모니터링 계측·관리 시스템 구축 - 자연채광 및 고성능 단열재 등 패시브 기술 적용
디지털 전환	스마트 학습 환경	- 학교 내 어디서나 디지털기기 활용이 가능한 인프라 구축 - 충남형 인공지능 수업을 지원하는 첨단 학습 기자재 구비
	스마트 학교 운영	- 에듀테크 기반의 개별 맞춤형 교육과정 운영 - 지능형 나이스와 연계한 수강신청 및 유형별 교육과정 지원
학교 복합화	시설공유	- 지역 거점 역할의 개방·공유형 학교공간 모델 개발·확산 - 복합시설 블록화로 학생과 주민 간의 동선 분리
	지역 연계 프로그램	- 지역 특성과 자원을 살린 학교-마을 연계 프로그램 개발 - 지역사회의 다양한 교육자원을 학교에 도입 (마을교육공동체)
안전	공사 중 안전	- 미래학교 공사 가설울타리 및 공사장 가림막 필수 설치 - 등·하교 시간대 위험 건설공사 제한 등 안전 지침 수립 - 미래학교 건설공사장 안전모니터단 구성 및 운영
	준공 후 안전	- 유해 물질이 없는 인증 친환경 건축자재 적용 - 지능형 CCTV, 인체 감지 센서 등을 적용한 위험 요인 관리 - 학생 동선을 고려한 사전 기획 강화로 사고 요인 관리
지역 특화	초등	- 12학급 이하: 연면적 63㎡ 이상 확보 - 13학급 ~ 35학급: 연면적 126㎡ 이상 확보 - 36학급 이상: 연면적 189㎡ 이상 확보
	중·고등	- 10학급 이하: 연면적 67.5㎡ 이상 확보 - 11학급 ~ 29학급: 연면적 135㎡ 이상 확보 - 30학급 이상: 연면적 202.5㎡ 이상 확보

※ 특화공간: 단위학교 학교자율시간 운영을 위한 공간, 미래핵심역량 함양을 위한 학교 중점(특화) 공간

※ 예시) 창의융합 수업공간, 지능형 과학실, 학생 동아리공간, 디지털체험 복합 공간 등

5 세부 추진 계획

□ 현장 중심 맞춤형 지원 체제 구축

1. 학교공간혁신 현장지원단 구성 및 맞춤형 상담(컨설팅) 실시

○ **(인력풀 구성)** 학교의 사전기획 및 사용자 참여 설계를 지원할 수 있는 현장 중심 전문가 인력풀을 구성하고 학교 현장 상담(컨설팅) 지원

○ **(맞춤형 지원)** 교육과정 연계 사전기획 상담 요청시 대면·비대면(마주온 활용)으로 수시 상담 지원

○ **(소통방 개설)** 학교공간혁신 현장지원단 전문성 및 소통 강화, 사례 공유를 위해 온라인 소통방 개설 및 운영

○ **(배움자리)** 현장지원단 역량 강화를 위해 연 2회 배움자리 운영

2. 단위학교 사업 추진 역량 강화 지원

○ **(관리자 연수)** 26년 공간재구조화사업 추진교 사업 추진 절차와 학교 단위 추진 리더십 강화를 위한 학교장 배움자리 실시 (연 1회 예정)

○ **(담당 교직원 연수)** 사전기획-설계-시공-준공 및 준공 예정 등 사업 단계별 교직원 연수 운영 (연 2회 예정)

○ **(사업 설명회)** 교육지원청 담당자, 학교 담당자, 사전기획가, 건축사 등 사업 관련자들을 위한 사업 설명회 실시 (연 2회 예정)

○ **(원격 연수)** 미래학교 전환 준비금을 통해 단위학교 원격 연수비 지원

○ **(권역별 협의체)** 권역별 협의체 정기 운영으로 사례 및 공동 현안에 대한 정보 공유 네트워크 강화

3. 현장 지원 및 이해도 제고를 위한 도움 자료 및 영상자료 제작

○ **(브로슈어)** 사업에 대한 목적, 특징, 물량 등을 담은 브로슈어 제작

○ **(핸드북)** 미래학교 전반적 소개, 사전기획 단계 매뉴얼 등 핸드북 제작

○ **(사례집 및 영상 제작)** 사전기획 우수사례, 준공 후 사용 우수사례 등 단계별 사례를 취합하여 사례집 및 영상자료 제작

□ 체계적인 실행 계획 추진

1. 사업 실행 계획

○ **(대상조건)** 40년 이상 경과한 학교 건물

○ **(사업목적)** 노후 학교시설 개축·리모델링을 통해 디지털 전환 시대에 부합하는 교수학습 혁신이 가능한 미래형 학교로 전환

○ **(사업물량)** 40년 이상 경과한 학교 건물 중 114동

※ 구조안전 위험시설물(안전등급 D·E등급)은 40년 미경과된 건물도 사업 추진 가능)

(단위 : 교, 억원)

구분		2024	2025	2026	2027	2028	계
공간 재구조화	물량(동)	**16**	**26**	**24**	**24**	**24**	**114**
	투자액(억원)	**996**	**1,619**	**1,494**	**1,494**	**1,494**	**7,097**

※ 산정기준: 동당 연면적은 2,750㎡, 동당 사업비 단가는 62.26억원, 연부율 5년(5:10:25:30:30)

○ **(주요 변동사항)**

구분	'21~'23	'24부터	비고
사업명	그린스마트스쿨	**공간재구조화사업**	
사업 주체	국가, 시도교육청	**시도교육청**	계속사업으로 노후시설 해소
사업 대상	40년 경과 노후시설	**40년 경과 노후시설**	
달성 목표	'81년 이전 노후시설의 2,835동	**중장기 노후시설 증가분의 50%**	10년후('33년) 노후시설 50% 해소
추진 단위	동 단위	**학교 단위**	공간재구조화 + 성능개선사업 연계
재원구조	국비 + 지방비	**지방비** (교육환경개선사업비)	
사업방식	재정 + 민자	**재정**	2024년도부터 민자사업 미추진
사업내용	5대 핵심요소	**5대 핵심요소+지역특화**	사전기획, 사용자참여 설계 연계 강화

2. 사업 통합 관리

○ **(통합)** 환경개선, 공간재구조화, 학교복합시설 등으로 개별 추진하던 학교시설사업을 학교시설 환경개선사업으로 일원화

- 시설사업을 노후시설 공간 개선을 수반하는 공간재구조화 사업과 적정 교육환경확보를 위한 시설 성능 유지·관리사업으로 구성
- 공간재구조화 사업은 개별 교사동이 아닌 학교 전체 대상 재구조화를 추진하되, 초등학교는 온돌봄 공간 조성 우선 반영

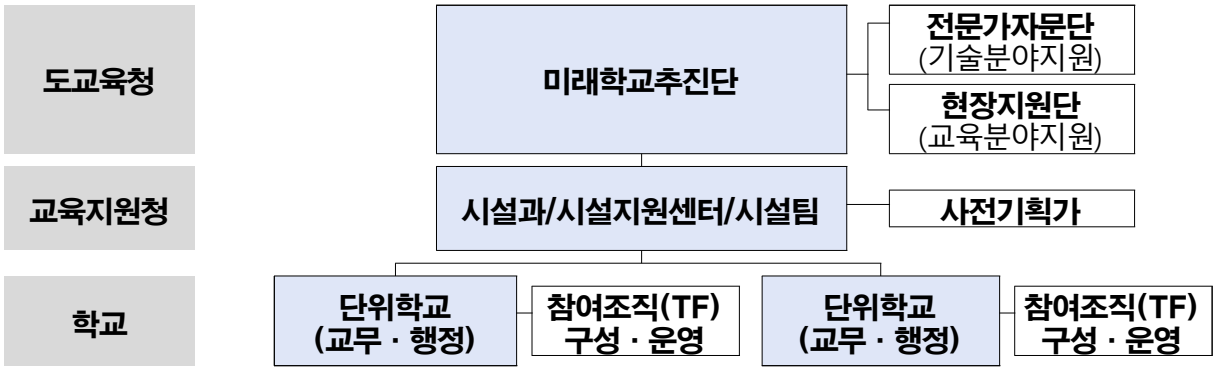
○ **(학교 단위)** 반복적 개별사업은 지양하고 시설사업 통합 추진으로 학생 안전 및 시설사업 집행 효율성과 일관성 제고

- 공간재구조화사업 추진 시 개축, 리모델링, 부분적 시설개선 등 관련 사업을 연계하여 학교 단위 통합 시설사업으로 추진 가능


3. 사업추진 절차

○ **(사업관리·절차 개선)** 사업추진 상황을 주기적으로 점검하고, 사업 기간이 지연되지 않도록 사업절차 간소화

○ **(사업 추진 체계)**



○ **(사업 추진 절차)**

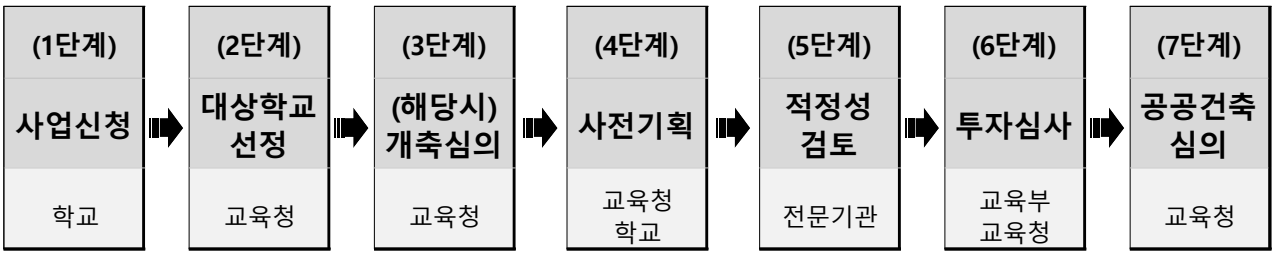

4. 대상 학교 선정 및 확정

○ **(선정기준)** 40년 이상 경과 된 학교의 학생 배치 계획, 노후도・안전성, 최근 보수 이력 등과 학교의 추진 의지를 종합적으로 검토하여 각종 교육목적 사업에 적합한 학교를 순위 선정하는 '지정 예고제' 실시 (2026년~2028년)

사업 우선 선정 요인	사업 제외 요인
• **교육정책 목표 달성**에 필요한 학교 건물 • 노후도가 심하거나 **안전 등급이 낮은 건물** • 석면 등 **위해요인 보유 건물** • 소규모학교 **적정규모화 육성 중심학교** 대상	• **대수선 등 최근 대규모 예산이 투입된 건물** (최근 5년 동안의 시설비 투자 총액이 전면 리모델링 사업의 50% 이상 투자 등) • 문화·교육적 가치가 인정되어 보존이 필요한 건물 • **학생 수가 감소 되는 소규모 학교** **※ 중기학생배치계획에 의한 소규모 학교(5년이내 학생수 60명 이하)** • 통폐합, 이전 등의 계획이 검토되는 학교

5. 충남교육청 자율 추진체계 강화

○ **(지역 특화)** 시도교육청의 여건을 고려하여 지역 균형 발전과 지속 가능성을 담보하는 지역 특화 모델 정착

- 학교만의 특화 공간 구축: 초등, 중・고등학교 규모별로 차등
- 공간혁신, 그린학교, 스마트교실, 학교복합화, 안전, 특화 공간 (6대 요소)

○ **(추진 자율)** 지역 여건을 고려하여 개편된 사업추진체계 내에서 자율적 사업추진계획 수립 및 집행

- 중장기적 교육시설 균형 발전을 고려하여 지역교육청별 사업 규모 및 집행 속도를 결정

6. 사업유형 및 재정투입 방식 결정

○ 사전기획, 개별학교 여건 등을 반영하여 사업유형 (개축/리모델링/증축) 및 재정투입 방식 결정

○ 건물 단위가 아닌 학교 단위 사업이 이루어질 수 있도록 40년 이상 대상 학교 외 시설물의 개축·증축·리모델링 등 복합적으로 검토

○ (성능 기준) 학교 시설 주요 요소별 성능지수(FCI) 기준을 마련하여 학교 중심 통합 환경개선사업이 가능하도록 지원

〈 시설성능지수 FCI, Facility Condition Index 〉

▸ 시설 노후정도와 성능에 기초하여 시설사업 투자규모를 파악하고 정량적 의사결정을 지원하는 방법으로 미국, 캐나다 전역에서 학교시설 관리 도구로 널리 사용 중

$$FCI = \frac{\text{시설의 유지 보수, 수리 및 교체 비용}}{\text{시설의 현재 대체 가치(개축비용)}}$$

* FCI값이 낮을수록 우수

▸ 우리나라 실정에 맞는 시설성능지수 개발 및 활용기준 마련이 필요

7. 설계 진행

○ **(소통 강화)** 사전기획에서 수렴·합의된 공간 기획의 취지와 의도가 일관성 있게 반영될 수 있도록 학교 구성원과 건축가와의 소통 확대

※ 사업 전 단계에 사전기획가(공간기획가, 교육기획가)의 참여 유도

○ **(참여 방식 다양화)** 동아리 활동, 수업 참여, 워크숍 등 학교 여건에 부합하는 사용자 참여 방식을 학교에서 직접 결정하여 기획 단계부터 학교 구성원의 참여 기회 확대

○ **(촉진자 활용)** 사전기획 결과가 설계 단계에 연계되도록 사전기획가가 사용자 참여 설계 단계에 촉진자로서 참여토록 권장

○ **(제도 보완)** 사전기획가가 설계지침서에 사전기획 결과로 반영해야 할 사항을 명확히 제시하고, 설계 공모자를 대상으로 해당 결과 공유 권장

※ 사전기획 설계 구현을 위해 핵심 사항은 설계지침서에 구체적인 방안 제시

8. 공사 기간 안전관리

○ **(통학로 안전)** 학생 등·하교 및 교육활동 동선을 고려하여 공사 차량 진·출입로 별도 배치 및 보차분리 등 통학로 안전관리 철저

○ **(관리 감독 강화)** 설계 의도 구현 및 공사 중 화재 등 재난 예방을 위해 법적 기준보다 강화된 관리·감독* 시행

※ 안전한 공사관리·감독을 위해「건설기술진흥법」에 따른 의무 기준 이상으로 강화된 감리 기준을 적용

□ 학교 특색을 담은 사전기획 내실화

사전기획이란? 교육시설의 설계 전에 교육과정 운영 및 교수·학습 방법에 따른 공간 구성, 사업의 규모, 내용 및 사업비 등 사업의 추진에 관한 사항, 사용자 참여를 통한 디자인 계획 및 안전에 관한 사항, 발주 방식에 대한 사항, 에너지 효율화 등 지속가능한 제고 방안 등에 관한 사전 전략 수립 등을 하는 것

1. 교육과정 연계 사전기획 강화

○ **(교육과정)** 단위학교 교육과정 및 미래 교육과정 분석 후 사전기획 추진
○ **(학교자율시간)** 학교 특색을 반영한 학교자율특색과정 공간 기획 필수
○ **(학습자 분석)** 학생의 수준과 요구를 반영한 다양한 공간 구성
○ **(학교 반영)** 추진교의 학교 교육과정 운영 계획에 공간재구조화 내용 반영

2. 미래교육에 대응하는 공간 구축

○ **(학생 선택권)** 학생의 과목 선택권 확대에 따른 교육기획 추진
○ **(디지털 공간)** 디지털 리터러시 함양을 위한 공간 조닝 과정 포함
○ **(공동체 역량)** 다양한 공간에서 협력 수업 및 자발적 소통이 이뤄지도록 사전기획 단계에서 추진
○ **(학생 주도성)** 학생 자치 및 주도적 학습을 위한 소규모, 중규모 등 유연한 공간 조성

3. 사전기획 적정성 검토 강화

○ **(현황분석)** 학교 일반현황 (운영, 시설, 대지, 도로, 법규 등), 지역 현황 (지역 인구, 주변 학교·시설), 학교 이용 실태 조사·분석 및 학교 구성원, 교육과정, 교육목표, 주변 생태 환경 등 학교, 지역사회 여건 분석
○ **(미래 교육 방향 설정)** 학교의 교육 비전, 목표, 교육과정 및 프로그램 현황을 분석하고, 미래 교육에 적합한 교육 공간 구성 방향 설정
○ **(사용자 참여디자인)** 학교 공간 및 운영 프로그램 분석을 통하여 문제점과 사용자 요구사항 파악, 사용자가 원하는 교육 프로그램 운영이 가능한 공간 조성 방향 제시
○ **(중간·최종 보고회)** 학교 현황 분석, 공간재구조화 조성 방향, 사업 유형·방식에 대한 검토 결과 보고

4. 사전기획가 역량 강화

○ **(교육 시간)** 전문기관을 통해 사전기획가 교육과정 운영 (추가 편성)
※「교육시설의 사전기획 등 업무수행 지침」의 별표 2 (8시간) 추가 심화 과정

○ **(원격 연수)** 사전기획가의 사업 경험 별 맞춤형 연수 강화
※ 교육시설 사전기획 전문가 교육과정(한국교육시설안전원, 2025년 기준 8시간), 전문기관 주관 교육기획, 공간기획 분야별 맞춤형 연수 제공 등

□ 홍보 체계 구축 및 강화

1. 공간재구조화 우수사례 공모전 추진

○ (홍보물) 관련 공모전 홍보물 배포, 카드뉴스 제작・배포

○ (온라인) 온라인 시스템 구축 후 접수 진행(11월 예정)

○ (참여지원) 교육기획, 공간 활용 등(공모전 준비) 관련 맞춤형 지원

2. 충남형 공간재구조화사업 언론사 홍보 캠페인 진행

○ (대상) 충남도민 전체

○ (시기 및 방법) 2026년 9월~11월 매주 1회 언론사 홍보 캠페인 진행

○ (홍보 내용) 공간재구조화사업 취지 안내, 사용자 참여 설계 과정 소개, 준공교 공간 우수 사례 홍보 등

3. 미래형 학습 환경 조성 우수학교 사례 발굴 및 홍보

○ (대상) 충남교육청 관내 교직원

○ (사례 발굴) 준공교 방문 점검 및 사후 컨설팅(활용 사례 확인)을 통한 미래형 학습 환경 조성 우수 사례 발굴

○ (홍보 계획) 우수학교 사례집 제작 및 홍보 영상 제작

4. 학교공간혁신 VR 자료 안내 및 활용 확대

○ (대상) 충남교육청 관내 교직원, 학생, 학부모

○ (내용) 학교공간혁신 VR 활용 관련 연수 (온라인, 오프라인 등)

○ (매뉴얼) VR 투어, 길라잡이 활용 매뉴얼 제작 보급

6 기대 효과

□ 미래 교육에 대응하는 학교 공간 조성

○ 충남형 공간재구조화사업 확산을 통한 교육과정·디지털·생태 전환 등 충남 미래교육 2030 실현 기반 학교 공간 마련

○ 사전기획 내실화를 통해 미래교육에 대응하며 학교·지역의 특색이 드러나는 교육과정 연계 공간 기획

○ 교육·돌봄 통합 서비스 제공, 자유학기제 및 고교학점제를 통한 개별 맞춤형 교육과정 구현 등에 대비하는 유연한 공간 확보

□ 체계적 실행계획 추진으로 안정적 사업관리 도모

○ 대상학교 선정부터 준공, 사용 후 관리까지 단계별 역할과 절차를 명확히 하여 사업 주체별 책무성 제고로 사업 관리의 일관성 확보

○ 미래학교 사업추진 통합·간소화를 통해 중복 업무를 줄이고 사전기획 지원업무에 집중할 수 있는 여건 마련으로 업무 피로도 경감

○ 사전기획·설계·시공·심의 과정을 체계적이고 투명하게 관리하여 학교·지역사회·관계기관의 신뢰할 수 있는 사업 추진 기반 마련

□ 학교 현장 맞춤형 지원을 통한 사업추진력 제고

○ 충남형 공간재구조화사업 모형을 다양한 매체와 사례 중심 홍보를 통한 교육공동체의 이해도와 공감대 확산

○ 맞춤형 현장지원단을 구성·운영하여 단위학교 여건과 요구를 반영한 자문(컨설팅)으로 단위학교 사전기획 내실화

○ 학교공간혁신 길라잡이·사전기획 체크리스트·사례집 등 각종 도움 자료 제작 및 누리집 정비를 통해 수시 맞춤형 현장 업무지원 강화

※ [부록 1] 용어의 설명

○ **(교육기획)** 사전기획 과정 중 하나로 학교 현황조사 및 분석, 학교 미래교육 비전 및 목표 설정, 학교 특색 교육과정과 교사별 교수학습 방법 분석 등의 업무를 수행하는 것

○ **(공간기획)** 교육기획 결과를 바탕으로 미래학교 공간 조닝, 스페이스 프로그램, 중장기 발전계획, 설계공모지침 작성 등의 업무를 수행하는 것

○ **(사전기획가)** 학교 담당 교사와 협업하여 교육기획을 실시하고, 이 결과를 바탕으로 공간기획 업무를 수행하는 자

○ **(사용자 참여)** 교육시설 사업의 전 단계에 걸쳐 학생, 학부모, 교직원, 지역주민 등이 참여하여 학교 건축물과 공간환경의 가치와 활용성을 높이는 행위로 동아리 활동, 수업 참여, 전문적 학습공동체, 배움 자리 등이 있음

○ **(스페이스 프로그램)** 사용자의 요구와 지역·시설·예산 등의 현황에 맞춰 학교 시설에 필요한 소요 공간(교실 및 기타 공간)의 종류와 각 공간별 적절한 면적을 산정하는 것으로서 이를 도표로 나타낸 것

○ **(설계공모)** 건축서비스 산업을 활성화하고 공공건축의 품격을 높이기 위함으로 발주하고자 하는 건축물의 특성, 규모 및 사업비를 고려하여 선정하며, 일반 설계공모, 2단계 설계공모, 제안공모 및 간이공모 등이 있음

○ **(주요구조부)** 기둥, 바닥, 보, 지붕틀 및 주계단을 말함. 다만, 사이 기둥, 최하층 바닥, 작은 보, 차양, 옥외 계단, 그 밖에 이와 유사한 것으로 건축 구조상 중요하지 않은 부분은 제외함

○ **(증축)** 건축법 상 건축의 하나로써 기존 건출물이 있는 대지에서 건출물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것

○ **(개축)** 기존 건축물의 전부 또는 일부(내력벽, 기둥, 보, 지붕틀 중 셋 이상)를 해체하고, 그 대지에 종전과 같은 규모의 범위에서 건축물을 다시 축조하는 것

○ **(리모델링)** 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위해 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위

※ [부록 2] 주체 기관별 주요 역할

구분	주요 내용 및 역할	
주체 기관 주요 역할	학교	· 학교 내 공간재구조화 사업 추진 체계를 운영하고, 미래학교 전환에 대한 구체적인 목표 설정 및 사용자 참여를 통해 학교 특색에 맞는 공간 구성 주도 · 사전기획 일정에 따라 인사이트 투어, 디자인 워크숍, 사용자 설문조사, 공간 현황 조사 및 특성 분석, 디자인 아이디어 발굴, 건축 디자인 도출 등의 활동 함께 수행 · 사전기획 과정에서 학교 구성원 중심의 미래학교 비전 설명 및 교육과정, 공간환경 구성을 위한 참여 수업 진행 · 사전기획, 설계, 시공 전 과정에 구성원 참여
	교육(지원)청	· 사전기획 용역 발주 및 관리, 예산 편성 등 각종 행정업무와 참여자 교육연수 등 실시 · 학교 맞춤형 상담(컨설팅) 계획 및 운영 · 학교별 총 사업비 확정, 예산 교부 및 집행 등 관리 · 공유재산관리, 개축심의 등 각종 심의 업무 추진 · 사전기획가와 설계자 전문가 인력풀 구성·관리, 미래학교 조성 중장기 로드맵 마련 · 관련 및 유관 기관 협업, 역할 조율 등 미래학교 사업 총괄 · 설계 발주 및 공사관리, 사용 후 평가 등 지속적인 프로젝트 추진 주체 역할
	사전 기획가	· 학교 운영현황 및 실태분석, 지역 실태 조사를 통해 학교 구성원들과 미래교육 비전 및 목표 설정 및 방향 도출 · 창의적 학습 공간 활용 및 관리기준 마련 · 학교 현황분석, 설계 기획, 사전기획 결과 도출, 각종 심의업무 자료 작성 · 대상 학교 현황, 여건 및 법적 요건 분석하여 사용자 참여 프로그램을 통해 미래학교 공간 구체화 · 미래학교 조성 방향, 사업추진 방법 또는 방식 설정, 특화 방향 구체화, 사전기획 의도 구현 설계지침서 작성 · 설계 단계에서 사전기획 내용 연계, 시공단계 자문역할 수행, 더 나아가 사용 후 평가 참여 권장
